

基隆市議會 第19屆第8次定期會

市長施政總報告



基隆市政府 編印

中華民國111年9月14日

基隆市議會第 19 屆第 8 次定期會施政總報告

目錄

壹、 城市博覽會開創基隆新起點	1
貳、 基隆市港再生標竿計畫	26
一、 中山一、二路拓寬工程	27
二、 忠一路貫通工程於 107 年完工	29
三、 基隆火車站南站廣場工程	31
四、 西岸會展與旅運智慧大樓開發案預計今年第 3 季完成修正招商文件、 112 年辦理正式公告招商	32
五、 西 2、西 3 倉庫旅客中心已於今年 3 月竣工，刻正辦理西 2 倉庫一樓暨 停車場招商	32
六、 舊國光客運站與忠一路天橋拆除	33
七、 國門廣場第一階段工程已於今年 6 月 6 日正式啟用，第二階段工程刻 正辦理規劃設計審查作業	35
八、 基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程預計今年 9 月底前完工	36
九、 太平青鳥吸引近 5 萬人次參觀，KEELUNG 地標以嶄新面貌亮相	38
十、 西岸山城纜車可行性評估已完成，刻正辦理先期規劃作業	41
十一、 忠一路人行路廊改善工程與新式候車亭建置	43
十二、 東岸轉角廣場與東岸郵輪廣場	44
十三、 東 3、東 4 碼頭旅運設施刻正辦理招商已完成評選作業，將點交進行 營運準備	47
十四、 軍港西遷整體工程預計今年第 4 季完工	47
十五、 基隆港東櫃西遷工程	50
十六、 基隆港務警察總隊拆遷及興建案	51
十七、 山海城串聯再造工程進度已達 98%，預計今年 9 月底前完工	52
十八、 「基隆希望之丘(中正公園)防空洞改善計畫」預計 111 年 9 月底前開 放	54
十九、 希望之丘山城社區通廊系統建構計畫已於今年 7 月完工	56
二十、 希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程已於 111 年 5 月 31 日開工，預 計 112 年 1 月底前完工	58
參、 推動執行台灣史上最大規模文化保存計畫—「大基隆歷史場景再現整合計 畫」	60
一、 大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0	60
二、 大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0	74
三、 西班牙諸聖教堂考古遺址於城市博覽會期間揭開神秘面紗	76

四、市定古蹟劉銘傳隧道修復工程於 110 年完工	81
肆、海科館與潮境海灣發展計畫	83
伍、基隆河谷廊帶發展戰略	87
一、基隆河谷廊帶發展策略，從規劃到落實	87
二、山坡地解編 260 公頃，降低開發成本、增加業者投資意願	91
三、基隆河流域土地開發管制解禁	92
四、北五堵國際研發新鎮規劃案	93
五、基隆捷運第一階段路線今年 2 月宣布定線，本市將成為第一個擁有中 運量捷運系統的非直轄市	95
陸、改善交通與城市基礎建設	103
一、高公局辦理之「國道 1 號大華系統至汐止交流道路拓寬可行性評 估」通過國發會審議，將採平面拓寬改善塞車問題	103
二、開通 4 條快捷公車路線，總搭乘數達 1,920 萬人次	104
三、8 年來增加 60 處停車場、10,715 個汽機車停車位	105
四、調和街轉運站工程已於今年 7 月 19 日竣工	107
五、停六停車場刻正進行細部設計，預計 111 年底開工	109
六、8 年建置 128 支智慧型站牌與 76 座新式候車亭	111
七、8 年完成 8 項示範道路、5 項道路改善或拓寬、5 項人行路廊改善工程	112
八、加強本市老舊橋梁修改建、維修及檢測	124
九、本市污水下水道接管率全國第 5	128
十、基隆河岸自行車道預計 111 年底完工	129
十一、高地供水改善，幸福華城已於去年完工，美之國、壯觀台北預計今 年 12 月完工	132
十二、台水公司規劃 3 年 8 億汰換基隆舊漏水管	134
十三、建置基隆市全方位地理資訊系統，支援市政決策判斷	135
十四、基隆市數值航測地形圖測繪相關作業委託技術服務案	137
十五、都市更新輔導團培訓，成功輔導 5 處地區成立更新會並爭取營建署 自行實施都市更新補助	139
十六、建照審查併審機制創新作為，加速審查效率	140
柒、教育翻轉與校園環境改造	142
一、提高學校行政事務費，8 年增加超過 1.2 億元	143
二、強化雙語與國際教育，完成雙語教育一條龍政策目標	143
三、投入超過 4.2 億元推動智慧教育十部曲，打造符合世界潮流的智慧校園	145
四、設立 3 所實驗教育學校，提供多元教育選擇權	149
五、建構優質運動空間	150
六、美力校園運動計畫三部曲，投入逾 28 億元改善 16 所校園—教育處	156

七、以校園為核心的環境改善計畫.....	159
八、中和國小老舊校舍整建工程已於今年6月20日落成啟用.....	163
九、0至未滿5歲育兒津貼，核發金額超過9.3億元.....	164
十、公幼、準公幼及非營利幼兒園占比已達78.7%.....	166
十一、信義區親子館預計今年底完工，即將完成一區一親子館里程碑.....	168
十二、「一區一特色遊戲場」全數完工，將於今年9月開學後陸續開放社 區使用.....	170
十三、校園「班班有冷氣」，本市共計2萬1千多名國中小學生受惠.....	174
十四、本市學校屋頂標租太陽光電比例居全國之冠.....	175
十五、全台首座實體社區大學於110年12月啟用.....	177
十六、基隆教育，七大全國第一.....	181
捌、提升城市文化力.....	183
一、文化中心美術館展場提升及場館升級整建.....	183
二、強化市圖書館軟硬體建設.....	185
三、大力推廣閱讀，本市首獲台灣閱讀績優城市.....	186
四、打造基隆成為藝術之都.....	187
五、黃蠟石文化館持續深耕地理環境教育.....	191
六、主普壇耐震補強暨修復工程於110年1月完工.....	193
七、老屋保存再生計畫至今年4月共10件獲文化部核定通過.....	194
八、「高遠新村港務局局長官舍」修復工程預計112年12月完工.....	198
玖、打造優質環境.....	199
一、優化市容，打造美麗清朗的生活空間.....	199
二、形塑港城特色、訂定景觀自治條例.....	205
三、8年投入超過4.7億元進行全市公園綠地改造.....	207
四、基隆市大武崙森林運動公園.....	209
五、暖暖運動公園遊戲場於今年6月21日落成啟用.....	213
六、暖東峽谷環山遊憩步道改善工程111年8月20日完工.....	215
七、西岸高架橋下空間改造工程預訂今年9月中旬完工.....	216
八、基隆港市水環境改善計畫.....	218
九、守護海洋資源，發展永續海洋.....	220
十、培訓熱心山友守護基隆山林.....	224
十一、本市PM _{2.5} 濃度為西半部最佳縣市，且已優於美國制定標準值.....	225
十二、市政大樓興建工程案.....	227
十三、持續推動基隆市生命典藏館新建工程.....	228
壹拾、深耕本市觀光品牌.....	229
一、正濱漁港周邊環境設施整建，帶動海濱地區觀光廊帶發展.....	229
二、城市博覽會海派浪漫光雕秀吸引超過10萬人次參訪.....	233
三、全市觀光據點導覽指示系統改善工程，已於111年4月完工.....	234

四、	基隆觀光巴士 109 年 6 月正式上路.....	235
五、	「海派基隆食旅卷」今年 5 月 21 日起開賣，帶動 1,528 萬元觀光消費	238
六、	發展暖暖七堵為北台灣生態觀光與休閒農業勝地.....	238
七、	優化基隆嶼旅遊服務品質，4 年總計吸引 21.7 萬人次登島觀光.....	241
八、	基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善工程已於今年 7 月完工.....	242
九、	8 年來劇組協拍數量累計達 484 件.....	243
十、	「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍於 110 年公告調整.....	245
十一、	金包里文教中心興建營運移轉案，已於今年 6 月 24 日公告招商...	247
十二、	北觀處於本市轄管景點重點建設.....	248
壹拾壹、	照顧原住民朋友	251
一、	8 年來原民預算增加超過 50%	251
二、	致力保存與推廣原住民文化.....	254
三、	設置 2 處文化健康站，提供原住民長者健康照顧服務.....	258
四、	辦理各項福利措施，照顧本市原住民朋友.....	259
壹拾貳、	社會照顧	261
一、	強化本市社會安全網.....	261
二、	本市長期照顧計畫 2.0 執行成果.....	263
三、	老人假牙補助 8 年投入約 2.91 億元，造福 10,053 位長者，裝置後 3 個 月滿意度達 9 成以上.....	265
四、	輔具資源中心設置 5 處據點，提供鄰近便利服務.....	267
五、	敬老卡福利 8 年投入 3.9 億元，使用近 4,743 萬人次.....	268
六、	長照福利服務園區促參案.....	269
七、	整合住宅補貼資源實施方案補貼名額 8 年成長近 3 倍.....	270
八、	社會住宅包租代管第三期累計媒合數量為全國第 3 名.....	272
九、	國家住宅及都市更新中心於本市首批社會住宅「光明安居」，統包工程 於今年 8 月中旬決標，預計 116 年完工營運.....	273
十、	婦女生育獎勵金 8 年補助超過 3 億元.....	275
十一、	中低收入戶及身心障礙者微型保險共計約 2 萬人受惠.....	275
十二、	打造友善動物城市.....	276
壹拾參、	務實嚴謹做好防疫工作	281
一、	率全國之先，針對傳統市場進行管制.....	283
二、	率全國之先實施「雙單一套」高規格防疫措施.....	284
三、	率全國之先，共善餐食直送急困學生家中.....	285
四、	推動「全民防疫、愛心篩檢」示範計畫.....	286
五、	全國首創確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道.....	287
六、	市民廣場 PCR 篩檢站提供快篩陽民眾領藥服務.....	288
七、	領先全國設置機構型後送收治站.....	289

八、小結：防疫不鬆懈，迎向疫情曙光.....	291
壹拾肆、安心城市	293
一、科技執法有效遏止車輛違規行駛及維護居家安寧.....	293
二、全面提升本市重要路口監視器效能.....	295
三、領先全國建置 119 及 110 報案互通系統.....	296
四、獨居老人戶住警器安裝率達 100%，持續強化弱勢家庭防火安全	296
五、強化救災設備與人力，提升本市救災能量.....	297
六、建置全國首創消防車即時影像系統.....	299
七、獅球里及信義花園獲內政部頒發韌性社區一星標章.....	300
八、公有建築物耐震補強工程 8 年總計投入超過 4.3 億元.....	301
壹拾伍、建構友善創業投資環境	303
一、本市商業登記家數 8 年來穩定成長.....	303
二、本市二大工業區經濟發展有目共睹，8 年廠商投資逾 87 億元.....	303
三、工業區周邊環境改善及推動工業區立體化.....	305
四、扶植青年於本市發展基隆特色產業.....	307
五、地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）執行效益總計達 1.7 億元	310
六、中小企業圓夢貸款核貸金額累計達 4,040 萬元.....	311
七、推出「潮·嚮 山海基隆」品牌，積極推廣本市農漁產品.....	312
結語：基隆是一個成就夢想的地方	314
附件：104 至 111 年市政榮譽榜	315

圖表目錄

圖 1：91 年至 111 年 8 月基隆市債務餘額及負債比率圖.....	3
圖 2：104-111 年度預算（含追加減預算）趨勢圖(單位：億元).....	4
圖 3：2022 城市博覽會 A、B、C、K 四大展區位置圖	5
圖 4：「城市博覽會主展館—起點城市」，回應臺灣城市發展課題.....	10
圖 5：「基隆聯合事務所—時代基隆」，展現聯合眾人專業改變翻轉基隆城市的秘密.....	11
圖 6：「社區設計館—城市參與製造所」，展現集眾人之力成就基隆未來城市願景.....	12
圖 7：城際轉運站「山海鳴光」大型公共藝術裝置點亮基隆城市.....	13
圖 8：城際轉運站「禮好市集」展售基隆特色商品.....	13
圖 9：海上看展活動帶領民眾從海上角度認識基隆.....	14
圖 10：海洋廣場光雕作品《海境》，探討人與海的距離.....	14
圖 11：文化中心光雕展演訴說基隆 400 年來的歷史人文風貌.....	15
圖 12：正濱漁港海派浪漫光雕秀.....	16
圖 13：「大基隆。市」市集邀集全台 30 間知名飲食品牌，用味道向 400 年來的基隆飲食文化致敬.....	16
圖 14：漁會正濱大樓修復完成後於城市博覽會首度對外開放.....	17
圖 15：「潮藝術」展覽呈現基隆城市集體記憶.....	17
圖 16：「水產市—被漁滋養的海事盛地」展覽，以裝置藝術介紹北臺灣最大漁場北方三島.....	18
圖 17：眺望大基隆歷史場景—眺望板結合《誰來基隆》系列繪本，解說基隆 400 年來歷史文化.....	18
圖 18：海洋科技博物館「海之聲」特展.....	20
圖 19：民眾於農漁村市集中體驗「新船下水」儀式.....	20
圖 20：開放式漁村學堂推出小旅行遊程.....	21
圖 21：「風光語海音樂會」於潮境公園登場.....	21
圖 22：享食沙灣—輕食市集與親子演出.....	22
圖 23：沙灣藝術裝置展現童趣.....	23
圖 24：「誠品書店—時光繪本書屋」於基隆要塞司令官邸及校官眷舍展售千本基隆相關選書.....	23
圖 25：「基隆.zip 多媒體互動展」於基隆要塞司令部展出基隆悠長的土地記憶.....	24
圖 26：要塞司令部軍補庫房「穿越基隆的時空」展覽，用船隻訴說基隆的故事.....	24
圖 27：要塞司令部舉辦「舞鈴劇場—山海之光」藝文活動.....	25

圖 28：基隆在首都圈內的全球化城市發展定位，將基隆建設為「大台北首都圈東側海洋國家門戶」.....	26
圖 29：基隆市港再生標竿計畫.....	27
圖 30：中山一、二路拓寬工程.....	29
圖 31：忠一路貫通工程.....	30
圖 32：基隆火車站南站廣場工程.....	31
圖 33：未拆除前的舊國光客運站及忠一路天橋.....	34
圖 34：忠一路天橋拆除工程.....	34
圖 35：國門廣場第一階段工程已於 111 年 6 月 6 月日正式啟用.....	36
圖 36：基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程完工示意圖.....	37
圖 37：基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程預計 111 年 9 月完工.....	38
圖 38：太平青鳥開幕當日吸引近千人參與.....	40
圖 39：KEELUNG 地標以全新樣貌點亮城市.....	40
圖 40：西岸山城纜車山下站示意圖.....	42
圖 41：西岸山城纜車山上站示意圖.....	42
圖 42：忠一路人行路廊改善工程與新式候車亭建置.....	44
圖 43：東岸轉角廣場已於 111 年 6 月 8 日開放行人通行.....	45
圖 44：東岸郵輪廣場工程施工前.....	46
圖 45：東岸郵輪廣場工程完工示意圖.....	46
圖 46：軍港西遷主體營舍工程於 108 年 5 月開工動土.....	49
圖 47：威海營區舊營舍開始第一階段拆除工程 111 年 1 月動工.....	49
圖 48：基隆山海城串聯再造計畫工程豎梯工區.....	52
圖 49：基隆山海城串聯再造計畫工程主普壇工區.....	53
圖 50：基隆山海城串聯再造計畫工程鵲橋工區.....	53
圖 51：基隆希望之丘(中正公園)防空洞改善計畫.....	55
圖 52：基隆希望之丘(中正公園)防空洞改善計畫.....	55
圖 53：希望之丘山城社區通廊系統第一階段工程完工.....	56
圖 54：希望之丘山城社區通廊系統第二階段工程.....	57
圖 55：希望之丘山城社區通廊系統第三階段工程完工.....	57
圖 56：希望之丘兒童遊戲場參與式工作坊.....	58
圖 57：希望之丘兒童遊戲場工程完工示意圖.....	59
圖 58：歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程.....	61
圖 59：基隆要塞司令部修復再利用工程.....	62
圖 60：基隆要塞司令官邸修復再利用工程.....	63
圖 61：基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程.....	63
圖 62：歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程.....	64
圖 63：市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程.....	65
圖 64：平一路停車場「西班牙諸聖教堂考古遺址」出土文物.....	78

圖 65：和一路考古文化層.....	78
圖 66：西班牙諸聖教堂考古遺址於城市博覽會首次亮相.....	79
圖 67：西班牙諸聖教堂考古遺址結合 AR、VR 及模型圖說.....	79
圖 68：西班牙諸聖教堂考古遺址解說中心模擬圖.....	80
圖 69：西班牙諸聖教堂考古遺址解說中心 1 樓平面圖.....	80
圖 70：市定古蹟劉銘傳隧道修復工程.....	82
圖 71：望海巷海灣串聯計畫.....	83
圖 72：望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程於 109 年完工.....	84
圖 73：望海巷漁港友善人行暨景觀工程於 110 年完工.....	85
圖 74：基隆市於首都圈整體發展定位圖.....	89
圖 75：基隆河谷廊帶整體計畫願景.....	90
圖 76：基隆河谷總體產業空間構想圖.....	90
圖 77：108 年 4 月 30 日蔡英文總統親自蒞臨六堵抽水站，宣布基隆 河流域土地開發管制解除.....	93
圖 78：北五堵國際研發新鎮示意圖.....	94
圖 79：基隆捷運路線圖.....	96
圖 80：基隆捷運八堵站與附近地區規劃示意圖.....	98
圖 81：基隆捷運七堵站與附近地區規劃示意圖.....	98
圖 82：基隆捷運六堵站與附近地區規劃示意圖.....	99
圖 83：基隆捷運百福站與附近地區規劃示意圖.....	100
圖 84：基隆捷運北五堵站與附近地區規劃示意圖.....	100
圖 85：和一路停車場今年完工啟用.....	106
圖 86：七堵舊站停車場今年完工啟用.....	106
圖 87：調和街轉運站工程竣工.....	108
圖 88：調和街轉運站工程竣工.....	108
圖 89：停六停車場位置示意圖.....	110
圖 90：停六停車場規劃設計圖.....	110
圖 91：長庚醫院站新式候車亭.....	112
圖 92：信一路示範道路.....	116
圖 93：義一路示範道路計畫.....	116
圖 94：實踐路示範道路計畫.....	117
圖 95：麥金路示範道路計畫.....	117
圖 96：義六路道路改善工程.....	118
圖 97：中和路拓寬工程.....	119
圖 98：六堵工東街道路拓寬工程.....	119
圖 99：中山一、二路拓寬工程於 109 年全線通車.....	120
圖 100：工建西路暨俊賢路沿線人行道改善工程.....	122
圖 101：信四路人行空間改善工程.....	122

圖 102：城隍廟及東岸廣場地下道整修工程.....	123
圖 103：東勢街路廊改善工程.....	123
圖 104：七賢橋改建工程.....	125
圖 105：19 號及 21 號橋改建工程.....	125
圖 106：中正高架橋護欄及隔音牆改善工程.....	126
圖 107：基隆河岸自行車道路線圖.....	130
圖 108：全線水防道路改善 10 公里.....	131
圖 109：舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道路地坪改善.....	131
圖 110：基隆地區漏水率下降趨勢圖.....	135
圖 111：本市建置全方位地理資訊系統，可由 3D 視角檢視早期都市 規劃合理性.....	136
圖 112：「基隆市全方位地理資訊系統」精緻建模，可搭配其他圖資體 現未來建設完成的結果.....	137
圖 113：安樂一期國宅都更工作站於 110 年 9 月開幕.....	140
圖 114：104-111 年度本市教育經費預算數趨勢圖.....	142
圖 115：市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施更新整建工程....	151
圖 116：市立網球場及附設籃球場鋪面改善工程於 111 年 7 月 24 日正 式完工啟用.....	151
圖 117：深美國小半戶外球場.....	153
圖 118：暖西國小半戶外球場.....	153
圖 119：成功國小示範以校園為核心的城市改造計畫.....	159
圖 120：中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程完工.....	161
圖 121：中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程完工.....	161
圖 122：中和國小老舊校舍整建工程於 111 年 6 月 20 日落成啟用..	164
圖 123：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形.....	165
圖 124：本市公立及非營利幼兒園收托名額成長圖.....	167
圖 125：本市 2 歲幼兒入園比例成長圖.....	167
圖 126：仁愛親子館修繕工程於 106 年 12 月完工.....	169
圖 127：基隆祖孫館修繕工程於 106 年 12 月完工.....	169
圖 128：信義親子館示意圖.....	170
圖 129：暖西國小-軟絲樂園.....	173
圖 130：堵南國小-大船入港.....	173
圖 131：仙洞國小-城堡貨櫃屋.....	173
圖 132：八斗國小-八斗部落文化村.....	173
圖 133：長樂國小-蜻春蜓園.....	173
圖 134：成功國小-fun 電樂園.....	173
圖 135：本市開放全市 54 所國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板.....	177
圖 136：基隆社區大學辦理「大基隆歷史場景導覽人才培訓」.....	180

圖 137：文化中心演藝廳暨周邊整體裝修工程已於 111 年 7 月完工	184
圖 138：文化中心演藝廳暨周邊整體裝修工程已於 111 年 7 月完工	184
圖 139：基隆潮藝術作品.....	188
圖 140：舊情綿綿-葉俊麟懷念音樂音樂劇.....	189
圖 141：廖瓊枝的歌仔戲歲月特展及璀璨牡丹音樂會.....	189
圖 142：紙風車劇團藝文表演.....	190
圖 143：台灣特技團表演特技雜耍.....	190
圖 144：大班幼兒劇場體驗落實文化平權.....	191
圖 145：大班幼兒劇場體驗落實文化平權.....	191
圖 146：主普壇耐震補強暨修復工程於 110 年 1 月完工.....	193
圖 147：私有老建築保存再生計畫—整修完成之「梅英居」.....	197
圖 148：城市博覽會期間以「光照港灣—林開郡洋樓亮起來！」為主題，打開洋樓大門.....	197
圖 149：城市博覽會期間林開郡洋樓一樓展出歷史文物.....	198
圖 150：海洋廣場空間活化改善工程.....	200
圖 151：東岸複合式商場.....	201
圖 152：田寮河畔公園闢建.....	202
圖 153：成功國小西側 29 號橋下環境美化與空間整建工程.....	203
圖 154：正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫.....	204
圖 155：「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，以國門廣場周邊地區為劃設範圍.....	206
圖 156：大武崙森林運動公園全區景觀規劃配置圖.....	210
圖 157：基隆市大武崙森林運動公園第一期工程完工啟用.....	211
圖 158：大武崙森林運動公園二期規劃設計圖.....	212
圖 159：暖暖運動公園遊戲場於 111 年 6 月 21 日落成啟用.....	214
圖 160：暖暖運動公園遊戲場於 111 年 6 月 21 日落成啟用.....	214
圖 161：暖東峽谷環山遊憩步道改善工程.....	215
圖 162：暖東峽谷環山遊憩步道改善工程.....	216
圖 163：「西岸人行路廊景觀空間環境改善工程」完工示意圖.....	217
圖 164：旭川河水質改善現地處理工程.....	219
圖 165：田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程.....	219
圖 166：南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程.....	219
圖 167：西定河水環境改善計畫細部設計圖.....	219
圖 168：潮境海灣資源保育區海底恢復蓬勃生機.....	221
圖 169：潮境海灣資源保育區海底恢復蓬勃生機.....	221
圖 170：103 年至 110 年基隆市 PM _{2.5} 濃度下降趨勢圖.....	226
圖 171：城市色彩示範計畫—正濱漁港地區(色彩屋).....	231
圖 172：歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程.....	231

圖 173：正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程.....	232
圖 174：正濱漁港作業漁棚彩繪.....	232
圖 175：2022 城市博覽會海派浪漫光雕秀.....	234
圖 176：全市觀光據點導覽指示系統改善工程.....	235
圖 177：基隆觀光巴士結合藝術家彩繪，於 110 年 12 月新裝亮相..	237
圖 178：打造「拉波波村」為北台灣最佳親子露營空間之一.....	239
圖 179：淡蘭百年山徑暖暖行旅遊手冊.....	241
圖 180：漫遊百年小城七堵行旅遊手冊.....	241
圖 181：基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善工程.....	243
圖 182：104 至 111 年影視協拍件數統計比較.....	245
圖 183：「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍公告調整.....	246
圖 184：情人湖入口及步道周邊景觀改善工程.....	249
圖 185：外木山湖海路一段自行車步道改善工程.....	249
圖 186：和平營區二圍牆退縮及人行道廣場新建工程.....	250
圖 187：阿拉寶灣周邊步道及景觀改善工程.....	250
圖 188：104-111 年度本市原住民文化經費預算數趨勢圖	252
圖 189：海濱原住民國宅周邊環境改善工程—部落聚會所整建.....	254
圖 190：海濱原住民國宅周邊環境改善工程—原住民特色瞭望台整建	255
圖 191：2022 城市博覽會原住民假日市集.....	256
圖 192：2022 城市博覽會原住民假日市集.....	256
圖 193：基隆原住民聯合豐年祭.....	258
圖 194：104 年至 111 年 8 月 31 日老人申請假牙補助情形.....	265
圖 195：假牙裝置完成後 3 個月滿意度分析.....	266
圖 196：本市租金補貼名額成長圖.....	271
圖 197：本市社會住宅「光明安居」初步規劃示意圖(後續仍依招標及 實際執行為準).....	274
圖 198：本市動物收容所(寵物銀行)整建工程規劃示意圖.....	277
圖 199：本市動物收容所(寵物銀行)整建工程預計於 111 年 10 月 10 日 完工.....	278
圖 200：2020 狗狗森友會趣味遊戲.....	280
圖 201：2022 狗狗森友會狂犬病疫苗注射站.....	280
圖 202：本市率全國之先針對傳統市場進行管制.....	283
圖 203：本市率全國之先實施「雙單一套」高規格防疫措施.....	284
圖 204：率全國之先與慈濟基金會合作，共善餐食直送急困學生家中	285
圖 205：本市於各區設置社區篩檢站，111 年 6 月 18 日起已全數功成 身退.....	289

圖 206：整備本市已裁撤之市立仁愛之家，領先全國設置機構型後送 收治站.....	291
圖 207：本市 104 年至 111 年 7 月止商業登記家數成長圖.....	303
圖 208：110 年基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫青創團隊 「海洋廢人工作室」，以親海教育遊程為創業內容.....	308
圖 209：110 年本市辦理「潮嚮×山海基隆—八斗子市集」休閒農業推 廣行銷.....	313

表 1：104-111 年度本市歲出預、決算數一覽表(單位：億元).....	3
表 2：大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0.....	67
表 3：大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0.....	74
表 4：本市開通 4 條快捷公車載客情形(截至 111 年 8 月 31 日止)...	104
表 5：103 年至 111 年 8 月全市停車位數量統計表.....	105
表 6：104-111 年已完工之示範道路計畫	114
表 7：執行中之示範道路計畫.....	114
表 8：爭取中之示範道路計畫.....	115
表 9：104-111 年已完工之道路改善或拓寬工程	118
表 10：104-111 年已完工之人行路廊或人行地下道改善工程	121
表 11：104-111 年執行中之人行路廊或人行地下道改善工程.....	121
表 12：本市污水下水道系統第三期實施計畫進度.....	128
表 13：基隆河岸自行車道中央跨域合作 1.8 億元串連項目.....	130
表 14：行政院核定本市優先執行高地供水改善社區辦理情形.....	133
表 15：本市達成「雙語教育一條龍政策」目標.....	144
表 16：推動智慧教育十部曲.....	148
表 17：107-111 年本市修繕運動場館一覽表	150
表 18：本市完成設置 8 校半戶外球場.....	152
表 19：本市 12 所學校運動環境及設施設備改善一覽表.....	155
表 20：美力校園運動計畫各校整建情形.....	157
表 21：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形.....	165
表 22：各親子館 104-111 年度(截至 8 月)活動場次及人次.....	168
表 23：本市各區特色遊戲場辦理情形.....	172
表 24：本市國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板執行進度.....	176
表 25：111 年度基隆市區大學辦理成效說明.....	179
表 26：黃蠟石文化館歷年辦展成果.....	192
表 27：私有老建築保存再生計畫.....	196
表 28：104 年-111 年本市各區公園綠地改造計畫一覽表	207
表 29：基隆港市水環境改善計畫執行情形.....	218
表 30：正濱漁港周邊環境設施整建完工項目	230
表 31：北觀處於本市轄管景點完成之重點建設.....	248
表 32：原住民福利調整表.....	252
表 33：原住民新增福利項目	253
表 34：本市文化健康站服務原住民長者情形(單位：人次).....	259
表 35：強化社會安全網第二期計畫執行情形.....	261
表 36：本市長期照顧計畫 2.0 各服務項目使用情形.....	264
表 37：104 年至 111 年 7 月敬老卡乘車補助情形.....	268
表 38：104 年至 111 年 8 月 31 日止婦女生育獎勵金發放情形.....	275

表 39：公有市場建築物耐震補強工程.....	302
表 40：本市二大工業區近年投資金額與投資家數.....	304
表 41：本市二大工業區申請工業區立體化方案審查結果.....	306
表 42：本市二大工業區之工業區立體化方案執行成果.....	306
表 43：本市中小企業圓夢貸款核貸情形.....	311
表 44：104-111 年度中央/國際考核績效榮譽榜統計表	315
表 45：104 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表	315
表 46：105 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表	317
表 47：106 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表	319
表 48：107 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表	322
表 49：108 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表	324
表 50：109 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表	326
表 51：110 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表.....	328
表 52：111 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表.....	331

基隆市議會第 19 屆第 8 次定期會 施政總報告

蔡議長、林副議長、各位議員先進，各位媒體記者先生、女士，以及各位市民朋友，大家好！

今天是貴會第 19 屆第 8 次定期大會開議的日子，^{右昌}應邀率領市府團隊前來進行施政報告。首先，我要感謝各位議員先進一直以來對本府的支持和指教，讓各項市政工作能夠順利推動，致上最高的敬意與謝意。

壹、城市博覽會開創基隆新起點

一、面對、超越阻礙，帶領基隆加速向前

基隆市曾因繁忙的港口盛極一時，但隨時代變遷逐漸沒落，基隆市容老舊、城市發展停滯不前。^{右昌}上任前，就已經提出「一個核心、兩個翅膀，以及基隆河谷廊帶」城市發展策略，以基隆市港為核心，整合東北角與北海岸這對翅膀，把基隆市放到大台北首都圈架構重新思考基隆市港的定位，

要讓基隆城市再生。

然而，103 年 12 月 25 日 ^{右昌} 就任市長時，面臨本市財政負債達 124.29 億元、負債比高達 47.37%，8 年來，市府努力維持財政穩健，逐年降低債務，至 110 年底，本市債務餘額為 76 億元、負債比下降至 28.97%，減少債務餘額 48.29 億元，債務餘額降低將近 4 成；截至 111 年 8 月，本市債務餘額為 55.2 億元、負債比下降至 20.91%，減少債務餘額 69.09 億元，且無短期債務，大幅改善了本市的財政狀況。

同時，市府團隊也積極向中央爭取各種計畫型、競爭型補助，並獲得行政院及中央各部會的高度肯定與實質支持，本府總預算規模大幅成長，從 104 年度的 172.2 億元（含追加預算），提升至 111 年度 222.3 億元，總預算規模成長達 29.09%，本市各項建設因此能夠逐步推展、邁步向前。

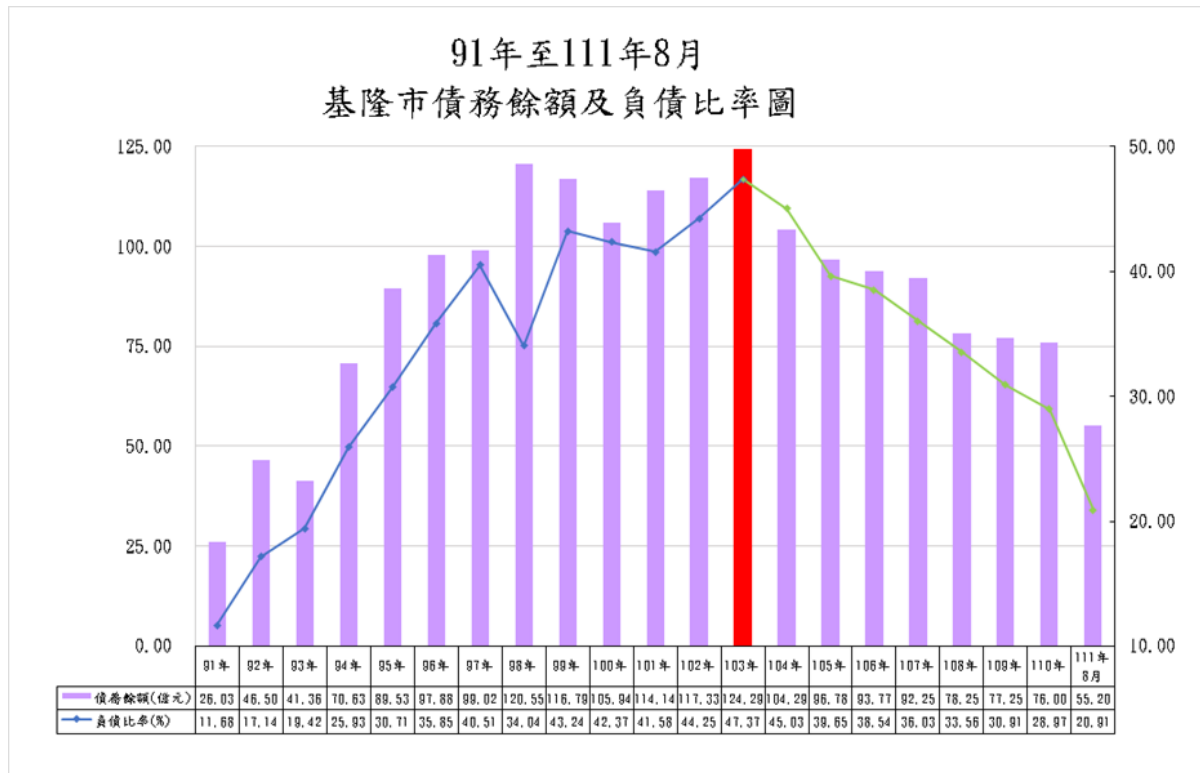


圖 1：91 年至 111 年 8 月基隆市債務餘額及負債比率圖

表 1：104-111 年度本市歲出預、決算數一覽表(單位：億元)

年度	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
A:年度預算數	163	174.9	172.8	177.1	194.2	199.6	215.5	211.5
B:追加減預算數	9.2	5.9	5.2	11.9	9.8	6.7	3.7	10.8
A+B:追加減後預算數	172.2	180.8	178	189	204	206.3	219.2	222.3
決算審定數	160	166	165	173	186	188	200	-




圖 2：104-111 年度預算（含追加減預算）趨勢圖(單位：億元)

除了財政改善之外，為了加速市政工作往前推動，適應市政長遠發展，市府 106 年起逐步推動市府及所屬機關組織改造，使人力配置更合理、人力運用更有效益。

在市府組織改造部分，108 年將市府交通旅遊處觀光業務與行政處新聞科業務結合，整併成立「觀光及城市行銷處」；交通旅遊處更名為「交通處」，專責辦理交通相關業務；行政處與研考處整併為「綜合發展處」，市府單位數維持 20 個處局不變。藉由組織改造，讓市府組織能夠與時俱進，業務分工更加專精，市政推展更加順暢有力。

二、城市博覽會，見證 8 年市政成果



圖 3：2022 城市博覽會 A、B、C、K 四大展區位置圖

經過 8 年來的打拼，市政成果在今年 6 月 10 日至 6 月 19 日透過城市博覽會呈現在國人面前，整個基隆都是展場，我們用整座城市的尺度，讓國人看見這 8 年來，^{右昌}帶領市府團隊努力打拼建設基隆的具體成果，邀請國人一同見證基隆的翻轉與蛻變。

城市博覽會第一天的上午，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌共同出席開幕典禮，蔡總統非常肯定^{右昌}與市府團隊透過

設計力及執行力改變基隆，每次來到基隆都有驚豔之感，期許能夠從基隆這個起點城市走向疫後新生的起點；蘇院長也讚許^{右昌}帶領市府團隊，在地方與中央的大力支持下，山海解禁、市港重生，基隆已大幅蛻變，找回自信的態度。

立法院長游錫堃接續出席第一天晚上的點亮城市行動計畫。游院長首先肯定^{右昌}率領市政團隊在基隆增加了許多令人刮目相看的建設，許多景點轉變為色彩繽紛的模樣，基隆港也變成人人爭相打卡的觀光熱門景點，接著與舞台上的來賓一起按下按鈕，啟動會場上光塔的雷射光束，依序點亮位於城市各角落的基隆地標、太平國小光電獸、文化中心光雕展演、正濱色彩屋海派浪漫光雕、郵輪廣場上的光脊丘、海洋廣場上的海境、城際轉運站旁的山海鳴光、國門廣場水舞等以光為發想的藝術裝置，展現出基隆夜晚繽紛的樣貌。市府團隊把整個內港地區變成光的舞台，讓為期 10 天的城市博覽會，不管白天、黑夜都精彩。

城市博覽會期間，許多來賓包括蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、交通部長王國材、無任所大使林佳龍、故宮院長吳密察、桃園市政府團隊、高

雄市政府團隊、都市設計學會、台灣現代建築學會等等，親自來到基隆參訪本市城市治理的經驗與成果，甚至包括法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐等人、9 國駐台使節或代表都前來本市進行國際交流，讓世界看見基隆的蛻變。

右昌

親自陪同來賓參觀各展區，並說明基隆在台灣歷史扮演重要的起點。基隆是台灣現代化的起點城市，基隆港是台灣第一個現代化港口，鐵道縱貫線起點、高速公路起點都在基隆，台灣的第一台電腦從基隆港下船，基隆委託行是北台灣流行時尚的起點，基隆曾經有過太多、太多的台灣第一，曾是一座充滿繁華榮景的城市，但隨著經濟型態的轉變，過去 30 年來沒有對全球化衝擊做出即時回應，城市發展逐漸停滯不前。

右昌

為了解決基隆的沉痾，在還沒上任前就已經展開行動，邀請規劃設計界的專家組成頂尖顧問團隊，共同研究城市治理的策略；並分享上任 8 年來，如何帶領市府團隊跳出地方治理的框架，打破狹隘的地域主義，拉高視野從北北基桃竹首都圈、甚至全球的角度，找到基隆這座城市的發

展定位，並且透過具體擬定與執行「市港再生標竿計畫」、「基隆山海城串聯再造計畫」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」三大計畫，一邊償還上任前即存在多年的高額市債，一邊努力爭取中央經費建設基隆，歷經 8 年戮力不懈進行大規模的城市改造，如今基隆才能展現出國家海洋門戶的大格局，變得亮眼又有活力，展開全新的臨港水岸休閒生活，並且找回 400 年來豐厚的歷史文化底蘊。

右昌也分享 2014 年上任後，用「15 分鐘城市」的概念推動都市再造，透過「校園為核心」的社區改造計畫，讓以校園為中心的社區生活圈，可以透過周邊公共建設的整建與改善，讓老舊城區再次活絡，並讓社區民眾在 15 分鐘內的步行距離即可滿足生活所需，打造人本舒適的生活環境，這與世界各主要城市推行的政策有異曲同工之妙。

城市博覽會期間也有許多民眾、團體、各行各業的專家到場觀展，A、B、C、K 四個展區都湧現人潮，大家都驚豔於基隆的脫胎換骨與華麗蛻變，活動官網也吸引超過 20 萬人次的高瀏覽量，甚至有許多民眾表示展期 10 天內社群網站被城市博覽會的消息洗版，城市博覽會獲得佳評如潮。

市府透過城市博覽會要向國人證明，在城市治理上，沒有錢也有沒有錢的作法，沒有人也有找人的方法，只要有價值理念、有執行力、有實踐力，就能夠改變一個城市的命運。曾經是失業率、離婚率、自殺率三高及負債率高的基隆，能夠成功翻轉蛻變，這樣的城市治理經驗，希望也能帶給台灣各個城市信心，基隆做得到，其他城市也做得到。

這次為期 10 天的城市博覽會總計吸引約 101 萬人次參觀，以下^{右昌}分別就 A、B、C、K 四個展區說明辦展成果：

一、A 國門展區

A 國門展區以基隆港為起點，往西到太平山城和基隆地標，往東到基港大樓和文化中心，以「設計」為主題，利用三個修復後的歷史建築——西二倉庫「主題館——起點城市」、舊火車站「基隆聯合事務所——時代基隆」、太平國小「社區設計館——城市參與製造所」來展現基隆市港再生計畫的成果。

A 展區為本次城市博覽會的主展區，三大展覽館展出內容說明如下：

1.主題館一起點城市：

主展館「起點城市」展現市府以設計、文化、永續的核心價值，回應當代台灣城市發展的課題，一覽博覽會與全展區之精神，了解自信城市與 15 分鐘城市建立的過程，民眾可透過參與、沉浸式體驗，回顧基隆的經典時刻與展望未來。



圖 4：「城市博覽會主展館一起點城市」，回應臺灣城市發展課題

2.基隆聯合事務所—時代基隆：

「基隆聯合事務所」從現代性與全球化角度剖析城市的特色，帶領民眾走進專業設計團隊的工作空間，分享市府如何集結多方專業者與行政能量、有秩序地擴大社群參與，重

新擁抱港市相依、城丘相連特色，推動基隆城市再造。



圖 5：「基隆聯合事務所—時代基隆」，展現聯合眾人專業改變翻轉基隆城市的秘密

3.社區設計館—城市參與製造所：

「城市參與製造所」呈現市府近年推動重大政策過程中，以「參與」及「共創」為核心，從個人、社群、社區及城市等由小到大各種不同尺度，各方如何合作協調，以及從眾人的關心、參與及行動等，一起成就基隆未來願景。



圖 6：「社區設計館—城市參與製造所」，展現集眾人之力成就基隆未來城市願景

A 展區也藉由甫完工的國門廣場打破城市和港區的界線，打開基隆做為國家海洋門戶的無限可能，並規劃海上觀展體驗，帶領民眾從海上的角度欣賞基隆城市風貌；展區內設置多項以基隆元素為發想的藝術裝置、光雕作品等，且運用城際轉運站的戶外空間規劃市集，集結基隆各地的伴手禮。A 展區透過不同的軟體文化、硬體建設、多元的內容陳設手法，全方位展現國門展區的改變與發展。



圖 7：城際轉運站「山海鳴光」大型公共藝術裝置點亮基隆城市

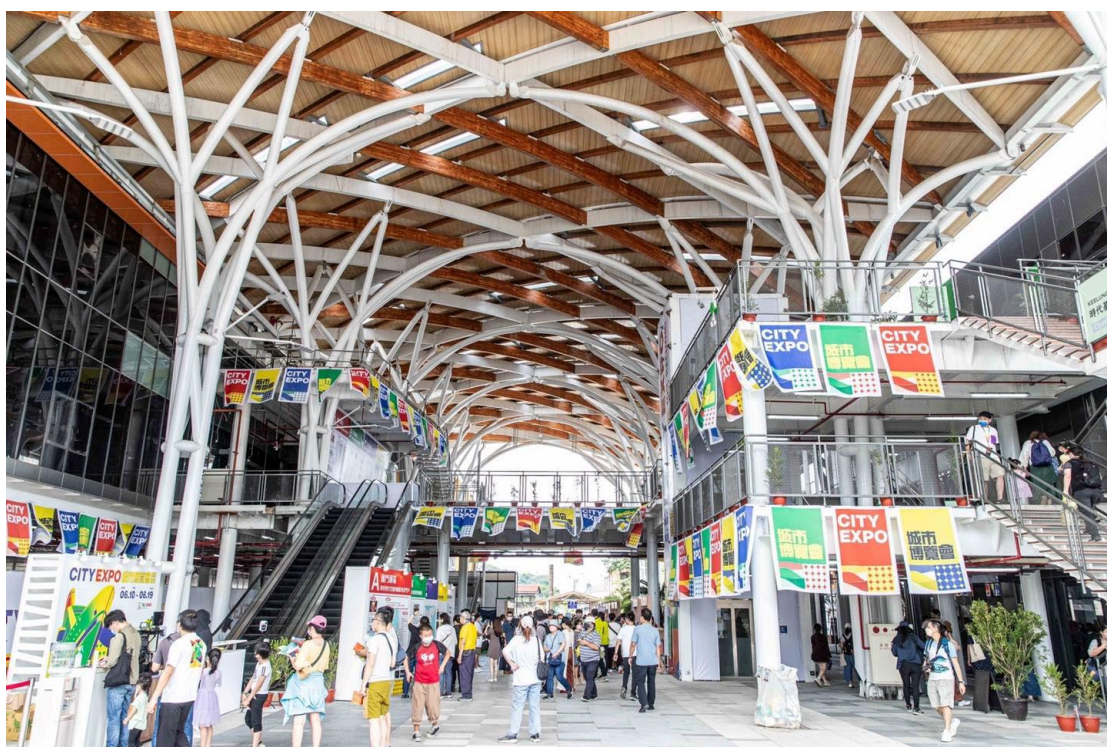


圖 8：城際轉運站「禮好市集」展售基隆特色商品



圖 9：海上看展活動帶領民眾從海上角度認識基隆




圖 10：海洋廣場光雕作品《海境》，探討人與海的距離



圖 11：文化中心光雕展演訴說基隆 400 年來的歷史人文風貌

二、B 正濱展區

B 正濱展區從藝術、歷史、多元文化出發，以正濱漁港作為主軸連結周邊地區，並讓修復後首次對外開放的漁會正濱大樓作為最大亮點，同時包含阿根納造船廠、原住民文化會館、西班牙諸聖教堂考古遺址等，透過多元的展覽、市集活動、光雕展演，呈現基隆自大航海時代開始，四百年來的歷史、產業、城市紋理。B 展區以豐富的文化底蘊為基礎，藉由當代藝術、科技、展演、居民互動，展現基隆的多元風貌，也為基隆的城市發展開拓了更多可能性。



圖 12：正濱漁港海派浪漫光雕秀



圖 13：「大基隆。市」市集邀集全台 30 間知名飲食品牌，用味道向 400 年來的基隆飲食文化致敬



圖 14：漁會正濱大樓修復完成後於城市博覽會首度對外開放



圖 15：「潮藝術」展覽呈現基隆城市集體記憶



圖 16：「水產市—被漁滋養的海事盛地」展覽，以裝置藝術介紹北臺灣最大漁場北方三島



圖 17：眺望大基隆歷史場景—眺望板結合《誰來基隆》系列繪本，解說基隆 400 年來歷史文化

三、C 海科展區

C 海科展區以海科館為軸心，往北至潮境公園，往東到望海巷漁港。C 展區特展—海之聲，以「聽見海洋多元的聲音」為主軸，以不同樂曲結構代表基隆傳統漁村轉型的各個階段；搭配不同的地景聲音，帶領民眾進入人海關係演進的時間長廊中，探索人們為了生存必須取之海洋的「生存」模式到環保意識抬頭，尋找與海洋和平共生的「生活」，一直到追尋並實踐海洋資源永續的「生命」復育的過程。

C 展區也規劃各式海洋活動，如：開放式漁村學堂、漁夫食堂與山海直售所、風光語海音樂會、8K 影像劇場、潮境方舟、海科夜未眠光雕秀等等精彩活動，結合地方文化創意，民眾從玩樂中學習，認識海洋環境保育並感受漁村再生魅力。C 展區展現出人與海密不可分的關係，帶領民眾找回人與海洋之間的共鳴。



圖 18：海洋科技博物館「海之聲」特展



圖 19：民眾於農漁村市集中體驗「新船下水」儀式



圖 20：開放式漁村學堂推出小旅行遊程



圖 21：「風光語海音樂會」於潮境公園登場

四、K 沙灣展區

K 展區包含沙灣歷史文化園區及要塞司令部等 2 個展區，為充滿軍事意象的場域，此次 K 展區運用親子共樂、創意匯聚特色，以「老沙灣，新玩法」為策展主題，規劃具親子風格的一系列展覽與活動，並推出伴手禮、胖卡餐車市集，打破軍事重地嚴肅框架，吸引民眾前來參與，提高基隆的文化資產能見度。



圖 22：享食沙灣—輕食市集與親子演出



圖 23：沙灣藝術裝置展現童趣



圖 24：「誠品書店—時光繪本書屋」於基隆要塞司令官邸及校官眷舍
展售千本基隆相關選書



圖 25：「基隆.zip 多媒體互動展」於基隆要塞司令部展出基隆悠長的
土地記憶



圖 26：要塞司令部軍補庫房「穿越基隆的時空」展覽，用船隻訴說
基隆的故事



圖 27：要塞司令部舉辦「舞鈴劇場—山海之光」藝文活動

透過 10 天展期、4 大展區，完整呈現市府 8 年來戮力推動市政建設的具體成果，城市博覽會已於 6 月 19 日順利圓滿落幕，城市博覽會展期的結束不是句點，而是城市新的起點。市府未來將繼續努力推動各項市政建設，持續改造、發展基隆，讓城市的進步延續下去。

貳、基隆市港再生標竿計畫

右昌

上任後，提出將基隆建設為「大台北首都圈東側

海洋國家門戶」的構想，並以國家發展的高度，整合中央相

關部會的資源和力量，具體擬定為「基隆市港再生標竿計畫」，

獲得蔡英文總統與行政院歷任包括林全院長、賴清德院長及

蘇貞昌院長的全力支持，做為國家重大施政項目。

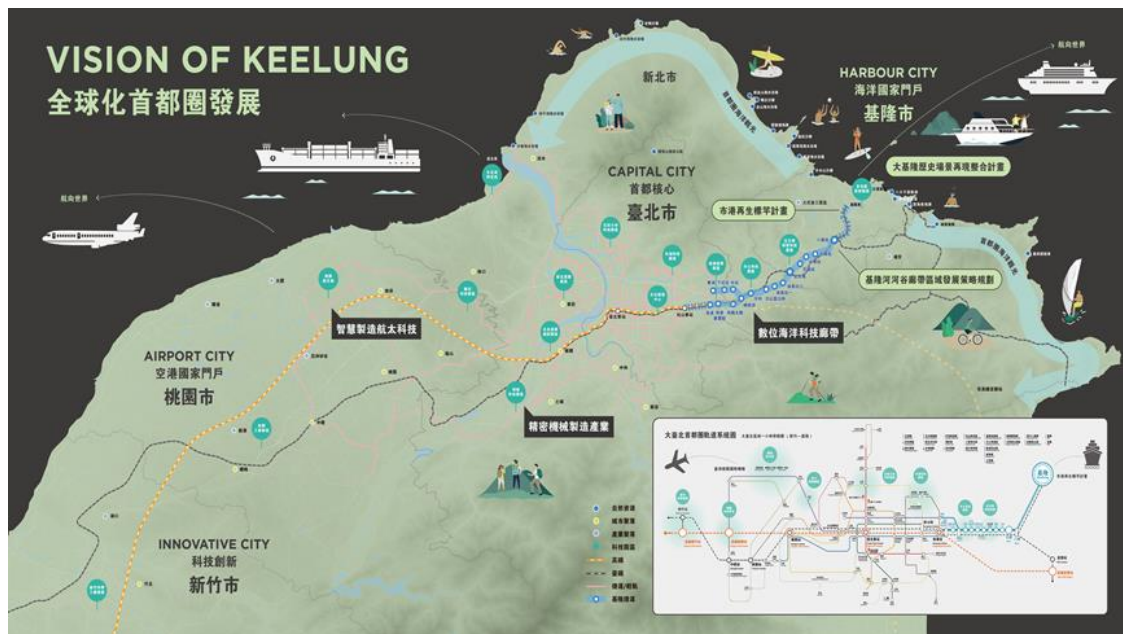


圖 28：基隆在首都圈內的全球化城市發展定位，將基隆建設為「大台北首都圈東側海洋國家門戶」

右昌

率領市府團隊戮力推動這項大規模的城市再造

計畫，為了盡量不影響市民的日常生活，我們要求每個工程

施工階段都要落實工進、細膩搭接，經過 8 年的努力，如今已展現出具體成果。



圖 29：基隆市港再生標竿計畫

以下謹就各項建設成果說明如下：

一、中山一、二路拓寬工程

中山一、二路拓寬工程，並不是單純的把道路拓寬，而是一個現代城市必備的活力動脈，讓各種機能夠連結，一個城市的生命活力才能真正發揮。

右昌

在第一任上任後，便發現當時中山一、二路拓寬工程無法推動的阻礙，在於過去市府沒有發揮跨領域協調的功能，而單單只是讓工程單位應付各種不屬於工程的問題，

包括像是社會救助關懷議題、地政議題、建築管理議題等，導致工程方面早已全面停滯。

因此，^{右昌}對中山一、二路拓寬工程的協助上，便是親自帶領市府團隊，全方位的進行拓寬工程的推動，指示社會處、都市發展處、地政處、民政處以及區公所等，各自針對不同的議題進行解決，例如拆遷問題，歷經前二任市長，多次陳情抗爭仍無法妥善解決。而^{右昌}在 104 年 3 月間親自與拆遷戶協調，終於在 104 年 9 月 1 日將 60 餘戶拆遷戶完全遷離，使延宕多年的施工瓶頸，得以順利突破。港西高架橋於 106 年 4 月 10 日通車啟用，而中山一、二路拓寬工程終於在 109 年 9 月 1 日全線通車，打通了基隆西岸的血脈。



圖 30：中山一、二路拓寬工程

二、忠一路貫通工程於 107 年完工

107 年 11 月 1 日忠一路至中山一路正式貫通，代表長久以來基隆東、西岸之間因軌道造成的分割已經消失，整個都市完成了縫合，再搭配新闢完成的中山一、二路，整個基隆市的核心功效能順利運轉。

各位應該還記得，現在忠一路貫通的地點，是過去的國光客運候車大樓，周邊的道路也都是各家客運業者的站牌，市民的候車空間相當不友善。因此，^{右昌}也同時在周邊進行

了公共運輸轉運的整合專案，包含國道客運、省道客運、市公車，都整合到基隆城際轉運站當中，讓軌道運輸和客運運輸順利發揮轉乘效益，也讓忠一路的貫通效益加倍。



圖 31：忠一路貫通工程

三、基隆火車站南站廣場工程

105 年市府完成中山橋下孝四路攤販拆遷作業，並將原於孝四路的福和客運路線移至港西街停靠，國光客運部分則採站內月台共用方式移設，讓交通部鐵工局順利於 106 年 3 月完成拆除孝四路圍牆。

市府後續在 106 年 7 月順利完成中山橋孝四路引道拆除工程，讓長期受橋梁遮蔽的住戶得見光明，原本陰暗的孝四路與忠二路整個明亮起來，南站廣場工程接續順利在 106 年 10 月完工啟用，展現出火車站周邊寬闊明亮的視野。



圖 32：基隆火車站南站廣場工程

四、西岸會展與旅運智慧大樓開發案預計今年第 3 季 完成修正招商文件、112 年辦理正式公告招商

西岸會展與旅運智慧大樓開發案，基隆港務分公司以「讓與地上權」方式辦理投資招商，並於 110 年 9 月 2 日辦理招商前座談會，蒐集意見檢討投資數額估算，至 110 年底已接洽 45 家業者。因西六倉庫與四六運指部已完成拆除，地政事務所於 111 年 4 月底辦理土地預為分割與重測，並就部分分割測量疑義於 7 月底完成修正資料，後續將修正招商範圍面積，以及考量投資業者意見修正招商資料，預計今年第三季完成修正招商文件，112 年辦理正式公告招商。

五、西 2、西 3 倉庫旅客中心已於今年 3 月竣工，刻 正辦理西 2 倉庫一樓暨停車場招商

為活化歷史建築資產，並提升港埠旅運服務品質，基隆港務分公司以專案計畫辦理西 2、西 3 倉庫歷史建築修建為現代化旅客中心，強化基隆港西岸提供國際郵輪、兩岸及離島客輪之通關服務，並兼作文創及觀光發展，工程經費約 7.4 億元，已於今年 3 月竣工。

目前西 3 倉庫 1 樓已提供國內旅運功能，西 2 倉庫 1 樓則規劃為文創空間。西 2 倉庫於今年 5 月 4 日至 7 月 12 日止辦理一樓暨停車場公告招商，無廠商投標，將重新檢討招標內容後，擇期公告。

西 2、西 3 倉庫與東岸旅客中心皆已完工，成為基隆港東西岸相互輝映之雙亮點，營造國家港口門戶優質環境。

六、舊國光客運站與忠一路天橋拆除

阻隔基隆東岸和西岸發展的，除了軌道，還有早期為了降低人行事故而興建的忠一路人行陸橋，和為了通勤而興建的國光客運站；在市民心中，此兩座建築雖然不便，卻又是基隆過去的重要城市記憶，因此，為了讓市民對新的基隆有所期待，同時也對於過去的記憶予以紀念，^{右昌}特別舉辦了國光客運站和忠一陸橋的感恩活動，讓市民對基隆的發展以及未來，能藉由空間延伸到時間，也串起市民對城市的期待。

此外，在拆除的過程中，為了降低對市民的生活衝擊，^{右昌}也對工程單位提出很多難題，讓工程單位發揮專業及潛能，事前詳細沙盤推演，跨局處整合做足準備，定案要用 48

小時來完成，而施工後進度大幅超前，最終以 30 個小時即完成拆除作業，並迅速清理施工現場，恢復市區交通順暢。



圖 33：未拆除前的舊國光客運站及忠一路天橋



圖 34：忠一路天橋拆除工程

七、國門廣場第一階段工程已於今年 6 月 6 日正式啟用，第二階段工程刻正辦理規劃設計審查作業

近年隨著郵輪產業蓬勃發展，帶動港區觀光，然而這些臨港水岸空間卻呈現破碎情形，缺乏整體性規劃。為打造國家港口門戶新意象，市府在火車站圓環周邊區域規劃施作國門廣場計畫，以串接海洋廣場、西 2 及西 3 碼頭倉庫旅運設施中心、城際轉運站、基隆火車站，營造視覺通透的水岸廊帶環境，提供民眾更友善的人行動線及舒適的休憩空間，此計畫是市港再生標竿計畫重要的一項子計畫。

國門廣場工程分為二階段施工，第一階段工程改造站前圓環區域為廣場，已於今年 6 月 6 日開放民眾使用，目前已舉辦多場活動，帶動港區生活的嶄新想像。晚間並有水舞聲光秀展演，增添國門廣場活動元素，國門廣場水舞未來將配合本市重要活動與節慶進行展演。

第二階段工程為國光客運臨時站拆除，串接城際轉運站及國門廣場，型塑整體港區人本環境，刻正辦理規劃設計審查作業，預計於 112 年 3 月開工。



圖 35：國門廣場第一階段工程已於 111 年 6 月 6 日正式啟用

八、基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程預計今年 9 月底前完工

基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程總計投入 7 億 3,927 萬 6,073 元經費(交通部公路總局補助 3 億 6,987 萬元經費，行政院補助 2 億 6,600 萬元經費，本府自籌 1 億 0,340 萬 6,073 元經費)，於 108 年 6 月 8 日開工，預計 111 年 9 月完工，完工後市府將委託民間進駐營運管理。目前施工進度如下：

- 1.轉運站：建築物結構體已完成，目前進行室內、外裝修及水電工程。
- 2.大頂棚：結構體、裝修及水電工程均已完成。

- 3.舊火車站：結構補強及室內、外裝修及水電工程均已完成。
- 4.市公車亭：結構體已完成，目前進行裝修及水電工程。
- 5.景觀廣場：已完成，目前進行地坪與周邊環境順平及缺失改善。

本府辦理「基隆城際轉運站委託營運管理」公開招標採購作業已辦理完成評選作業，由美得泰先進醫護管理顧問股份有限公司得標；另「基隆火車站舊站委託營運管理」已辦理完成評選作業，由智歲全球股份有限公司得標。

目前正由廠商提出營運計畫，將於轉運站工程完工，進行內部裝修等整備工作後，正式對外營運服務。



圖 36：基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程完工示意圖

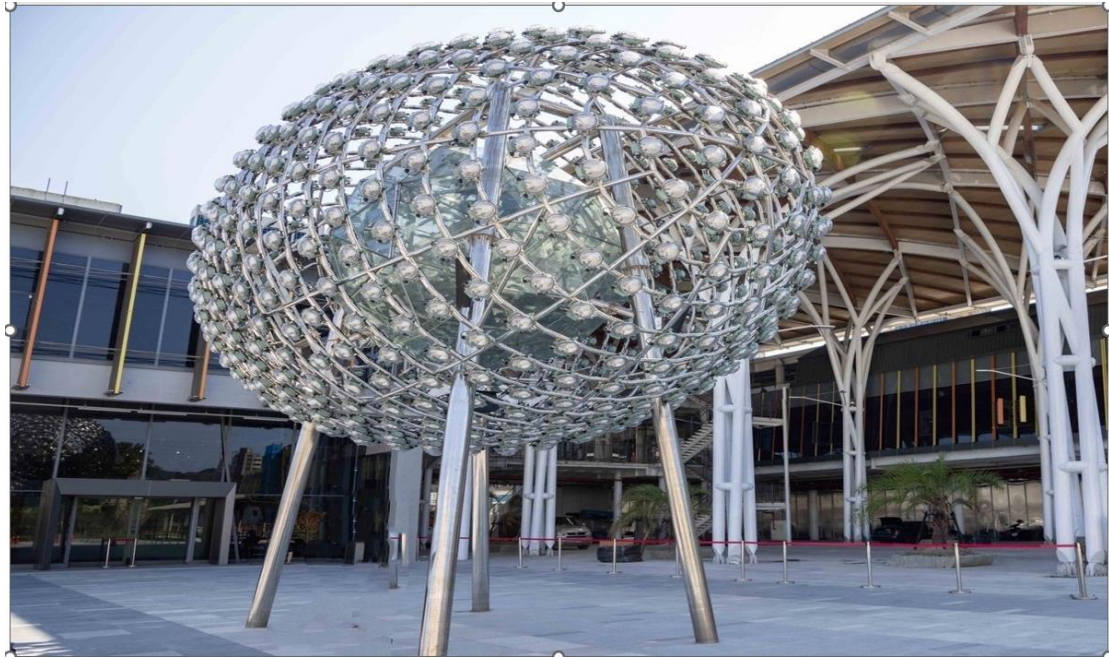


圖 37：基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程預計 111 年 9 月完工

九、太平青鳥吸引近 5 萬人次參觀，KEELUNG 地標 以嶄新面貌亮相

109 年配合中央地方創生計畫，市府指定太平山城為本市地方創生場域之一，太平國小作為地方創生重要核心基地，市府以藝文設計、建築等空間經營方向，於 110 年 3 月 29 日完成委外甄選，獲選委外單位為青鳥文化制作有限公司，於 110 年 10 月 23 日進駐開幕開設「太平青鳥」書店，當日吸引近千人參與。

太平青鳥書店以基隆山海城市及文化底蘊為基底，並配合太平國小作為公共開放空間，不以低消限制市民出入觀景，

並提供餐飲及休憩等服務設施。自 110 年 10 月 23 日開幕截至 111 年 8 月底，「太平青鳥」書店已辦理超過 40 場次等藝文沙龍活動，包括 30 場主題講座、6 場系列展覽及 5 場創意行動(音樂會、工作坊)，以上活動皆開放大眾免費報名參與。經人數流量統計，太平國小已吸引達 5 萬多人次參觀，除引動太平山城地方創生動能，亦帶動基隆地標及本市觀光周邊效益。

本府將持續以太平國小為西岸山城重要核心，刻正研議「太平國小活動場地申請使用管理辦法」，推動下一階段太平國小空間使用策略，為人口外移的山城注入新活力。

而位於太平青鳥右方的基隆著名景點—KEELUNG 地標，於今年 5 月 23 日完成照明裝置改善，以嶄新面貌正式點燈亮相，此次照明改善工程更新文字框限型燈，提高矩陣像素燈密度，並設置全新燈光控制系統，可顯示多種細緻動態畫面及於滿版處展現文字，以配合特殊節慶做各種變化。



圖 38：太平青鳥開幕當日吸引近千人參與



圖 39：KEELUNG 地標以全新樣貌點亮城市

十、西岸山城纜車可行性評估已完成，刻正辦理先期 規劃作業

為串連西岸山城觀光景點，結合西岸之地方創生、山海工作營、太平國小活化等相關計畫，完善港、城、丘串連，規劃以北口車站前廣場至西岸山城建置纜車接駁系統。市府針對市場、技術、環境等面向進行可行性評估，已於今年 1 月完成，刻正辦理先期規劃作業，將針對公共建設目的、民間參與方式、土地取得、興建、營運、移轉、履約管理、財務計畫等項目進行完整規劃。

本案已於今年 8 月 18 日於中山區民治里活動中心辦理公聽會，向民眾說明計畫內容，並蒐集相關意見作為參考。本府並編列 112 年預算 1,255 萬元，辦理山上站用地變更與上空權協調、水土保持規劃與地質安全評估、纜車系統興建工程前置規劃等作業，預計辦理期程約 1 年 6 個月；相關前置規劃辦理完成後，接續辦理纜車工程，工程經費約 5 億 7,061 萬元，興建期約 2 年 7 個月，預計 116 年營運啟用。



圖 40：西岸山城纜車山下站示意圖



圖 41：西岸山城纜車山上站示意圖

十一、忠一路人行路廊改善工程與新式候車亭建置

右昌

身為一個城市規劃者，深深了解到城市的生命力不在於大型建設，而在於人的活動，如何讓人願意在城市駐足、停留、甚至願意居住，是每個城市團隊的最重要使命。

忠一路人行路廊改善工程與 2 座新式候車亭的建置，正是基於這樣的出發點所推動的計畫。在這個計畫中所要傳達的，不單單是以人為本的信念，更是要讓市民體會到城市的活力來自每個市民本身，藉由市民走在忠一路上，感受到自己與城市之間的對話。

這樣的信念與實踐，在忠一路人行空間於 111 年 1 月改造後，也確實發揮了效益，周邊住戶開始進行程度不同的拉皮、清理、門面改造等工作；而在人流當中，也可以看到夫妻推著娃娃車、或是兒女推著坐在輪椅上的長者，一起在城市中成為城市的活力。

未來，我們也希望能夠將這樣的信念繼續推展下去，像是忠二路、忠三路的人行空間改善，逐條串聯起整個城市街區。

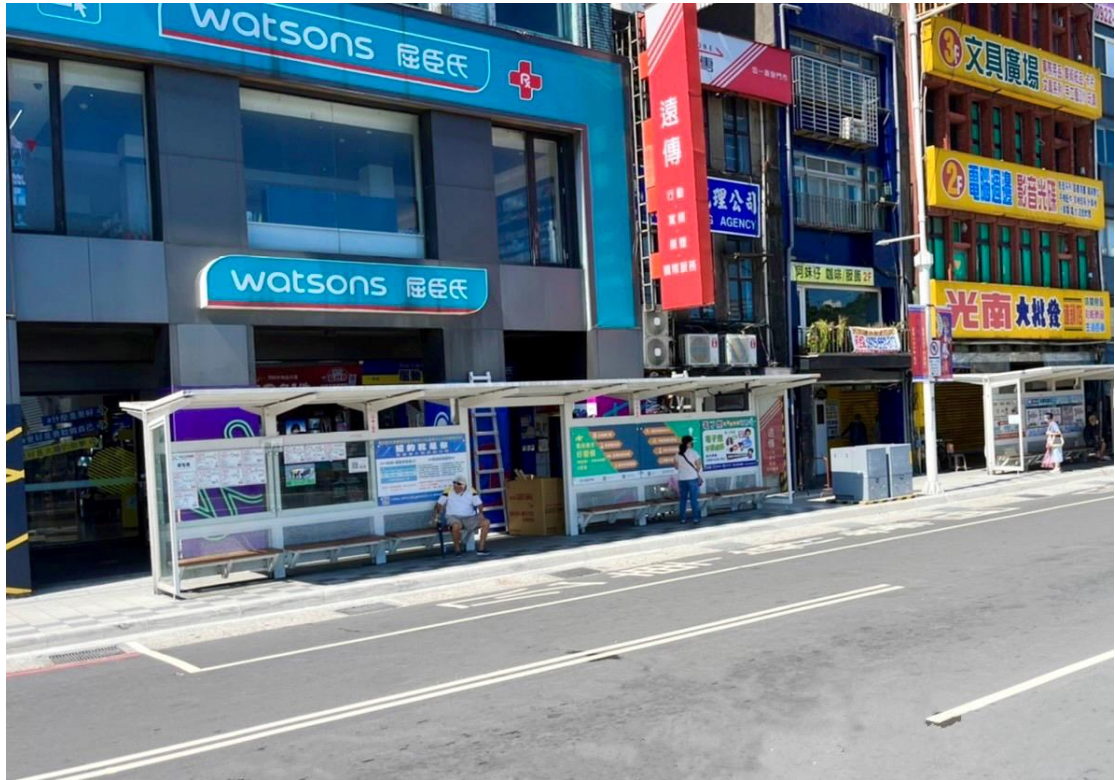


圖 42：忠一路人行路廊改善工程與新式候車亭建置

十二、東岸轉角廣場與東岸郵輪廣場

「東岸轉角廣場工程」在旭川河口打造親水平台及觀景階梯，將海洋廣場延伸建置，並銜接東岸郵輪廣場。本工程總經費為 8,063 萬元，已於 111 年 6 月 8 日開放行人通行。完工後提升了臨港水岸空間體驗，縫補港區與東岸景點間串連系統，提供更舒適的臨港場域與步行經驗。

而因應東 3、東 4 旅運大樓增建工程完工，市府規劃興闢「東岸郵輪廣場」，將港區服務設施、臨港水岸與市區動線串連，提供良好的步行及水岸體驗。

東岸郵輪廣場第一期工程經費總計 1.8 億元，工程進度達 73.6%，預計 111 年 12 月完工。第二期工程經費總計 5.07 億元，於 111 年 8 月 23 日辦理第二次上網公告，8 月 31 日開標，預計 111 年 10 月開工、113 年 4 月竣工。

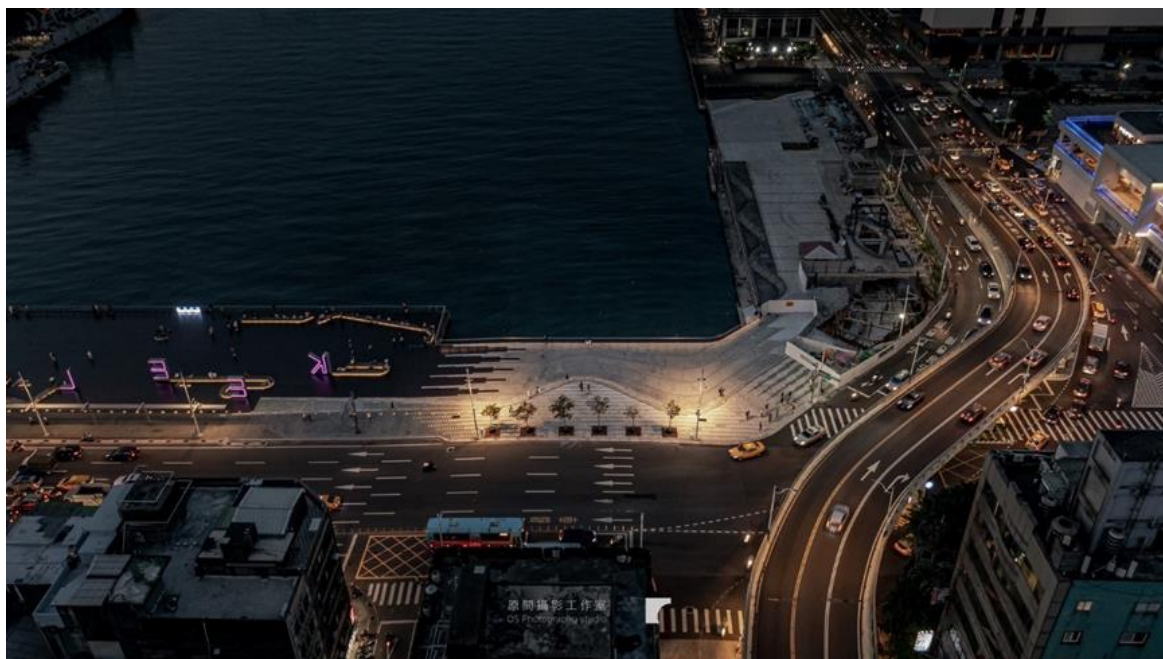


圖 43：東岸轉角廣場已於 111 年 6 月 8 日開放行人通行



圖 44：東岸郵輪廣場工程施工前



圖 45：東岸郵輪廣場工程完工示意圖

十三、東 3、東 4 碼頭旅運設施刻正辦理招商已完成 評選作業，將點交進行營運準備

臺灣港務股份有限公司於東 3、東 4 碼頭及後線土地新建旅運設施與登船廊道，並於中正路側配合本府市港再生標竿計畫，以提升本市整體觀光、水岸發展及旅運品質。

本案工程於 110 年 7 月 16 日完工。基隆港務分公司並於 111 年 2 月 25 日至 5 月 16 日公告辦理「基隆港東 3-東 4 旅客服務設施暨停車場」招商評選出優勝廠商，6 月底與業者簽約，已於 8 月 16 日點交，刻進行營運準備工作。

十四、軍港西遷整體工程預計今年第 4 季完工

「基隆港軍用碼頭及威海營區西遷工程」以成立國防軍事專區，提升官兵辦公、備勤及生活空間水準，強化國防戰備實力，並活化運用東岸市港地區為目的，由臺灣港務公司納入「臺灣國際商港未來發展及建設計畫（106~110 年）」，軍港碼頭由交通部以「代拆代建、先建後遷」方式辦理。

本工程採分期分區辦理，分 3 標案執行，工程進度說明如下：

1.先期工程：於 108 年 7 月 3 日完工。

2.第一期工程：西 11 碼頭後線腹地營舍，已於今年 2 月底完工，會客室辦公大樓、生活大樓等已於 111 年 7 月 21 日完成點交軍方搬遷。

3.第二、三期工程：西 8 及西 14、15 碼頭後線腹地營舍，現正進行結構體工程，因營造業整體缺工問題，今年 3 月 22 日行政院公共工程委員會同意延後完成，陸戰樓預計今年 11 月底前完成，屆時軍方可全數搬遷至西岸。

而位於東 4、東 5 碼頭的威海營區舊營舍，第一階段拆除工程已於 111 年 4 月完成 3 棟，第二階段於 111 年 6 月再拆除 2 棟，同年 8 月 26 日，海軍 131 艦隊舉辦最後巡視和降旗典禮，進行西遷作業，接續將於 111 年 11 月前再拆除 6 棟，餘 3 棟將配合海軍搬遷後再行拆除。未來威海營區全數拆除後，將可提供基隆市中心區發展的一大腹地，市府將持續積極與港公司協調未來的發展方向，並配合提出相關都市計畫的變更工作，將市中心區打造成基隆市港經濟發展的新動力。



圖 46：軍港西遷主體營舍工程於 108 年 5 月開工動土



圖 47：威海營區舊營舍開始第一階段拆除工程 111 年 1 月動工

十五、基隆港東櫃西遷工程

東櫃西遷配套工程，除計畫道路目前正辦理用地取得外，其餘均已開工，臺灣港務公司目前辦理進度如下：

- 1.櫃場優化（經費 0.35 億元）：已完成櫃場電力改善。
- 2.西 7 倉庫改建工程（經費 2.985 億元）：已於 109 年 4 月 28 日完工。
- 3.西 16 倉庫興建工程（經費 3.5 億元）：工程部分新增 4,350 坪樓板面積，已於 109 年 6 月完工。
- 4.西 6、27 碼頭浚深（經費 4.5 億元）：碼頭浚深 9 公尺，已於 109 年 1 月完工。
- 5.西 27 新建 4,300 坪倉庫改建工程（經費 1.9 億元）：改建部份新增 1,000 坪樓板面積，預計今年第 3 季完工。
- 6.基隆港西岸整體港區細部計畫(經費 1,100 萬元)：港務公司於 109 年 6 月 15 日啟動委託技術服務案，辦理西岸交通細部規劃、交通資訊整合及車流模擬等內容，今年 3 月 10 日召開期末審查會議未通過，於 7 月 25 日召開第二次期末審查會議，審查結果為修正後通過。

十六、基隆港務警察總隊拆遷及興建案

位於基隆港東 4 碼頭的基隆港務警察總隊，配合軍港西遷工程將遷至西岸，採先建後拆方式，本案完成後，未來從西 4 碼頭、國門廣場一直到東 6 碼頭，將能串接成國際級的水岸空間。

依行政院核定中長程個案計畫，由基隆港務分公司負責興建基隆港警總隊新建辦公廳舍，納入國際商港未來發展及建設計畫(111 至 115 年)，計畫經費 2.71 億元，計畫期程 111 至 114 年。

111 年 7 月 22 日召開「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」設計監造委託技術服務案細部設計報告(初稿)審查會議，原則同意備查，相關審查意見將請規劃設計單位納入細部設計報告修正；另拆除執照經市府審查完成後，已於 111 年 6 月 20 日核發，並已於 111 年 8 月 26 日辦理新址既有建物拆除工程上網公告，預計 112 年工程施工、113 年 8 月底前竣工。

十七、山海城串聯再造工程進度已達 98%，預計今年 9 月底前完工

「基隆山海城串聯再造計畫工程」工程進度已達 98%，預計於今年 9 月底前完工，完工後將與東岸郵輪廣場工程、東岸轉角廣場工程銜接西岸的基隆城際轉運站工程，大幅提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準。本工程各工區進度說明如下：

1. **豎梯工區**：已完成鋼構主體結構，刻正進行垂直段電梯、玻璃帷幕、金屬網牆安裝作業及室內裝修作業。



圖 48：基隆山海城串聯再造計畫工程豎梯工區

2. 主普壇工區：已完成公園附屬設施(G-3 店鋪)建築物，目前進行室內裝修及周邊地坪鋪面作業。



圖 49：基隆山海城串聯再造計畫工程主普壇工區

3. 鵲橋工區：已完成橋梁主體作業，目前進行欄杆安裝作業。



圖 50：基隆山海城串聯再造計畫工程鵲橋工區

十八、「基隆希望之丘(中正公園)防空洞改善計畫」預計 111 年 9 月底前開放

信二路防空洞具有超過 80 年的歷史，民國 80 年以前供消防局停放小型消防車，後來變成環保局清潔班隊辦公處與資源回收據點。市府於 105 年起舉辦參與式設計工作坊競圖，討論防空洞再利用的可能方向。

市府於 108 年 8 月開始辦理信二路防空洞之規劃設計作業，防空洞內部空間約 249.1 平方公尺，設計上採不另行開挖，朝「人物共存」之洞內環境優化方式辦理，防空洞造型設計概念以延續「基隆塔」之城市燈塔理念，作為「城」與「丘」之節點續接器，連結都市與山林。

本工程已於 111 年 6 月 17 日完成驗收作業，內部電梯預計於 111 年 9 月完成使用執照請領作業，並預計於 9 月底前開放。



圖 51：基隆希望之丘(中正公園)防空洞改善計畫



圖 52：基隆希望之丘(中正公園)防空洞改善計畫

十九、希望之丘山城社區通廊系統建構計畫已於今年 7月完工

市府於中正公園(希望之丘)投入 6.28 億元經費，辦理「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫」，就中正公園範圍及其周邊人本環境進行整體改善，並強化無障礙通行之友善環境。本計畫共分三階段工程，辦理進度說明如下：

1. 第一階段工程(道路拓寬及人行道改善工程)：已於 110 年 12 月 24 日申報竣工。



圖 53：希望之丘山城社區通廊系統第一階段工程完工

2. 第二階段工程(觀景廣場及綠地工程)：已於 111 年 7 月 8 日申報竣工。



圖 54：希望之丘山城社區通廊系統第二階段工程

3. 第三階段工程(社區上山步道工程)：已於 110 年 11 月 30 日完工。



圖 55：希望之丘山城社區通廊系統第三階段工程完工

二十、希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程已於 111 年 5 月 31 日開工，預計 112 年 1 月底前完工

「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」透過民眾參與的方式，藉此釐清各年齡層的需求與建議，進行收斂、整合，並依其參與成果辦理遊戲場之規劃設計，以期未來本工程可滿足民眾之需求。

本案工程經費 6,114 萬元，已於 111 年 5 月 31 日開工，工期 240 日曆天，預計明(112)年 1 月底完成希望之丘兒童遊戲場工程施作。



圖 56：希望之丘兒童遊戲場參與式工作坊



圖 57：希望之丘兒童遊戲場工程完工示意圖

參、推動執行台灣史上最大規模文化保存計畫 ——「大基隆歷史場景再現整合計畫」

一、大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

市府自 106 年起推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，此計畫為文化部再造歷史現場計畫中的標竿旗艦計畫，基地範圍包括和平島、東岸沙灣地區、西岸生活場域，獲文化部核定總經費 9 億 128 萬元，分為 53 項子計畫，已結案子計畫共 40 項，執行中 13 項，執行成果豐碩，分別說明如下：

1. 歷史場景、地景修繕再利用：

旭丘指揮所、基隆要塞司令部、基隆要塞司令官邸、基隆要塞司令部校官眷舍、漁會正濱大樓、白米甕砲台為「大基隆歷史場景再現整合計畫」中 6 處重要文化資產，修復再利用工程已於 111 年 6 月 25 日以前全數完工，並完成整建太平輪遇難旅客紀念碑、沙灣歷史文化園區串聯與縫合周邊文資景點。已修復之文資設施將積極活化，引入民間創意與資源，進行專業經營與行銷管理，以兼具文化發展、觀光遊憩之目標，達成歷史空間活化與再利用，目前利用情形說明如下：

(1)旭丘指揮所

旭丘指揮所修復再利用工程總計投入 1 億 2,037 萬元經費，109 年 5 月 5 日開工，111 年 6 月 25 日完工。未來市府將採標租方式辦理活化，兼營多元休閒活動及餐飲空間，民眾將能從高地上眺望基隆山海風貌，體會日治時期台灣八景之一的「旭丘晴嵐」及「旭崗日出」。



圖 58：歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程

(2)基隆要塞司令部

基隆要塞司令部修復再利用工程總計投入 1 億 3,829 萬元經費，109 年 5 月 7 日開工，110 年 12 月 30 日完工。目前以 OT 方式引進民間資源投入，串聯要塞司令官邸、

校官眷舍、旭丘指揮所、漁會正濱大樓等，形塑完整的文化歷史空間廊帶，形成文化觀光遊憩中心。



圖 59：基隆要塞司令部修復再利用工程

(3)基隆要塞司令官邸、校官眷舍

基隆要塞司令官邸修復再利用工程總計投入4,193萬元經費，107年11月6日開工，109年4月28日完工；基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程總計投入2,120萬元經費，107年10月31日開工，109年1月23日完工。

111年4月1日起，誠品期間限定書店於此二處推出「時光繪本書屋」，以千本以上的基隆相關選書，帶領民

眾閱讀基隆的多元面貌，未來將指定予財團法人基隆市文化基金會運用或以其他方式辦理活化。



圖 60：基隆要塞司令官邸修復再利用工程



圖 61：基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程

(4)漁會正濱大樓

漁會正濱大樓修復再利用工程總計投入 1 億 369 萬元經費，108 年 11 月 13 日開工，110 年 4 月 3 日完工。目前以 OT 方式引進民間資源投入，透過民間機構專業經營與行銷管理，期以串接色彩屋、阿根納產業遺構及和平島大航海歷史園區，型塑完整之文化歷史空間廊帶，並提供基隆在地生活與文化產業深度體驗，以兼具文化發展、觀光遊憩之目標，達成歷史空間活化與再利用。



圖 62：歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程

(5)白米甕砲台

市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程總計投入 2,962 萬 6,137 元經費，108 年 12 月 30 日開工，109 年 12 月 31

日完工。觀測所鐵堡已於 110 年 7 月正式開放啟用，遊客服務中心也已於今(111)年 6 月 24 日正式對外服務，週一至週五採取預約方式提供團體導覽服務，週六、週日則開放上、下午各一場次供一般民眾預約報名導覽。



圖 63：市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程

2.考古發掘調查研究：

「西班牙諸聖教堂」及「大沙灣石圍遺構」考古發掘皆有豐富成果，諸聖教堂為國內第一個完整出土的西班牙遺址，區域內發掘出圓山文化、十三行文化、西荷時期、清治時期、日治時期等文化層，對台灣歷史研究具重要貢獻。

3.文史資料搜集研究及都市規劃：

沙灣歷史、和平島調查研究建立策展、出版、行銷之資源。東西岸總體規劃與交通串聯計畫，將作為本市後續施政基礎。

4.教育與行銷推廣：

計畫執行期間之多元策展及文化路徑推廣活動，為本市吸引文化觀光人潮，引領民眾深入探索本市歷史文化內涵；而修復工程與考古發掘系列紀錄片，亦藉由影音平台觸及全國與國際觀眾。

「大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0」53 項子計畫詳如下表所示：

表 2：大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0					
項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
1	大基隆歷史場景再現整合計畫專案管理計畫	2,600	大基隆計畫專案管理	106年9月8日	111年3月22日
2	沙灣地區暨太平輪紀念碑歷史調查研究及敘事空間整合計畫	150	沙灣地區暨太平輪紀念碑歷史調查研究	106年12月5日	108年4月30日
3	沙灣地區影像拍攝暨出版計畫	200	沙灣地區影像拍攝及製作出版物	107年3月15日	108年6月30日
4	歷史場景服務核心(舊公車處)改善工程規劃設計監造	250	沙灣園區服務核心工程規劃設計監造	108年12月31日	執行中
5	基隆沙灣地區歷史場景服務核心改善工程	3,650	沙灣園區服務核心工程	108年12月31日	工程進度截至111年8月22日止為54.25%
6	太平輪遇難旅客紀念碑圍牆退縮與綠美化工程	303	太平輪遇難旅客紀念碑圍牆退縮與綠美化工程	106年11月14日	107年1月15日
7	規劃設計暨委託監造	30	太平輪遇難旅客紀念碑圍牆退縮與綠美化工程規劃設計及監造	106年5月1日	107年3月1日
8	大沙灣石圍遺構考古發掘計畫	1,000	歷史建築大沙灣石圍遺構考古發掘	107年10月31日	109年12月31日
9	市定古蹟基隆要塞司令官邸修復再利用工程	4,193	市定古蹟基隆要塞司令官邸	107年8月29日	109年8月29日

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
			修復再利用工程		
10	監造及工作報告書	321	市定古蹟基隆要塞司令官邸修復再利用工程監造及工作報告書製作	106年12月15日	109年10月31日
11	修復工程紀錄片	150	市定古蹟基隆要塞司令官邸修復再利用工程修復紀錄片製作	107年6月11日	109年10月31日
12	市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程	2,120	市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程	106年12月15日	109年5月24日
13	監造及工作報告書	214	市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程監造及工作報告書製作	106年12月15日	109年6月23日
14	修復工程紀錄片	150	市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍修復再利用工程修復紀錄片製作	107年7月26日	109年7月30日
15	市定古蹟基隆要塞司令部修復再利用工程	13,829	要塞司令部及附屬建築修復	109年5月7日	110年11月19日
16	「市定古蹟基隆要塞司令部修復工程設計監造、紀錄片	1,637	要塞司令部及附屬建築修復設計監造、紀錄片及工作報告	107年10月17日	於111年8月23日辦理第二階段紀錄片審查會。

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
	及工作報告書」委託技術服務		書		
17	歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程	12,037	旭丘指揮所及附屬建築修復	109年5月5日	111年6月25日
18	歷史建築旭丘指揮所規劃設計、因應計畫及結構安全評估(鑑定)、監造及工作報告書、修復紀錄片	1,470	旭丘指揮所修復之監造及紀錄片	107年11月1日	111年8月4日 辦理工程初驗，預計30日內完成初驗缺失改善後複驗。
19	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程	10,369	漁會正濱大樓修復	108年11月13日	110年4月3日
20	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程監造及工作報告書	481	漁會正濱大樓修復之監造	108年4月11日	111年4月8日
21	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程紀錄片	150	漁會正濱大樓修復之監造	108年4月1日	刻正辦理驗收程序
22	白米甕砲台修復再利用工程	2,962	白米甕砲台修復再利用工程	108年12月30日	109年12月31日
23	白米甕砲台修復再利用工程委託技術服務	443	白米甕砲台修復設計之監造	108年5月1日	109年12月31日
24	「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程紀錄片暨西岸地區行銷推廣」計畫	505	紀錄片及行銷推廣、砲台音樂會	108年11月12日	110年11月5日
25	聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫	2,400	和平島地區考古研究	107年10月26日	110年11月1日
26	聖薩爾瓦多城再現拍攝紀錄片	700	和平島 B 考古遺址發掘紀錄片製作	107年5月21日	109年5月31日

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
27	社寮原住民歷史文化調查研究計畫	200	社寮原住民之調查研究	107年7月1日	109年5月31日
28	「109年度基隆和平島考古現地展示及教育推廣」勞務採購案	400	和平島 B 考古發掘教育推廣	109年1月30日	109年12月31日
29	大基隆歷史與文化成果出版暨行銷計畫	200	大基隆歷史場景再現整合計畫成果除出版物製作	109年1月31日	109年11月27日
30	「大基隆歷史場景再現整合計畫」之在地影音人才培訓計畫	250	在地影音人才培訓	106年12月11日	108年7月17日
31	沙灣地區數位攝影測量計畫	240	沙灣地區數位攝影測量成果製作	107年4月24日	108年9月30日
32	『大基隆歷史場景再現整合計畫』網站建置暨網路設備系統優化工程	1,284	大基隆網站及網路設施建置	107年12月31日	網站： 廠商於8月3日提送7月份網站維護報告 依規刻正簽辦撥款第一、二季保固維護撥款。 設備： 配合文化局整建工程之期程，刻正簽辦變更契約協調。
33	『咱的基隆-人物/現場/記憶的對話』專書出版	98	【雨的布魯斯】出版品製作	107年12月1日	109年1月30日

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
34	歷史場景數位導覽_多媒體內容製作計畫	500	大基隆歷史場景再現整合計畫成果除出版物製作	108年9月2日	109年10月30日
35	服務核心策展規劃及執行暨影片拍攝計畫	800	服務核心2樓策展，網路行銷宣傳。	108年9月30日	第三期報告書已於111年7月25日審查通過。
36	歷史場景_數位運用行銷推廣活動	350	回顧從基隆出發,前往馬祖當兵的軍旅生涯過程,執行項目分為 1.空間記憶地圖繪製 2.人物訪談與影像紀錄 3.舉辦相關歷史場景體驗推廣活動 4.再現人物/故事/場景專書	108年8月14日	109年10月31日
37	歷史場景_數位出版計畫	550	大基隆歷史場景再現整合計畫成果除出版物製作	108年8月7日	109年12月31日
38	歷史場景虛擬再現_互動多媒體製作暨策展計畫	6,128	服務核心1、3樓策展。遊戲式歷史場景導覽、後台管理資料與系統建置。導覽App與數位導覽空間之行銷設計與執行。	108年9月12日	《Now and Then and Now》試營運期間111年6月8日至9月17日。
39	「沙灣地區與和平	900	沙灣地區與和	107年3月6日	109年9月30日

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
	島歷史空間整體規劃 案」委託專業服務案		平島歷史空間 整體規劃 案		
40	基隆沙灣地區歷史 場景再現共識凝聚 策展計畫	800	沙灣地區歷史 場景再現共識 凝聚策展	107年10月5日	109年8月14日 解約
41	基隆沙灣地區歷史 環境願景再生暨城 市景觀再造規劃設 計暨監造計畫	850	基隆沙灣地區 歷史環境願景 再生暨城市景 觀再造計畫設 計監造	108年6月28日	110年10月9日 舉辦園區啟用儀 式。10月28日結 案。
42	基隆沙灣地區歷史 環境願景再生暨城 市景觀再造計畫	3,420	沙灣地區歷史 環境願景再生 暨城市景觀再 造計畫	108年7月6日	109年6月30日
43	基隆港西岸白米甕 週邊地區歷史空間 策略規劃案	450	西岸白米甕地 區歷史空間策 略規劃、防空洞 調查研究及再 利用	107年3月2日	109年10月21日
44	白米甕、球仔山、 仙洞巖、佛手洞步 道及周遭環境整修 工程委託規劃設計	210	白米甕、球仔 山、仙洞巖、佛 手洞步道及周 遭環境整修工 程委託規劃設 計	108年11月8日	110年11月5日
45	白米甕、球仔山、 仙洞巖、佛手洞步 道及周遭環境整修 工程	1,390	白米甕、球仔 山、仙洞巖、佛 手洞步道及周 遭環境整修工 程	109年2月17日	109年10月6日
46	阿拉寶灣原住民聚 落再生計畫	300	阿拉寶灣原住 民聚落調查研 究	107年4月3日	110年5月27日

大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
47	基隆市數值航測地形圖測繪相關作業委託技術服務案	3,220	基隆市數值地形圖修正補測繪	108年12月31日	因涉及港區周邊工程陸續完工須補測繪事宜，預計111年10月完成驗收。
48	基隆市數值航測地形圖測繪相關作業委託技術服務案監審委託服務案	280	基隆市數值地形圖修正補測繪監審	109年3月18日	因涉及港區周邊工程陸續完工須補測繪事宜，預計111年10月完成驗收。
49	「大基隆歷史場景交通串聯改善計畫」委託規劃技術服務案	600	大基隆歷史場景交通串聯改善計畫	106年8月7日	109年11月16日
50	大基隆歷史場景再現之成果推廣與文化觀光加值整合計畫	800	大基隆歷史場景再現之成果推廣與文化觀光加值整合計畫	109年3月19日	109年11月30日
51	和平營區二營舍新建工程委託規劃設計監造技術服務案	290	和平營區二營舍新建工程規劃設計監造	107年9月13日	109年6月30日
52	和平營區二營舍新建工程案	3,991.6	和平營區二營舍新建工程	108年4月1日	109年6月30日
53	沙灣地區文化地景再現及歷史服務核園區環境整頓工程-歷史建築大沙灣石圍遺構及考古遺址緊急維護作業	507	歷史建築大沙灣石圍遺構及考古遺址緊急維護作業	109年12月25日	110年5月21日

二、大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0

因「大基隆歷史場景再現整合計畫 1.0」成果豐碩，文化部復於 110 年 9 月 15 日核定「大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0」金額 6,360 萬元整(中央補助 5,088 萬元、本府自籌 1,272 萬元)，總計 14 項子計畫。各子計畫辦理情形如下表所示：

表 3：大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0

大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0					
項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
1	110 年大基隆歷史場景展示推廣計畫	1,200	<ul style="list-style-type: none"> •和平島 B 遺址保存環境緊急改善及展示規劃設置。 •漁會正濱大樓頂樓展示規劃及設置 	110 年 8 月 23 日	111 年 7 月 5 日已提送成果報告書，於 8 月 30 日辦理書面驗收。
2	和平島 B 遺址現地解說中心規劃設計及監造技術服務委託案	632.5	B 遺址解說中心之規劃設計。	110 年 9 月 30 日	111 年 8 月 18 日召開自辦都審會議，通過部分臨道路免退縮 5 米，及停車位數量免加倍計算及繳納代金。
3	「基隆市和平島 B 考古遺址」解說中心委託規劃設計技術服務之專業服務	150	鑽探、測量、水土保持計畫	110 年 12 月 22 日	已完成測量與鑽探報告及第二次擴充成果報告(基地大門設計)。
4	「基隆市和平島 B 考古遺址」解說基地考古試掘計畫	200	解說中心基地考古試掘	111 年 2 月 11 日	已於 8 月 29 日召開工作會議。

大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0

項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
5	「基隆市定古蹟社寮砲台修復計畫暨歷史步道串聯計畫」技術服務案	200	社寮砲台修復 規劃設計	111年3月1日	111年5月20日 召開基本設計審查會議，同意通過。於7月14日與軍方及國產署召開會勘及工作會議。預計10月23日提送細部設計。
6	基隆市歷史建築漁會正濱大樓夜間照明建置統包工程案	500	漁會大樓夜間 照明：設計+施 作	110年7月16日	110年12月14日
7	「基隆市歷史建築漁會正濱大樓夜間照明建置統包工程」監造技術服務案	20	漁會大樓夜間 照明：監造	110年8月2日	111年1月24日
8	和平島考古文化園區綜合規劃	700	和平島考古文 化園區綜合規 劃、考古博物 館設置方案評 估	111年3月1日	111年7月20日 召開期初報告書 審查，同意通過。
9	歷史空間服務核心改善規劃工程第二期	1,946	歷史場景服務 核心(舊公車 處)改善工程 後續擴充	111年1月14日	工程進度截至 111年8月22日 止為54.25%
10	歷史空間服務核心改善規劃工程第二期監造服務	250		111年3月1日	工程進度截至 111年8月22日 止為54.25%
11	白米甕砲台走動式服務及周邊維護改善計畫	151	白米甕砲台遊 客中心維護與 走動服務	111年3月23日	第1、2期款已於 111年7月21日 完成驗收
12	大航海文化路徑再現規劃設計及教育推廣計畫	480.5	百合步道、龍 目井、社寮砲 台等景觀環境 改善規劃、教 育推廣及導覽	111年1月27日	111年8月5日通 過期中報告書。
13	遺址與教育環境貌型跨域整合計畫	380	整合學校與遺 址周邊資源， 改善人本環境	111年2月10日	111年7月18日 辦理工作會議，

大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0					
項次	計畫名稱	預算金額 (萬元)	工作項目	開工日期	完工日期
					針對周邊環境規劃設計方向與目標，訂於 8 月 29 日第二次召開家長會、里民的溝通會議。
14	二沙灣砲台歷史場景整體規劃設計暨環山步道串連計畫	150	二沙灣砲台周邊步道規劃設計	111 年 3 月 8 日	111 年 7 月 28 日召開期中報告書審查會議同意通過。

三、西班牙諸聖教堂考古遺址於城市博覽會期間揭開神秘面紗

西班牙諸聖教堂考古遺址位於基隆和平島，是臺灣目前唯一現地證明 17 世紀西班牙人到訪的考古現場，歷經幾年的努力，終於完成考古挖掘。平一路停車場「諸聖教堂遺址」內殿結構已出土，該區域考古發掘至今累積 20 座墓葬，出土文物有十七世紀青花瓷、西方皮帶扣、天主教十字架等計 19,979 件，是國內第一個完整出土的西班牙遺址；而和一路停車場的發掘工作，已出現圓山文化、十三行文化、鐵器文化等文化層。

本次的考古成果，也首次於 2022 城市博覽會亮相，邀請民眾親臨現場見證基隆位於大航海時代的重要角色，回顧四百年前西班牙人在臺灣留下的珍貴史實。

考量基隆多雨潮濕的環境條件與考古遺跡保存，現場架設大跨度抗風遮陽的特製房帳，並以南方松木棧道導引民眾參觀動線。展場整體運用出土文物與教堂牆垣線條作為主視覺設計元素，包括陶器、錢幣與 Caravaca 十字架等，加深民眾對考古遺址的印象。

文化局與策展團隊合作，以「現地即是展場」的概念，於展示空間結合 AR、VR 及模型圖說，並透過定點解說板融合敘事脈絡、系統性的對應考古出土物件，讓民眾從視覺與聽覺了解諸聖教堂的過去與現在，拉近與考古知識的距離。

城市博覽會期間，現場安排限定導覽，由在地文史團隊於每日上午 11 點及下午 3 點進行兩場次的文史導覽，民眾可透過導覽深度探索遺址現場。

西班牙諸聖教堂考古遺址獲文化部「大基隆歷史場景再現整合計畫」經費挹注，相關調研仍持續進行中，現階段以現地展示，未來將設置長久的博物館，市府將繼續推動本計畫向前邁進。



圖 64：平一路停車場「西班牙諸聖教堂考古遺址」出土文物



圖 65：和一路考古文化層



圖 66：西班牙諸聖教堂考古遺址於城市博覽會首次亮相



圖 67：西班牙諸聖教堂考古遺址結合 AR、VR 及模型圖說



圖 68：西班牙諸聖教堂考古遺址解說中心模擬圖

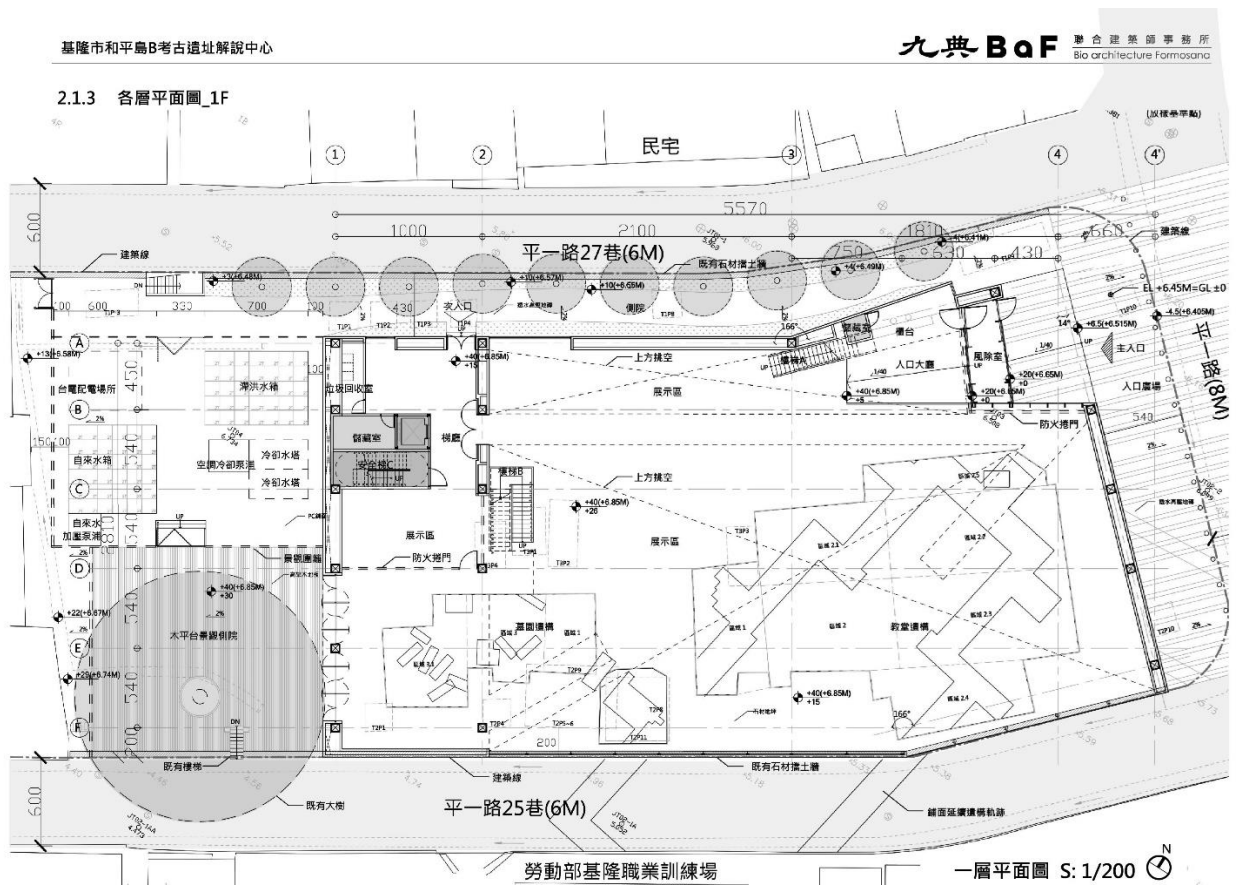


圖 69：西班牙諸聖教堂考古遺址解說中心 1 樓平面圖

四、市定古蹟劉銘傳隧道修復工程於 110 年完工

市府總計投入 3,388 萬 2,707 元經費進行劉銘傳隧道修復工程，修復保存清領時期第一座鐵路隧道，已於 110 年 12 月竣工。

本修復工程針對襯砌拱圈表面劣化、風化損壞，需進行襯砌檢測、溝縫剷除重做，紅磚風化程度不等，需依照損壞級數進行不同等級修復，劣化及損壞程度須於開工後，進行全面清點。由於查無該時期的隧道修復案例可供依循，且各施工介面需尋求可依循的工法，施工需謹慎為要，透過施工前調查、材料調配試作、材料試驗等繁瑣程序，以維持古蹟現有風貌亦兼具未來隧道開放後之遊憩安全為優先考量，再逐步辦理修復工程。

此外，針對隧道上方亦進行排水截流工程，大幅改善隧道內的溼度問題，讓全長 235 公尺由磚石材料交錯而構成的隧道，得以延緩風化崩壞速度。且為保留古蹟原貌及歷史痕跡，現場依清理後現況辦理修復等級判定，也保存了當時工程技術不足所造成南北交接處落差達 40 公分之獨有文化價值。

劉銘傳隧道後續規劃已獲得文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0」第二階段經費，共計 1,000 萬元，將接續辦理隧道之光環境及入口意象型塑規劃設計與設置計畫。



圖 70：市定古蹟劉銘傳隧道修復工程

肆、海科館與潮境海灣發展計畫

為串聯本市中正區至新北市瑞芳九份一帶海灣的生態觀光產業，並提升漁港環境及漁民生活品質，市府向中央爭取經費，獲行政院核定補助推動本市「望海巷海灣串聯計畫」。

整個計畫針對八斗子區域及海科館周邊區域的景觀及設施進行通盤規劃，並串聯長潭里漁港及望海巷漁港海岸廊帶親水空間，規劃友善人本環境及動線，改善潮境海灣保育區周邊的海岸親水界面工程。



圖 71：望海巷海灣串聯計畫

1.第一階段工程：

包括「望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程」及「望海巷漁港友善人行暨景觀工程(望海巷跨海景觀橋)」，前項已於 109 年 2 月竣工啟用，後項則於 110 年 3 月竣工，並榮獲 2021「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎。



圖 72：望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程於 109 年完工



圖 73：望海巷漁港友善人行暨景觀工程於 110 年完工

2. 第二階段工程：

第二階段包括「潮境資源保育區海岸親水生態教室」、「望海巷海灣景觀休憩平台工程」、「長潭里漁港海岸步道串聯工程」等 3 項工程，均已於 110 年 8 月完成細部設計。

其中，「潮境資源保育區海岸親水生態教室」已向全國水環境改善計畫爭取第六批次補助經費 1,000 萬元，以強化保育為主軸，建立旅人親水陸廊，設立單一入口廊道，使保育區管理更加完善，並透過生態工法設置引道，引導遊客親水路線，同時以人流總量管制方式，建立由社區或國立海洋科技博物館專業導覽機制及系統，減少環境衝擊。

另「望海巷海灣景觀休憩平台工程」及「長潭里漁港海岸步道串聯工程」兩項計畫，刻正向中央爭取工程預算補助，以利銜接及整合長潭漁港平浪橋口兩側自行車及人本步道，提升遊客遊憩動線安全及水岸廊帶之遊憩品質。

除上述三項前瞻水環境計畫外，本府也提出「望海巷漁港海堤景觀平台」工程計畫，已獲得海洋委員會海洋保育署補助 1,127 萬元，希望透過望海巷漁港港區周邊環境盤點，重新規劃漁港轉型使用之功能，建置基礎設施，改善望海巷漁港垂釣區周邊硬體休憩設施及人行動線。本案預計於今年完成規劃設計及工程發包，並於 112 年完成建置。

伍、基隆河谷廊帶發展戰略

一、基隆河谷廊帶發展策略，從規劃到落實

因應全球化下都會區域競爭、臺北都會區發展面臨飽和，基隆河谷廊帶將成為首都圈最後的腹地，本府 104 年與臺北市政府於「北基論壇副市長會議第一次會議」，開始醞釀合作辦理基隆河河谷廊帶區域發展策略規劃。105 年起，本府與臺北市政府及新北市政府以國土規劃角度合作辦理基隆河河谷廊帶區域發展策略規劃作業。

本案以首都圈的角度重新審視河谷廊帶應扮演之角色與定位，提出河谷廊帶作為南港東區門戶與基隆國家東門戶之智埠中樞，引進多元開發機制，提出北五堵、百福、連柑宅、七堵、八堵及暖暖地區發展定位，具體成果如下：

1.提出首都圈整體發展定位：自 105 年推動以來，開始促成首都圈討論跨域合作與都會區域共同議題之契機，也讓中央正視基隆作為首都圈國家海洋門戶的重要性，提高基隆捷運的建設必要性與迫切性，相關圖說也同時出現在首都圈各市論述中。

2. **提出河谷廊帶整體計畫願景：**提出基隆捷運建設、北五堵國際研發新鎮、百福社區再生、六堵工業區立體化、連竿宅棕地再生、七堵次核心、八堵觀光轉乘等構想並逐步落實。
3. **啟動北部都會區域計畫：**考量未來願景涉及不同縣市，同時因應《國土計畫法》的授權，基隆市國土計畫開始倡議辦理北部都會區域計畫之重要性，獲內政部國土計畫審議會大會支持，並由內政部營建署賡續於 110 年開始啟動都會區域計畫的規劃作業，新北市政府 110 年針對汐止地區辦理產業發展策略規劃。
4. **基隆捷運定線：**推動基隆捷運定線與沿線再發展之契機，讓捷運建設能帶動河谷廊帶棕地、舊社區能翻轉再生。
5. **基隆河自行車道興建：**提出基隆河自行車道路網整合構想，並經行政院支持，開始整合興建。

經由前述發展戰略與行動計畫等機制之共同推行，預期北北基河谷廊帶區域將可達到許多效益。

基隆河河谷廊帶區域發展規劃是本府不受限於既有轄域，積極融入首都圈提升自身地位，並爭取重大建設投入的重要策略。跨域合作與討論涉及各縣市權責與持續的溝通協

調，市府近年來對基隆河谷廊帶的發展負起責任，積極推動首都圈東側未來數十年的發展藍圖，並逐步落實在基隆捷運規劃、北五堵國際研發新鎮以及基隆河自行車道串聯等重大建設執行成果。

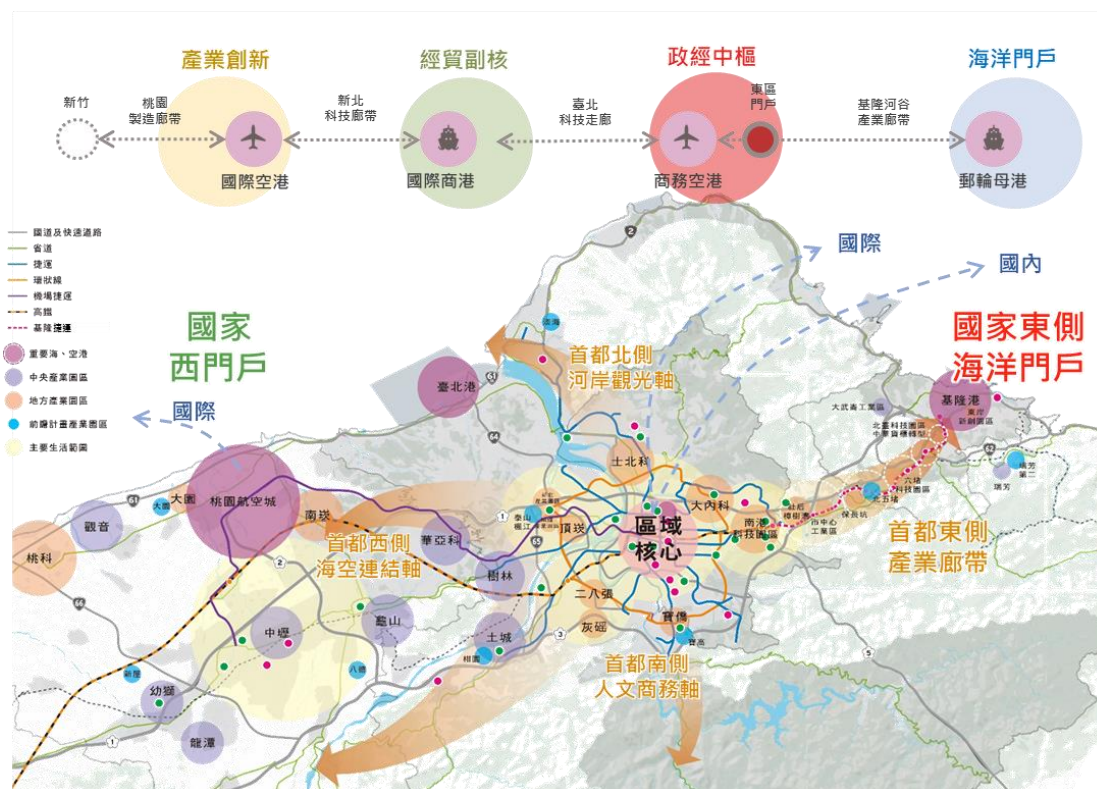


圖 74：基隆市於首都圈整體發展定位圖

二、山坡地解編 260 公頃，降低開發成本、增加業者投資意願

對於本市存在長久的「假山坡地」課題，市府積極向農委會反應、爭取，經 107 與 110 年兩次檢討，行政院農業委員會於 107 年 5 月 2 日公告劃出 181.05 公頃土地，110 年 3 月 26 日公告劃出 79.85 公頃土地，合計劃出山坡地面積 260.9 公頃，劃出之面積占原有平地比率約為 34%，以中正區劃出面積為最多，市中心附近則以田寮河兩側仁愛區與信義區的平地較多，經山坡地解編後，總開發成本合計減少約 103 億元，個別開發案件亦能縮短開發期程(約三至四個月)，有效提供土地效益及開發案件土地使用靈活度，將能有效帶動本市產業發展。

另外，市府也提案促使農委會修正「山坡地開發利用回饋金辦法」，使制度合理化，讓回饋金依實際開發利用許可面積計算，屬改建、修建或增加原建築高度的增建行為，都免繳交回饋金，以大武崙工業區廠商為例，即免收 3.36 億回饋金，對於促進廠商加碼投資及增設廠計畫，助益良多。

三、基隆河流域土地開發管制解禁

89 年象神颱風侵襲台灣造成北北基嚴重積水，行政院指示基隆河流域未開發部分予以限制開發。員山子分洪道完成後，基隆河流域防洪標準已提高為 200 年防洪頻率，^{右昌}和市府團隊鏗而不捨努力爭取流域解禁，經行政院召集相關單位研商後，認為基隆河整治已完成，加上水利法已增加逕流分擔及出流管制規定，全國國土計畫、基隆市國土計畫也臻於完成並提出因應措施，國土開發與管制在法律面已趨完整，因此，108 年 4 月 30 日蔡英文總統親自蒞臨六堵抽水站，宣布基隆河流域土地開發管制解除，回歸至各項法規辦理。加上基隆捷運建設，未來基隆河谷廊帶能成為首都圈產業新的發展基地，帶動廠商投資意願與基隆河谷廊帶發展，讓基隆真正整合至大台北都會地區的產業鏈及發展架構中。



圖 77：108 年 4 月 30 日蔡英文總統親自蒞臨六堵抽水站，宣布基隆河流域土地開發管制解除

四、北五堵國際研發新鎮規劃案

本案位置緊鄰新北市汐止保長坑工業區及本市六堵科技園區，具備支援臺北市南港及內湖地區的產業發展機能。計畫範圍約 71 公頃，採「全區規劃，分期分區發展」原則執行，目標為引進海洋生技、智慧科技、智慧物流等業種進駐。考量到產權結構及前瞻基礎建設計畫補助時限，將以 29.67 公頃列為優先申設範圍。

市府今(111)年召開 8 次跨局處專案進度會議，針對北五堵地區周邊道路交通系統、都市設計方案、軍方營區代拆代建、配合捷運路線規劃、車站專用區及未來園區整體開發方

式等進行協調研議。至有關北五堵營區彈藥庫遷移事宜，已依軍方需求完成代拆代建設施細部配置規劃及工程經費概估。

北五堵國際研發新鎮案考量各項法定程序並配合基隆捷運通車期程，後續包括都市計畫變更、土地取得及工程設計施工三階段列為主要工作項目，目前執行第一階段與軍方相關協調作業，後續將進行軍方彈藥儲藏室遷移用地都市計畫變更。

本府將持續推動案件進程，園區申設完成後，將帶動周邊既有建成區都市更新及潛力發展區產業再生，完善首都圈產業發展軸帶。

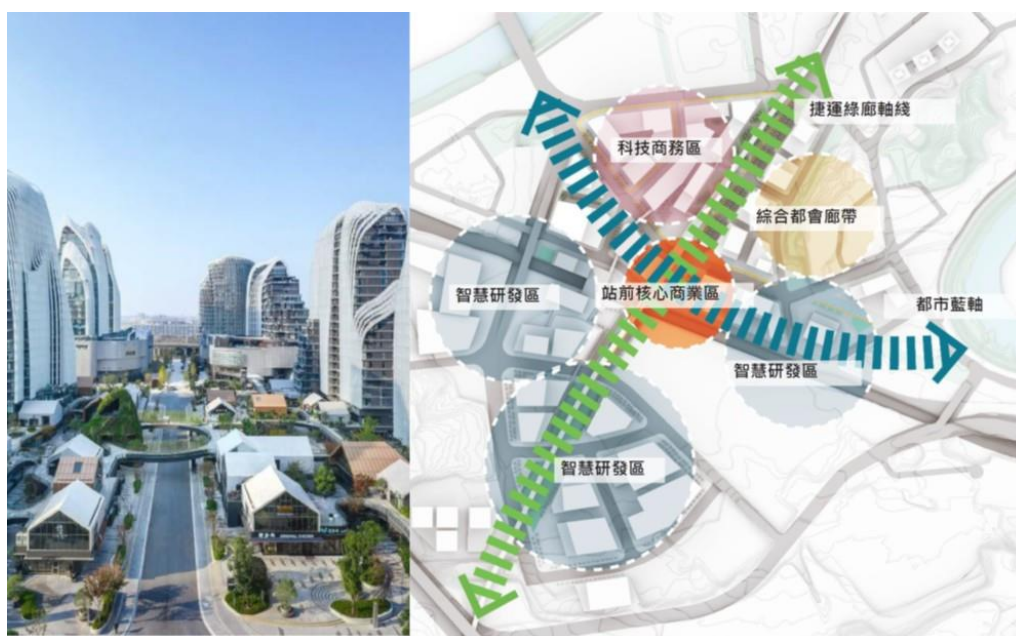


圖 78：北五堵國際研發新鎮示意圖

五、基隆捷運第一階段路線今年 2 月宣布定線，本市 將成為第一個擁有中運量捷運系統的非直轄市

1.路線說明

本案涉及北宜高鐵、捷運民生汐止線及臺鐵西部幹線等相關軌道運輸政策，交通部於 109 年 10 月 13 日召開「北北基軌道路網政策溝通平台」四長會議，由交通部長林佳龍主持，邀集本市、臺北、新北三首長共同研商三市軌道發展方向，並取得五大共識。第一，基隆捷運計畫系統型式升級；第二，臺北端地下延伸至南港；第三，民生汐止線與基隆捷運整合；第四，八堵-基隆路段正評估不同方案，將再持續規劃討論；第五，高鐵延伸宜蘭路線將不通過集水區。

今（111）年 2 月 22 日行政院蘇貞昌院長視察「基隆捷運計畫」，宣布基隆捷運第一階段路線，八堵至南港共設 13 站，分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站(1)、保長坑站(2)、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長 16.05 公里，興建經費約 425 億元，基隆將成為第一個擁有中運量捷運系統的非直轄市。

根據交通部鐵道局規劃，八堵站、南陽大橋站為平面站，南港展覽館站、南港站為地下站，七堵站至樟樹灣站皆為高架站，總計有 2 個平面站、2 個地下站及 9 個高架站。第二階段路線八堵至基隆段，因尚需詳細的專業評估，將持續規劃及凝聚共識方案。

交通部鐵道局另於 111 年 2 月至 7 月期間與台北市政府、新北市政府、臺鐵局及本府相關單位召開工作會議，持續就捷運路線、車站、捷運開發區、營運模式及財務等進行討論，並檢討後續都市計畫變更及用地取得作業，其中北五堵捷運路線及場站，因應北五堵國際研發新鎮產業園區期程，刻正檢討優先取得捷運路線及車站所需用地方式，供捷運得以先行施工及營運。



圖 79：基隆捷運路線圖

2.基隆捷運是第一個在綜合規劃階段即同步納入 TOD 規劃的捷運開發案

臺灣的都會軌道建設近半世紀以來，在規劃階段都未進行軌道沿線空間定位與都市設計，使得重大建設投資的外部性，無法成為都市轉型、公共設施與生活品質的槓桿與觸媒。

隨著基隆捷運的興建契機，由市政府向交通部爭取，交通部請本府代辦本市境內沿線 TOD 與都市設計準則。該計畫係以捷運作為地區轉型的觸媒，以首都圈捷運路網角度，定位基隆捷運及其各個廠站，並盤整捷運周遭土地使用與地區特色，提出人本、永續與地區再生新經濟的都市設計構想。

本案於 111 年 8 月 1 日通過期初報告書提出各場站 TOD 原則，規劃方向說明如下：

(1)八堵站

八堵站以地區轉乘為主、山海觀光商業為輔的定位，規劃八堵站為安樂及暖暖地區轉乘捷運車站，車站與周遭以平台連通，增加各運具的轉乘設施並配置觀光旅館與商業空間，作為基隆通往國門的門戶。

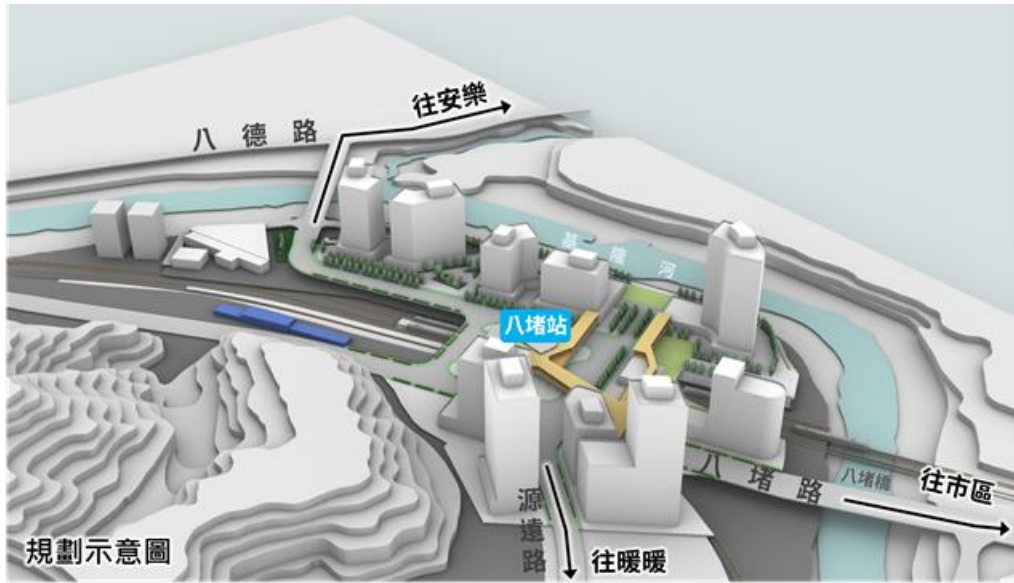


圖 80：基隆捷運八堵站與附近地區規劃示意圖

(2)七堵站

七堵站以「地區再生引擎」為場站定位，藉由場站的成長引擎結合周遭低度利用的國公有土地及棕地，支援河谷廊帶產業發展的服務，並以人本環境系統串連七堵火車站及附近大筆國公有土地，打造舒適且具經濟動能的七堵再生。



圖 81：基隆捷運七堵站與附近地區規劃示意圖

(3)六堵站

六堵站以「首都圈支援產業園區」做為場站定位，因應首都圈產業東擴，六堵車站結合周遭產業用地升級或轉型，作為首都圈產業支援用地。



圖 82：基隆捷運六堵站與附近地區規劃示意圖

(4)百福站

百福站以「鄰里再生」為場站定位，藉由場站開發結合周遭國公有土地，補足基隆河谷地區及百福社區公共設施與商業服務，作為鄰里再生及回饋軌道經濟。



圖 83：基隆捷運百福站與附近地區規劃示意圖

(5)北五堵站

北五堵站以「國際研發新鎮、海洋科技驅動區」為場站定位，規劃作為首都圈東側規劃國際研發新鎮之核心，除配合北五堵研發新鎮規劃，將以基隆河谷次核心強度及公共服務規劃場站，利用 TOD 外部性推動北五堵棕地再生。

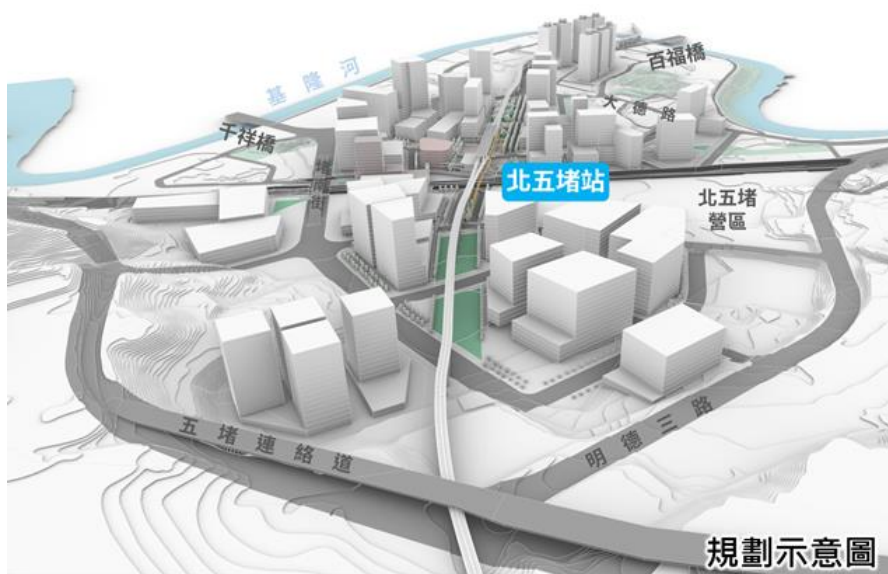


圖 84：基隆捷運北五堵站與附近地區規劃示意圖

3.基隆捷運 TOD 處理原則

(1)路線以公有土地為主，場站服務範圍以人本及服務最大化為原則

避免涉及土地徵收議題及市府財政，基隆市境內的軌道用地與場站以國公有土地為主。

另各場站範圍以及出入口將以人本角度，各場站以步行距離內服務人口最多方式規劃，並在步行距離內辦理都市計畫通盤檢討，調整土地使用強度、鼓勵智慧與綠能設施與建設、留設連續人行系統，打造基隆沿線成為人本與綠色之都。

(2)規劃捷運開發區支持捷運永續經營

因應基隆捷運將使基隆市成為六個直轄市外第一個擁有捷運系統的縣市，為避免維持捷運營運成本影響本市預算編列與財政負擔，市府建議鐵道局規劃於基隆捷運各場站地區劃設捷運開發區，作為未來以大眾運輸導向發展下的開發場址，捷運開發區的收益也能支持捷運建設的維持，讓基隆捷運能永續經營。

(3)捷運場站做為發動機引導地區再生

當代捷運建設已不僅僅就捷運場站做開發，更須考慮以大眾運輸為導向的都市轉型。且基隆河谷廊帶是首都圈最後

一塊低度利用的棕地範圍，也是大台北首都圈最具發展潛力的棕地，而基隆捷運將帶動河谷廊帶轉型以及沿線地區的再生。

因此，市府爭取交通部補助辦理全國第一個於綜合規劃階段即納入 TOD 與都市設計的捷運，提出前瞻的捷運開發規劃，藉由土地及開發技術以及捷運帶來的動能，引入新創產業與各項商業設施，強化與轉型基隆境內的產業。並爭取中央社會住宅、自行車路網系統、托幼設施與城鄉風貌工程等計畫與經費，將中央各項競爭型經費如雞尾酒般，在整體規劃下從點線面打造出首都圈宜居與先進的地區。

(4)整合容積各項機制，打造均衡且具競爭力的投資環境

基隆市都市計畫計畫人口高達 50 萬人，地形與公共設施規劃配置失當，造成全市容積不均。市府 110 年辦理「基隆市都市計畫容積銀行整體配套機制研究委託專業服務案」，藉由整體容積機制的整合與調節，讓基隆捷運站及周遭地區依人本與大眾運輸透過調節強度，並調節市港與歷史場景地區，結合相關計畫，引動基隆再生，打造處處有魅力，區區有發展的投資環境。

陸、改善交通與城市基礎建設

一、高公局辦理之「國道 1 號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」通過國發會審議，將採平面拓寬改善塞車問題

國道一號基隆市大華系統至新北市汐止交流道路段，是基隆通往台北端的交通瓶頸，市府自 108 年起努力向中央爭取交通改善方案，於今年 6 月由國家發展委員會審議通過「國道 1 號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，將採平面拓寬方式，後續將報請行政院核定，及辦理規劃設計、環境影響評估及施工等程序。

道路拓寬工程總預算約 17.26 億元，由國道公路建設管理基金支應，將從國道一號五堵交流道以南路段 (STA.7K+300) 至汐止交流道路段 (STA.10K) 為止，兩側各拓寬一個車道，全長 2.7 公里，工期約 7.25 年，最快可在 118 年底完工，完工後將可改善此路段的塞車問題。

二、開通 4 條快捷公車路線，總搭乘數達 1,920 萬人次

本府自 105 年起陸續開通 4 條基隆往返台北的城際快捷公車路線，6 年多來總搭乘數達 1,920 萬人次。各路線載客情況如下表所示：

表 4：本市開通 4 條快捷公車載客情形(截至 111 年 8 月 31 日止)

快捷公車路線	往返區域	開通日期	平均每月乘客數	總搭乘人次
2088 基隆女中(八斗子)至市府轉運站	基隆市中正區、信義區-台北市信義區	105 年 3 月 20 日	17.4 萬人次	1,419 萬人次
1088 暖暖至南港展覽館	基隆市暖暖區-台北市松山區	105 年 12 月 30 日	2 萬人次	241.2 萬人次
1579 中正區至臺北市區	基隆市中正區-台北圓山轉運站	108 年 10 月 15 日	7 萬人次	245 萬人次
1813D 臺北至基隆(經中山區)	基隆市中山區-台北火車站	111 年 3 月 3 日	2.4 萬人次	14.8 萬人次
總計			28.8 萬人次	1,920 萬人次

三、8年來增加60處停車場、10,715個汽機車停車位

8年來市府已整建或新闢停車場，如博愛、東岸、百福、信二、仁愛獅球等停車場，今年3月和一路停車場提供的302格停車位、5月七堵舊站停車場提供的138格停車位也已啟用。

市府和民間共同努力，全市公私有停車場從103年的43處，至111年8月為103處，共增加60處停車場；全市停車格位從103年的1萬6,854格，至111年8月達2萬7,569格，共增加10,715個汽機車停車格位，成長率達63.58%，逐漸紓解本市停車位不足問題。

表 5：103年至111年8月全市停車位數量統計表

年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年 8月
汽車 停車位	10,306	10,636	10,996	12,029	13,400	13,860	14,478	15,286	16,314
機車 停車位	6,548	7,148	7,148	7,970	9,133	9,291	9,628	10,377	11,255
合計	16,854	17,784	18,144	19,999	22,533	23,151	24,106	25,663	27,569

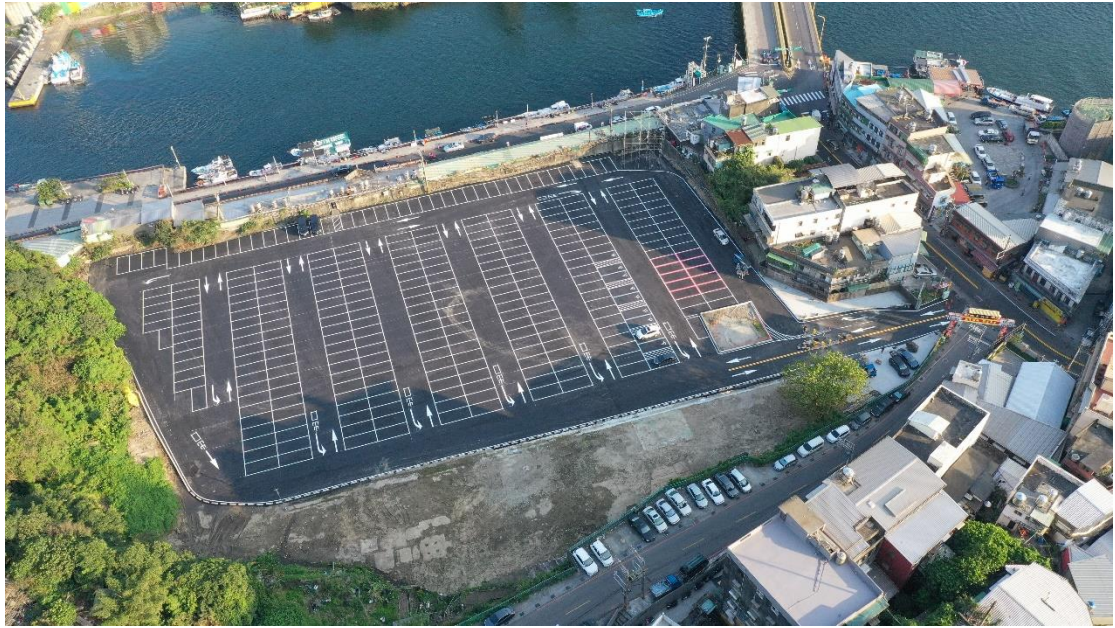


圖 85：和一路停車場今年完工啟用



圖 86：七堵舊站停車場今年完工啟用

四、調和街轉運站工程已於今年 7 月 19 日竣工

市府與海科館於 102 年 12 月簽訂行政契約書，合作推動調和街轉運站興建計畫，藉由區域轉運方式，避免大量車潮湧入海科館周邊造成壅塞，以維護館區周邊環境安寧與交通順暢。

本工程分兩期施作，第一期工程於 103 年全部完工，第二期工程部分，停車場鋪面 105 年完工、周邊設施 107 年完工，主體工程於 110 年 2 月 18 日開工、111 年 7 月 19 日竣工，目前辦理驗收作業中。

經市府與海科館、教育部進行三方協商，調和街轉運站由本府委託民間廠商營運管理，海科館前 3 年每年分攤維運管理及相關費用 500 萬元。目前本府已依採購程序辦理完成評選，得標廠商刻正辦理營運規劃作業，俟工程驗收完成移交廠商後，正式開放使用。



圖 87：調和街轉運站工程竣工



圖 88：調和街轉運站工程竣工

五、停六停車場刻正進行細部設計，預計 111 年底開工

停六停車場基地位於正豐街要塞司令部旁，地處「大基隆歷史場景再現整合計畫」東岸區域重要位置，為解決沙灣歷史文化園區的觀光停車需求，以及附近老舊社區停車空間不足的問題，市府於要塞司令部南側興建立體停車場，投入 4.54 億餘元工程經費(交通部補助 1 億 5 千多萬元，市府自籌 3 億元)，自 111 年起分 3 年籌編經費。

為避免影響古蹟視覺，停車場規劃為地下 1 層、地上 4 層，約有 281 個汽車停車格。本案刻正進行工程細部設計、代辦祥豐自來水加壓站工程發包、都市設計審議及水土保持審查等作業，工程預計今年底前發包，工期約 600 日曆天。

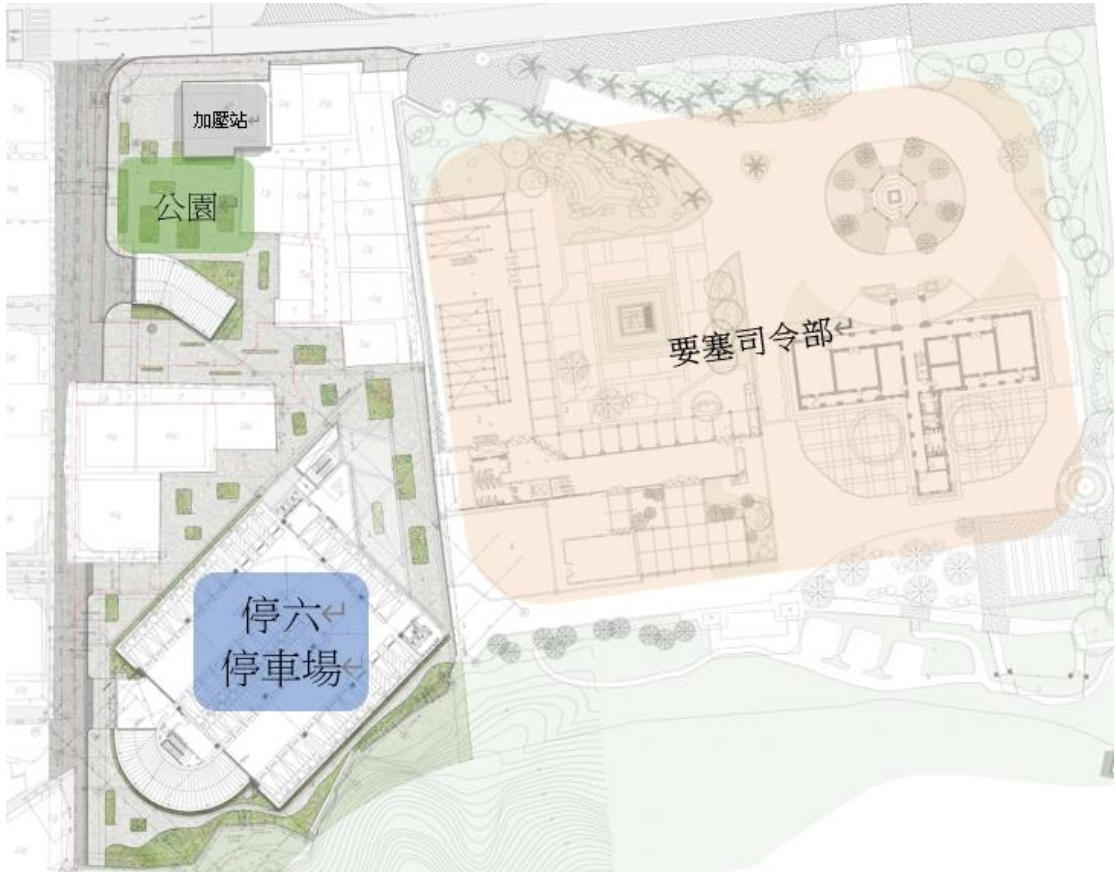


圖 89：停六停車場位置示意圖



圖 90：停六停車場規劃設計圖

六、8 年建置 128 支智慧型站牌與 76 座新式候車亭

1. 智慧型站牌

為了讓民眾掌握大眾運輸發車及到離站時間，市府優先於人口稠密的新興社區建置智慧型站牌，104 年建置 35 支，105 年 5 支，106 年 12 支，107 年 26 支，108 年 12 支，109 年 12 支，110 年 15 支，7 年共建置 117 支。

今年再完成建置翠峰山莊、六堵科技園區、南榮公墓(英仁里)、仙洞巖、仙洞國小、溪頭街口、百福宮、百福國中、天主堂、福三街口及正豐街口等 11 支智慧站牌，8 年共建置 128 支，目前全市計 178 處設有 LED 智慧站牌。

2. 新式候車亭

市府逐年陸續在主要行政中心或人潮匯集處增、改建新式候車亭，104 年興建 6 座、105 年 6 座、106 年 15 座、107 年 13 座、108 年 8 座、109 年 7 座、110 年 10 座，7 年完成建置 65 座。

今年已完成大竿林一及建商捐建之八斗高中等 2 座，將持續興建預訂於 10 月底前完工之地方法院、大武崙郵局、龍騰大地、天驕社區、巴塞隆納、信一路義四路口等 6 座，以

及仁一路台電大樓、深澳坑路六坑口、孝東路等 3 座捐、改建候車亭，111 年度總計將完成建置 11 座。



圖 91：長庚醫院站新式候車亭

七、8 年完成 8 項示範道路、5 項道路改善或拓寬、5 項人行路廊改善工程

8 年來市府努力提升道路品質，透過示範道路計畫、道路改善或拓寬、人行路廊改善、人行地下道改善等工程，提供民眾安全優質的用路空間。其中，示範道路之精神是為完整改善道路品質並提升耐久性，自地下管線、路基、鋪面一併進行檢討；另針對人行道部分，也以符合人本需求之精神，規劃完善的人行環境。

歷經多年來的努力，本府於 107 年至 109 年在「市區道路養護暨人行環境無障礙現地評比」皆獲得甲等佳績，並獲得 107 年最佳進步獎。本市各項道路工程辦理情形分別說明如下：

1. 示範道路：完成 8 項、執行中 5 項、爭取中 6 項

8 年來，市府已完成信一路、中正路、孝二路、義一路、實踐路、調和街、暖碇路及麥金路等 8 項示範道路，總計投入經費 3 億 3,864 萬元；執行中計有過港路、八堵路至光明路、源遠路、麥金路周邊及南榮路等 5 項，總計投入經費 2 億 2,308 萬元；爭取中計有源遠路二期、八堵路至光明路二期、南榮路二、三期、麥金路周邊二期、基金一、二、三路及中華路至德安路等 6 項，總計爭取經費 5 億 2,450 萬元，詳如下表所示。

表 6：104-111 年已完工之示範道路計畫

104-111 年已完工之示範道路計畫				
項次	工程名稱	工程經費 (萬元)	開工日期	完工日期
1	信一路示範道路計畫	2,730	104 年 11 月 16 日	105 年 01 月 08 日
2	中正路示範道路計畫	3,251	105 年 11 月 08 日	106 年 01 月 03 日
3	孝二路示範道路計畫	3,127	106 年 11 月 08 日	108 年 11 月 13 日
4	義一路示範道路計畫	965	108 年 10 月 11 日	108 年 10 月 25 日
5	實踐路示範道路計畫	4,391	107 年 12 月 14 日	109 年 04 月 30 日
6	調和街示範道路計畫	8,748	107 年 12 月 28 日	109 年 05 月 31 日
7	暖碇路示範道路計畫	2,367	108 年 06 月 27 日	109 年 08 月 20 日
8	麥金路示範道路計畫	8,285	108 年 12 月 10 日	109 年 10 月 21 日
總計		33,864		

表 7：執行中之示範道路計畫

執行中之示範道路計畫			
項次	工程名稱	工程經費 (萬元)	執行進度說明
1	基隆市暖暖區過港路示範道路工程	9,678	本案已完成設計並經內政部營建署核定工程經費補助，目前正辦理工程審議及發包作業，預計 111 年底動工。
2	八堵路至光明路(八堵隧道至明德二路口)綠色生活路網建置	3,567	本案經內營建署核定總經費 3,567 萬，刻正辦理基本設計，預計 111 年 12 月完成規劃設計作業。
3	基隆市暖暖區源遠路工程	4,117	本案經內營建署核定總經費 4,117 萬，刻正辦理基本設計，預計 111 年 12 月完成規劃設計作業。

執行中之示範道路計畫			
項次	工程名稱	工程經費 (萬元)	執行進度說明
4	基隆市麥金路生活圈周邊串聯計畫人行環境改善工程	1,515	本案經內營建署核定總經費 1,515 萬，刻正辦理基本設計，預計 111 年 12 月完成規劃設計作業。
5	南榮路周邊人行環境改善工程	3,431	本案經內營建署核定總經費 3,431 萬，刻正辦理基本設計，預計 111 年 12 月完成規劃設計作業。
總計		22,308	

表 8：爭取中之示範道路計畫

爭取中之示範道路計畫		
項次	工程名稱	預估工程經費 (萬元)
1	提升道路品質-源遠路人行環境改善工程第二期工程(工程案)	20,000
2	提升道路品質-八堵路至光明路人行環境改善工程第二期工程(工程案)	16,000
3	提升道路品質-南榮路周邊人行環境改善工程第二、三期工程(工程案)	7,000
4	提升道路品質-麥金路生活圈周邊串聯計畫人行環境改善工程第二期工程(工程案)	7,000
5	提升道路品質-基金一、二、三路人行環境及道路改善計畫(規劃設計案)	1,500
6	提升道路品質-中華路至德安路道路改善計畫(規劃設計案)	950
總計		52,450



圖 92：信一路示範道路



圖 93：義一路示範道路計畫



圖 94：實踐路示範道路計畫



圖 95：麥金路示範道路計畫

2.道路改善或拓寬：完成 5 項

8 年來，市府已完成義六路、中和路、月眉路、工東街、中山一、二路等 5 項道路改善或拓寬工程，總計投入經費 21 億 3,262 萬元，詳如下表所示。

表 9：104-111 年已完工之道路改善或拓寬工程

104-111 年已完工之道路改善或拓寬工程				
項次	工程名稱	工程經費 (萬元)	開工日期	完工日期
1	義六路道路改善工程	662	107 年 09 月 11 日	108 年 09 月 02 日
2	中和路拓寬工程	3,159	107 年 03 月 31 日	108 年 11 月 05 日
3	月眉路拓寬工程(第二標)	47,831	102 年 08 月 29 日	109 年 01 月 21 日
4	六堵工東街道路拓寬工程	4,929	107 年 07 月 27 日	109 年 05 月 06 日
5	中山一、二路拓寬工程	156,681	99 年 09 月 12 日	109 年 09 月 01 日
	總計	213,262		

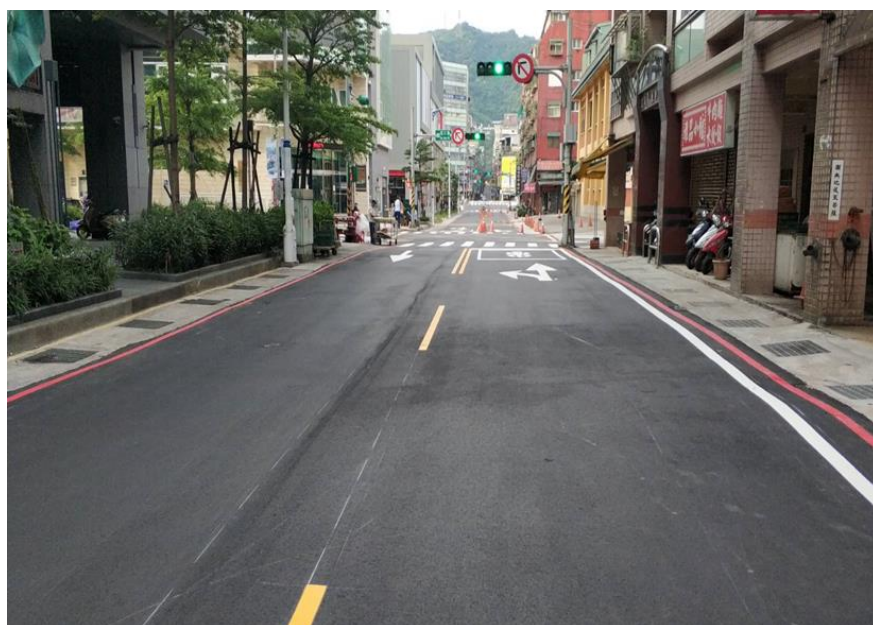


圖 96：義六路道路改善工程



圖 97：中和路拓寬工程



圖 98：六堵工東街道路拓寬工程



圖 99：中山一、二路拓寬工程於 109 年全線通車

3.人行路廊及人行地下道改善工程：完成 5 項、執行中 2 項

8 年來，市府已完成工建西路暨俊賢路沿線、信四路、忠一路、城隍廟及東岸廣場、東勢街等 5 項人行路廊及人行地下道改善工程，總計投入經費 1 億 5,640 萬元；執行中計有仁二路鄰校側及中正區行政大樓至要塞司令部等 2 項，總計投入經費 1,839 萬元，詳如下表所示。

表 10：104-111 年已完工之人行路廊或人行地下道改善工程

104-111 年已完工之人行路廊或人行地下道改善工程				
項次	工程名稱	工程經費 (萬元)	開工日期	完工日期
1	工建西路暨俊賢路沿線人行 行道改善工程	2,220	109 年 08 月 18 日	110 年 02 月 06 日
2	信四路人行空間改善工程	685	110 年 04 月 26 日	110 年 11 月 04 日
3	忠一路人行路廊改善工程	503	110 年 06 月 10 日	111 年 01 月 19 日
4	城隍廟及東岸廣場地下道 整修工程	821	110 年 12 月 01 日	111 年 01 月 24 日
5	東勢街路廊改善工程	11,411	109 年 08 月 06 日	111 年 08 月 16 日
總計		15,640		

表 11：104-111 年執行中之人行路廊或人行地下道改善工程

104-111 年執行中之人行路廊或人行地下道改善工程			
項次	工程名稱	工程經費(萬元)	執行進度說明
1	仁二路鄰校側人行道改善 工程暨規劃設計案	478	本案經內營建署核定總經費 478 萬，刻正辦理基本設計， 預計 111 年 12 月完成規劃設 計作業。
2	中正區行政大樓至要塞司 令部人行道串聯計畫	1,361	本案經內營建署核定總經費 1,361 萬，已完成規劃設計作 業，預計 111 年 10 月完成工 程發包作業。
總計		1,839	



圖 100：工建西路暨俊賢路沿線人行道改善工程



圖 101：信四路人行空間改善工程



圖 102：城隍廟及東岸廣場地下道整修工程



圖 103：東勢街路廊改善工程

八、加強本市老舊橋梁修改建、維修及檢測

1.已完工

市府 8 年來逐步完成各老舊橋梁改建及橋梁維修改善工程，維護民眾用路安全，已完工項目如下表所示。

項次	完工年度	完工項目	經費(萬元)	備註
1	104	暖江橋改建工程	16,583	
2	104	社寮橋改建工程	41,610	
3	106	百福車站人行橋改建工程	2,200	本案係台鐵支應經費新建，由市府維管。
4	107	七賢橋改建工程	32,314	1.榮獲 2017「公共工程金安獎」工程類佳作。 2.榮獲 2019「國家卓越建設獎」最佳施工品質類優質獎。
5	109	19 號及 21 號橋改建工程	9,258	榮獲 2021「國家卓越建設獎」最佳施工品質類優質獎。
6	110	中正高架橋護欄及隔音牆改善工程	6,353	
總計			10 億 8,318 萬元	



圖 104：七賢橋改建工程



圖 105：19 號及 21 號橋改建工程



圖 106：中正高架橋護欄及隔音牆改善工程

2.執行中

市府將持續辦理忠二橋及忠三橋、仁愛橋等橋齡超過 30 年的老舊橋梁改建，近期重點工作項目說明如下：

(1)忠二橋及忠三橋

本案向內政部營建署爭取補助經費為 5,817 萬餘元（中央負擔 5,472 萬，本府自籌 345 萬）。並自 110 年 11 月 22 日開工後，每日皆由工程主辦單位、警察單位針對施工進度及交通影響，向當區議員、地方里長及相關單位說明進度。並針對改道影響部分，每月邀集地方及相關單位進行滾動式交通維持計畫檢討。

截至 111 年 8 月 26 日止，工程進度 93.14%，預計最快忠三橋將於 9 月 14 日前開通、忠二橋於 10 月 15 日前開通，總工程預計於 111 年 11 月 3 日前申報完工。

(2)仁愛橋

仁愛橋重建工程前經 4 次工程發包流標，經重新檢討預算，市府已於今年 6 月 9 日以 7,726 萬餘元完成發包(營建署負擔 6,258 萬元，本府自籌 1,468 萬元)，為縮短施工期程，仁愛橋將以全封方式進行改建，施工封閉期間將導引中山高速公路車流駛出大業隧道後，分別接續行駛西岸高架橋、中正高架橋或直行孝二路進入市區，減少交通衝擊。本工程預計於 112 年農曆年過後封橋施工，工期為 270 個日曆天，預計 112 年底前完工。

(3)橋梁檢測與維修工程

依中央橋梁評鑑制度，市府轄管橋梁以每 2 年 1 次檢測頻率為原則，持續辦理檢測作業。本市橋梁共計 230 座(含 195 座車行橋梁及 35 座人行陸橋)，今年度將針對所有車行橋梁及人行陸橋進行日常巡檢，並針對 111 座車行橋梁及 35 座人行陸橋目視檢測，檢測有損壞之橋梁構件將進行必要之維修，預計將維修 44 座橋梁。

九、本市污水下水道接管率全國第 5

本市污水下水道系統管線工程，共分為五期實施計畫執行，計畫期程 89 年至 125 年。市府刻正辦理第三期實施計畫，共計 7 標工程，包括南河管線第 8-9 標工程及北港管線第 9-13 標工程，預計可接管戶數 22,603 戶。截至 111 年 7 月 31 日止，本市接管戶數達 63,686 戶，接管率已達 40.74%，排名全國第 5 名。各標工程進度如下表所示：

表 12：本市污水下水道系統第三期實施計畫進度

標案名稱	工程進度	進度摘要	預計完工時間
南河八標	80.34%	地點：工建路、崇信街 37 巷 工項：管道推進、道路明挖	112 年 2 月
南河九標	40.68%	地點：過港路 32 號、源遠路 277 號 工項：管道推進	113 年 3 月
北港九標	1.42%	地點：孝三路 工項：工作井試挖作業	114 年 11 月
北港十標	0.00%	1.交維計畫審查中 2.暫訂 111 年 11 月 28 日開工	114 年 10 月
北港十一標	12.54%	地點：東明路 工項：管道推進	113 年 9 月
北港十二標	59.13%	地點：東信路 35 巷、東信路 3 巷 工項：用戶接管	112 年 10 月
北港十三標	67.50%	地點：祥豐街、教孝街、深 溪路 工項：用戶接管	112 年 8 月

本市污水下水道工程配合水環境治理計畫，將可一併改善田寮河、旭川河、南榮河水質問題。

十、基隆河岸自行車道預計 111 年底完工

本案經市府與經濟部、內政部、交通部跨域合作投入約 1.8 億元推動，優先串連自汐止市界至瑞芳市界路線，分為五大工項執行。

其中「舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道」由本府委託經濟部水利署第十河川局代辦，併同該局「全線水防道路改善」一併發包，已於 110 年 12 月完成改善；另本府辦理之「4 座路口號誌設置」亦於 110 年 12 月配合完成設置。

另「基隆河過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」，由交通部公路總局委託本府辦理，於 111 年 2 月 16 日開工，預計 111 年底本市基隆河岸自行車道可全線完成串連。

各工項之辦理情形，詳如下表所示：

表 13：基隆河岸自行車道中央跨域合作 1.8 億元串連項目

工作項目	經費 (萬元)	經費 來源	執行機關	辦理進度
一、全線水防道路改善 10 公里	7,950	經濟部 水利署	水利署 第十河川局	110 年 12 月已完成改善。
二、舊五堵隧道口至堵南抽水 站越堤道路地坪改善	1,100	內政部 營建署	水利署 第十河川局 (代辦)	
三、4 座路口號誌設置	700	內政部 營建署	基隆市政府 交通處	110 年 12 月已完成設置。
四、過港路串接步道架高工程 120 公尺及步道改善 880 公尺	1,376	交通部	基隆市政府 工務處	111 年 2 月 16 日開工，預 計 111 年底完工。
五、暖江橋下穿越引道 60 公 尺及上游右岸懸臂道工程 800 公尺	7,130	交通部	基隆市政府 工務處	
合計	18,256			

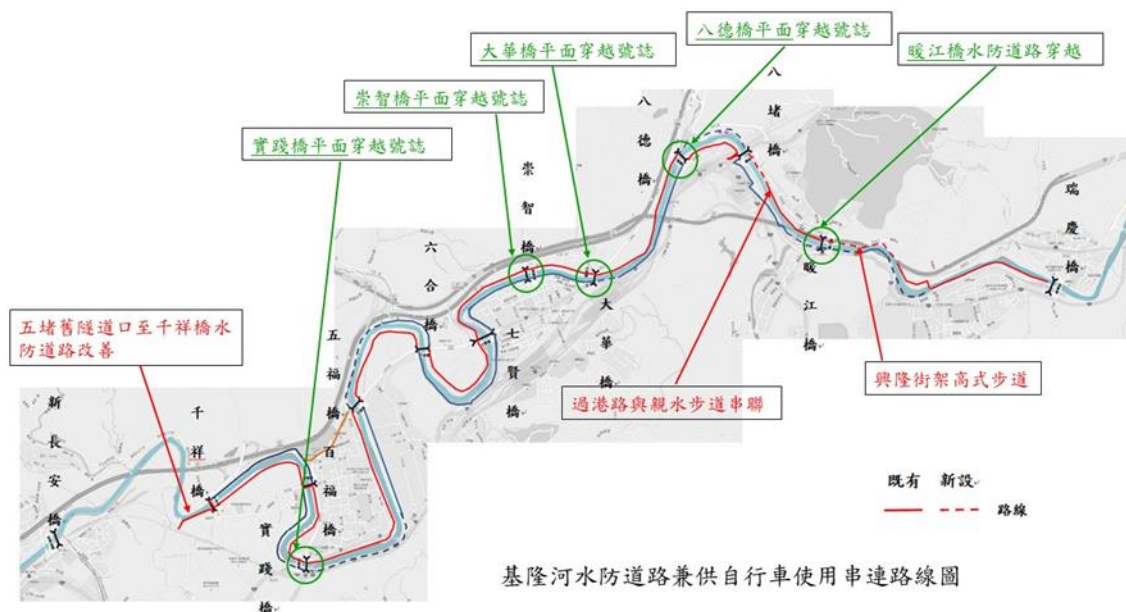


圖 107：基隆河岸自行車道路線圖



圖 108：全線水防道路改善 10 公里

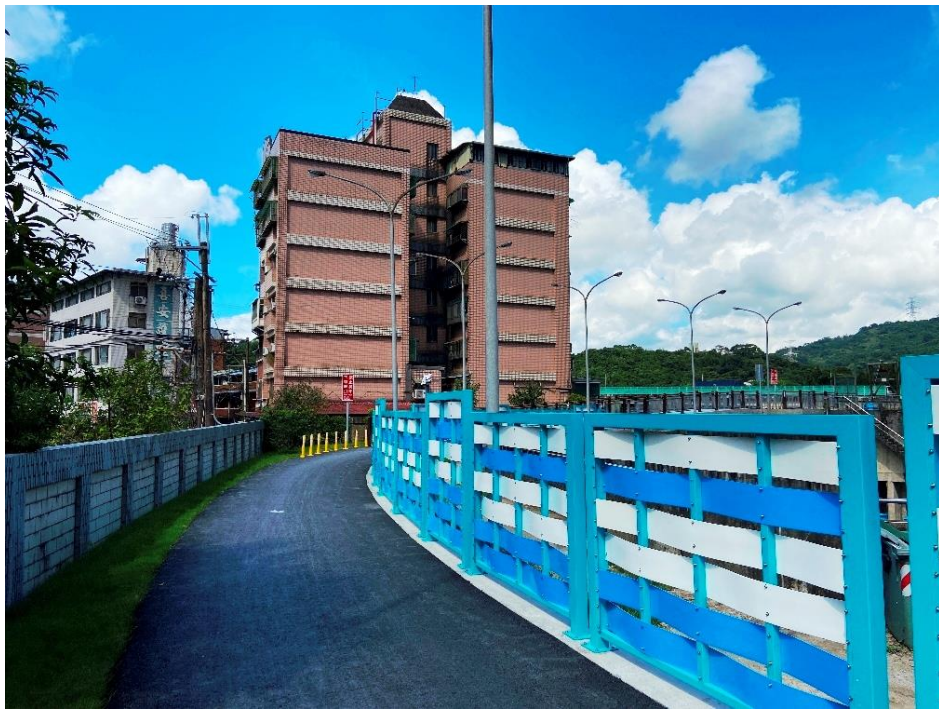


圖 109：舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道路地坪改善

十一、高地供水改善，幸福華城已於去年完工，美之國、壯觀台北預計今年 12 月完工

基隆市多為山坡地，許多高地社區都有供水問題，過去建商讓住戶的水管分成內管和外管，內管由社區自己負責，建商減少繳交自來水公司的代為操作和維修費用，多年以後內管發生問題時，管委會沒有能力解決承擔維修，造成漏水嚴重及水壓不足，這個問題在過去數十年都沒有改善，如幸福華城社區，經幾位議員與住戶們逐一溝通、蔡適應立委協調自來水公司，最後由市政府出面和水公司、住戶簽署三方協議，順利完成了供水改善，建立了解決基隆高地供水與漏水問題新模式成為全國示範首例，並成為行政院處理全國各縣市社區高地供水的示範案例，且全國一體適用。

108 年行政院核定「台灣自來水公司老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113 年)」，經費由中央及地方政府共同負擔 80%(中央負擔 56.8%，本府負擔 23.2%)，社區住戶負擔 20%。經評比，行政院核定本市共計 6 社區(幸福華城、美之國、壯觀台北、民生社區、綠葉山莊、富都新城)進行高地供水改善，辦理情形如下表所示。

表 14：行政院核定本市優先執行高地供水改善社區辦理情形

評比年度	核定執行社區	編列工程改善費 (編列年度)	編列操作維護費 (編列年度)	執行進度說明
109 年度	幸福華城	3,118,544 元 (110 年度)	5,482,293 (111 年度)	已完工。
	美之國	13,333,434 元 (110 年度)	3,946,358 (111 年度)	目前管線施工進度 59.8%，機電施工進度 20%，預計 111 年 12 月底前完工。
	壯觀台北	13,298,395 元 (110 年度)	12,427,628 (111 年度)	目前管線施工進度 100%，機電施工進度 60%，預計 111 年 12 月底完工。
110 年度	民生社區	5,122,560 元 (111 年度)	2,921,862 元 (112 年度)	該社區目前管委會尚未成立，且社區配合款尚在協調，繳款時間未確定。
	綠葉山莊 (原美館、優泉小鎮)	15,182,080 元 (111 年度)	5,280,449 (112 年度)	目前為初步規劃階段，預計 112 年 10 月底前完工。
	富都新城	5,800,000 元 (111 年度)	3,059,758 (112 年度)	目前為初步規劃階段，預計 112 年 10 月底前完工。
	小計	55,855,013	33,118,348 元	
	總計	88,973,361 元		

十二、台水公司規劃 3 年 8 億汰換基隆舊漏水管

台灣自來水公司配合行政院降低漏水率計畫(102 至 111 年)擬訂「基隆、台中及高雄供水系統降低無收益水量(NRW)計畫總顧問」委託技術服務專案，由美、日國際降漏經驗豐富團隊參與規劃。預計於 109-111 年間，於基隆地區投入約 8 億元加速辦理降低漏水率計畫 16 件汰換管線工程，針對漏水嚴重之小區管網委外辦理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，以利供水調配並減少因水壓起伏造成破管機率。

截至 111 年 8 月 31 日止，台水公司已完成暖暖區東勢街、源遠路、過港路、八堵路及仁愛區仁三路、中正區中船路 36 巷等路段之管線汰換；將持續辦理正信路、西定路、安樂路二段、成功一路、正義路、安和一街、協和街、明德二路等路段管線汰換。

歷年來基隆地區已逐年降低漏水率，由 101 年的 32.30% 降至 111 年的 22.62%，計已降低 9.68%，詳如下圖所示：

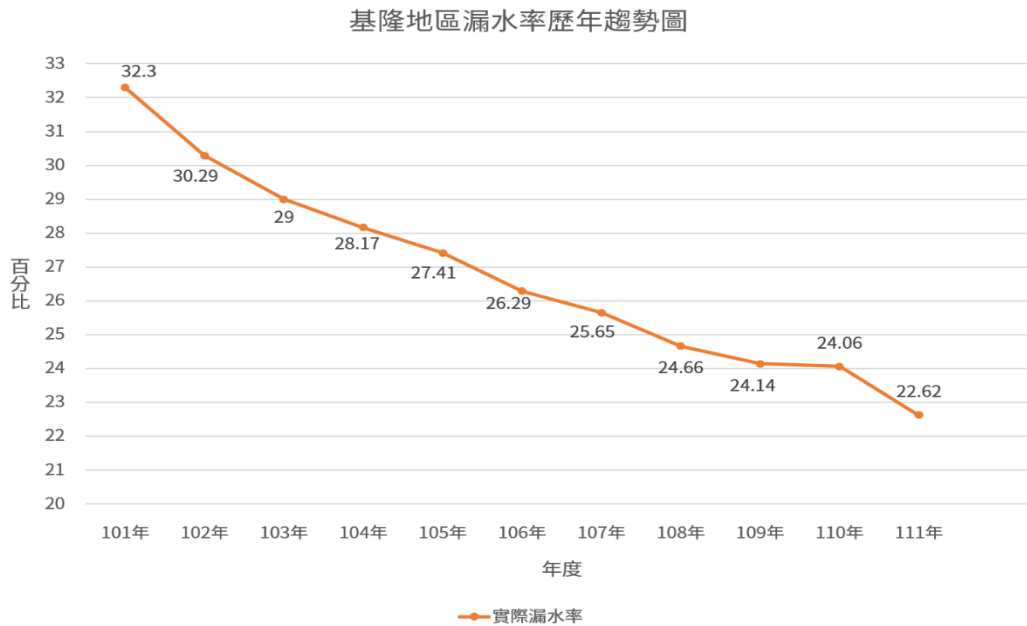


圖 110：基隆地區漏水率下降趨勢圖

十三、建置基隆市全方位地理資訊系統，支援市政決策判斷

右昌

在 106 年開始，要求地政處推動「基隆市全方位地理資訊系統」，整合府內 GIS 圖層建置 2D 與 3D 等共通平台，精準體現本市多山之地形與地貌；並創建協作平台，讓府內各單位將業務資訊轉化為直觀圖像建置於地圖上，並可以不同視角檢視早期都市規劃之合理性，作為開發建設或都市計畫檢討變更之依據。

目前系統計有 13 類、87 個圖層，豐富的圖資可作為同仁於行政業務之參考，並透過系統協作平台與精緻建模等功

能，達到圖資自主維護，以確保系統可用性及市政建設規劃之模擬。

系統分為公務版、外業版及便民服務版等 3 種，目前便民版系統累計瀏覽人次約 20 萬人次，平均每日瀏覽人數約 140 人次；公務版系統計有 43 個單位，共計 280 位同仁使用。

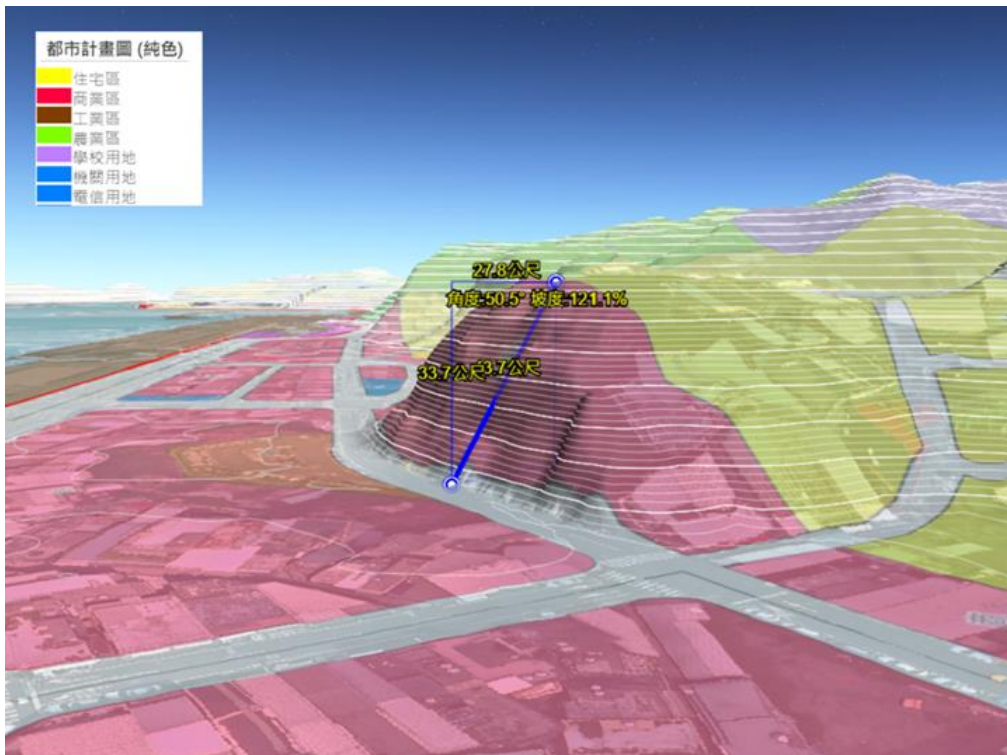


圖 111：本市建置全方位地理資訊系統，可由 3D 視角檢視早期都市規劃合理性

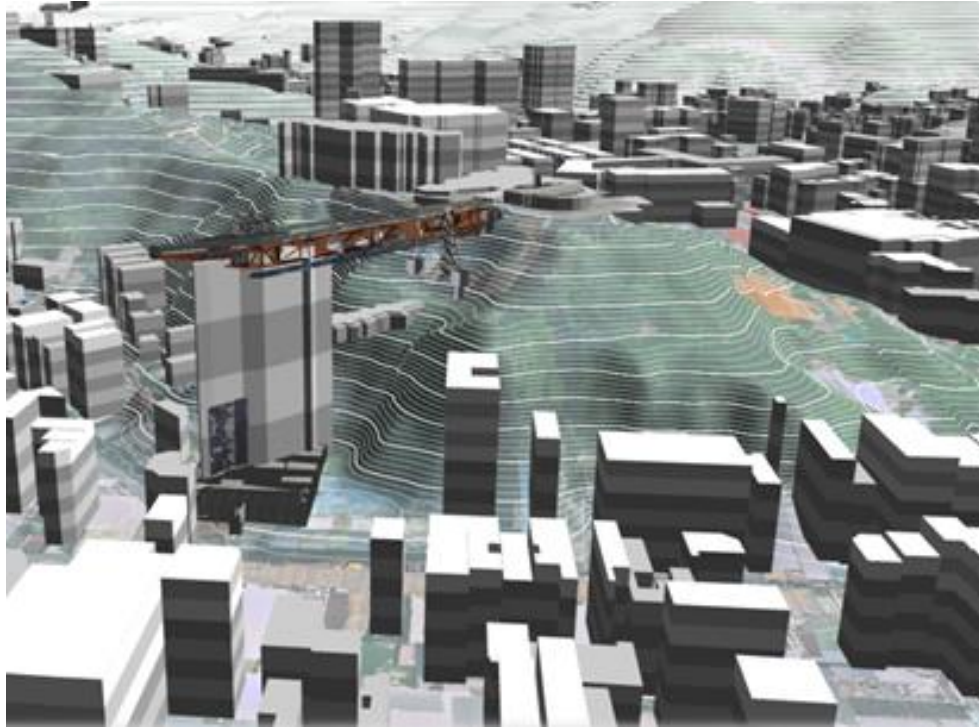


圖 112：「基隆市全方位地理資訊系統」精緻建模，可搭配其他圖資體現未來建設完成的結果

十四、基隆市數值航測地形圖測繪相關作業委託技術服務案

都市計畫基本圖資為都市計畫圖、地形圖及地籍圖，惟本市航測地形圖係於 96 年完成修測，距今已逾十年，甚多地區現況已改變，導致舊有地形圖資料與現況不符，致使各項都市規劃窒礙難行。又本市都市計畫書圖重製需由地形圖、都市計畫圖與地籍圖三圖互相套疊，以利判別都市計畫範圍線之基準，倘地籍圖無法於短期完成重測，圖資精度不準確，使三圖疊合無法判讀，將會影響民眾之權益，亦無法順利推

動市府相關建設計畫。為使地形圖資料與現況相符，並配合中央國土資訊系統基本地形資料庫與地理資訊系統建置政策，以及 TWD97 坐標系統之國土測繪標準，故辦理本市數值地形圖修補測繪相關作業。

本案於 109 年 6 月 22 日議價決標、簽訂契約，目前已初步完成都市計畫區及非都市計畫區成果，原訂於 111 年上半年補拍地形圖正射影像，考量港區重大建設工程尚未完工，後續俟港區工程完工於保固階段進行補拍及更新作業。

待全市 1/1,000 數值地形圖修補測建置完成，將可運用作為都市計畫、土地重劃、公共管線、防救災、土木、水利及交通等各項施政規劃及建設之重要參考資料。後續辦理都市計畫書圖重製作業更能提昇都市計畫圖資整合使用效益，以維護民眾權益及增加市府相關規劃行政效益，達到智慧城市之目標。

十五、都市更新輔導團培訓，成功輔導 5 處地區成立更新會並爭取營建署自行實施都市更新補助

民國 87 年都市更新條例公告實施，市府依法令劃定更新地區，惟都市更新成案關鍵是地區環境及所有權人意願整合。近 8 年，市府啟動「市港再生標竿計畫」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」、「以校園為核心的城市改造計畫」及「水環境改善計畫」等，加快改善地區環境，提升整體環境品質，並爭取營建署「都市更新自主更新輔導團」經費，透過都市更新人才培訓課程及法令說明會，提升民眾對於都更法令及權益認知，打造都市更新推動之基礎。

市府自 105 年至 111 年推動「都市更新自主更新輔導團」計畫，共爭取中央核定補助 968.5 萬元。至 111 年 8 月 31 日止，共舉辦 36 場座談會及法令說明會，辦理 219 小時自主更新人才培訓課程，培力 455 位都市更新推動種子，並於 110 年 9 月 25 日成立安樂一期國宅都更工作站。至今已成功輔導聯宏社區、復興國宅、安樂一期 5 號基地、6 號基地及 7 號基地等 5 處地區，籌組成立更新會並爭取營建署自行實施都市更新補助。



圖 113：安樂一期國宅都更工作站於 110 年 9 月開幕

十六、建照審查併審機制創新作為，加速審查效率

基隆市因地理環境特殊，建造執照審查程序相對複雜，須依個案審查環境影響評估、水土保持審查、山坡地加強坡審、免適用建築技術規則第 262 條認定配置審查、共構審查、都市設計及開放空間審查等許多審議項目後，才會進入建造執照實質審查。

為了改善建照審查流程過於冗長的困境，市府從 108 年 9 月起，特別請建築師公會於每週二至市府協助建造執照案之法令審查，並於 109 年間發布「建築執照及雜項執照申請案件檢附證件及裝訂順序」檢核表、「使用執照申請案件檢附

證件及裝訂順序」檢核表，加速民眾在申請前有效檢核應附文件，以縮短審查時程。

這樣的創新作為，讓市府的建照審議時程，從原本的 8.9 天，縮短至平均只要 5.18 天，提升建照審查效率。

柒、教育翻轉與校園環境改造

市府重視人才培育及教育環境，8年來總計投入552億餘元的教育經費，104年編列教育預算61.38億元、105年編列61.4億元、106年編列62億元、107年編列65.2億元、108年編列68億元、109年編列72.7億元、110年編列83.9億元，今(111)年則編列78.3億元，8年來教育經費成長規模達27.57%。




圖 114：104-111 年度本市教育經費預算數趨勢圖

一、提高學校行政事務費，8年增加超過1.2億元

為了讓校務行政運作順暢，^{右昌}要求教育單位應增加學校行政事務經費，將學校預算的經資門「通案標準」，105年至107年，連續3年每年增加10%，105年增加747萬7,000元，106年增加1,433萬元，107年增加2,111萬4,000元，108年以後每年維持增加2,111萬4,000元之額度，截至111年共增加1億2,737萬7,000元，讓學校在辦理校舍修繕、辦公器具維修及汰換、學生事務及學藝活動等，獲得立即的改善及助益。

二、強化雙語與國際教育，完成雙語教育一條龍政策目標

基隆是國家海洋門戶，為培育基隆學子國際素養與視野，市府8年來努力推動雙語教育與國際教育，幫助孩子與國際接軌。

1. 雙語教育

為培養國際城市所需的雙語人才，市府自106學年度全面推動國小一年級起實施英語教學，並已達成「雙語教育一

條龍政策」目標，於國小、國中、高中開設雙語學校或雙語實驗班，詳如下表所示。

表 15：本市達成「雙語教育一條龍政策」目標

類別	成立學年度	國小名稱
雙語國小 (達成「區區有雙語學校」目標)	109	中興國小
		中華國小
	110	成功國小
		長興國小
		暖暖國小
	111	正濱國小
安樂國小		
雙語國中	110	百福國中
	111	中正國中
		建德國中
高中雙語實驗班	110	安樂高中
		暖暖高中

此外，市府將在 112 學年度達成「校校推行部分領域雙語教學」，每所學校皆有部分領域以英語融入教學，使學生在浸潤式學習環境中，自然而然習得學科知識，藉此提升學生的英語口說能力。

2. 國際教育

市府積極推廣國際教育，除既有成功國中與日本中能登町中學校、武崙國中與馬來西亞波德申中華中學、安樂高中

與日本吳市立吳高等學校，另暖暖高中已與日本福井縣立若狹高等學校締結姊妹校，為本市第四所姊妹校。

本府也與駐外單位合作，造就本市國外姊妹校或夥伴學校日漸增多，從 110 年的 7 所擴增至 111 年的 18 所，國家更遍及美洲的美國及亞洲的日本、印度及馬來西亞，拓展師生更多元的國際視野及文化涵養。。

三、投入超過 4.2 億元推動智慧教育十部曲，打造符合世界潮流的智慧校園

在數位科技的現代，資訊設備的充實刻不容緩！^{右昌}下定決心，要藉由智慧教育，翻轉基隆的教育場域，做為國家智慧教育示範城市，推動提升教學品質十部曲，十部曲環環相扣，一步一腳印地打造新世代智慧校園，厚植本市校園資訊科技教學的軟實力，完善本市智慧教學。

1.第一部曲：104 年及 105 年合計編列 3,500 萬經費推動「班班數位化計畫 1.0」，更新全市學校教室透過 55 吋液晶電視等資訊設備。

2.第二部曲：全面提升校園網路骨幹至 1Gbps，投入 1,000 餘萬元，讓智慧教育工作得以開展。

3. **第三部曲**：開辦「校校有智慧創客教室」，率全國之先於 107 年完成校校智慧創客教室建置，投入 6,500 萬元，透過整體環境營造及資訊科技設備補助，為本市各校的 maker 教育打底。
4. **第四部曲**：導入 Google 相關新科技於教學現場。107 年投入近 700 萬元，完成建置「教育創新研發實驗中心」，成為智慧教育推動據點。這間研究室並和 Google 及其協力廠商通力合作，開發智慧教育平台與課程，並透過大量 Google 雲端工具（Meet、Classroom...等）的到校研習，超前部屬學校老師科技教學能力，讓校園足以因應 108 年爆發的全球 Covid-19 疫情。
5. **第五部曲**：創建校園 10Gbps 第二骨幹，打通校園網路任督二脈與 105 年建置之 1Gbps 雙脈相承，讓校園網路不斷線。並料敵機先汰除校園所有 105 年之前建置之所有舊網路線路及設備，共投入 2,000 餘萬元的經費，超前全國於 108 年完成校園骨幹網路阻礙清零。
6. **第六部曲**：建置啟航教室讓老舊電腦教室重生，除了 104 年來共投入 6,000 餘萬元經費進行每年電腦教室設備更新外，兩年前更加碼投入 3,000 餘萬元經費，重新打造 31 所學校

舊電腦教室，預計在 113 年前完成全市國中小舊電腦教室改造。

7.第七部曲：班班數位化 2.0 建置班班 75 吋或 86 吋觸控大屏，86 吋的大屏更規劃搭配 wifi6 筆電，投入 7,500 萬元，提供教學現場最新資訊科技設備，以充實校園數位教學軟實力，並創全國之先，加碼建置低年級及本市特教班之教室，照顧學生數位科技學習權益一個都不能少。

8.第八部曲：出口網路拓寬打造網路學習康莊大道，本市教網中心為全市學園網路樞紐，除了投入 1,100 萬元，將教網中心機房升級成節能雲端機房、建置相關網路服務之外，更將教網出口網路從 4Gbps 拓寬至 20Gbps。另校園出口網路小校維持 300Mbps，中型學校從 300Mbps 升級到 500Mbps，大型學校從 300Mbps 升級到 800Mbps 或 1Gbps。在全國六都之外，為完成拓寬的領先群縣市。

9.第九部曲：「生生用平板、班班有 AP」，除了在行政院生生用平板專案的 6,000 餘萬元補助案多爭取到 1,000 餘台的載具外，加上本市從智慧教育規劃推展開始至今，就陸續補充校園的學習載具，目前本市已超越行政院載具學生比 1：6 的基礎，達到 1：2 的比率，讓本市學校兩位學生就可

共用一台載具。另因應大量載具到校，將全面再投入 900 萬，建置本市高國中小所有普通班級建置 wifi6 最新規格 AP，預計今年 10 月前即可完成建置，規劃與建置列於全國前段班，讓有線到無線網路一路暢通，校園數位學習不卡關。

10.第十部曲：AIoT 研發中心規劃建置，係因應本市教師研習中心改建，一併思考智慧化互動空間，並規劃建置陽明交大所開發的 AIoT 平台，打造研習中心成為智慧燈控、智慧電子圍籬等智慧互動科技的示範點，提供學生可自行程式設計控制環境的平台，以提升人與環境的互動，打造新一代的 AIoT 智慧校園；本項預計投入 4,000 萬元，預計於 112 年建置完成。

表 16：推動智慧教育十部曲

階段	內容	完成年度	經費(萬元)
第一部曲	更新全市學校教室透過 55 吋液晶電視等資訊設備	104 105	3,500
第二部曲	全面提升校園網路骨幹至 1Gbps	106	1,000
第三部曲	校校智慧创客教室建置	107	6,500
第四部曲	建置「教育創新研發實驗中心」	107	700
第五部曲	創建校園 10Gbps 第二骨幹	108	2,000
第六部曲	建置啟航教室讓老舊電腦教室重生	施作中 預計 113 年完成	9,000

階段	內容	完成年度	經費(萬元)
第七部曲	建置班班 75 吋或 86 吋觸控大屏	111	7,500
第八部曲	出口網路拓寬打造網路學習康莊大道	111	1,100
第九部曲	生生用平板、班班有 AP	施作中 預計 111 年 10 月完成	6,900
第十部曲	AIoT 研發中心規劃建置	規劃中 預計 112 年完成	4,000
合計			42,200

四、設立 3 所實驗教育學校，提供多元教育選擇權

為提供多元教育選擇權，市府積極推動具專屬特色之實驗教育，國小部分設有瑪陵國小、八堵國小共 2 所實驗教育小學，分別於 105、106 學年度開始招生，兩校均持續穩定招生，111 學年度新生人數，瑪陵國小有 20 位學生、八堵國小 有 18 位學生。

為了讓國小實驗教育繼續向上銜接，本市自 109 學年度成立首間的學校型態實驗教育國中「南榮國中」，從七年級開始實施，共招收 3 個班級（普通班 2 班、體育班 1 班）。南榮國中也向下與八堵國小銜接相關課程，並藉由多場次的學生體驗營與家長說明會，將學校的辦學理念充分讓民眾了解。

五、建構優質運動空間

1.提供市民優質運動場館

為提供市民優質的運動空間，本府自 107 年起陸續修繕本市各運動場館，截至 111 年 8 月 25 日止，共計已投入 6 億 1,649 萬元經費，各計畫辦理情形如下表所示：

表 17：107-111 年本市修繕運動場館一覽表

計畫名稱	年度	計畫經費 (萬元)	辦理進度
市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施更新整建工程	107	4,170	109年4月10日完工。
市立體育館及周邊附屬設施修繕計畫	110-111	3,100	施工中，預計111年12月底完工。
市立網球場及附設籃球場鋪面改善工程計畫	110-111	1,500	111年7月24日啟用。
市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程	108-112	45,879	<ol style="list-style-type: none"> 1.本案原訂於111年8月22日通知廠商終止契約。 2.惟8月22日工程會顏副主委率隊訪視田徑場，本於解決爭議之建議暫緩終止，並提供以下建議： <ol style="list-style-type: none"> (1)針對廠商工期部份，請於一週內就工期展延完成核定，如工期無共識之爭議部分可先擱置，再至工程會爭議調解。 (2)請於二週內就契約變更部份重新議價，廠商就價款部分有爭議，亦可一併提工程會爭議調解。 (3)於三週內請施工廠商機具人力進入施作。 (4)以上事項若施工廠商仍未能於三週內配合，再行辦理終止契約。 3.本案將依照工程會建議，並同步備妥終止契約及重新發包等配套措施，以防止廠商後續未履行契約施作。
市民體育活動中心修繕計畫	110-112	7,000	111年6月13日工程決標，預計111年9月初開工，112年12月底完工。
經費總計		6億1,649萬元整	



圖 115：市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施更新整建工程



圖 116：市立網球場及附設籃球場鋪面改善工程於 111 年 7 月 24 日正式完工啟用

2.提供學子完善運動場所

(1)完成 8 校半戶外球場

為解決部分學校受天氣影響致體育課無法正常上課或體育設施無法使用的問題，市府於 108 年向教育部爭取補助本市 8 所學校，合計 7,630 萬元經費，辦理設置半戶外球場(風雨操場)計畫，8 校已於 110 年 10 月前全數完工，如下表所示。

表 18：本市完成設置 8 校半戶外球場

校名	鄉鎮市區	設置經費(元)	完工日期
銘傳國中	仁愛區	8,900,000	110.05.22
安樂高(國)中	安樂區	8,900,000	110.04.30
建德國中	安樂區	8,900,000	110.05.31
深美國小	信義區	8,900,000	110.05.15
深澳國小	信義區	8,900,000	110.07.18
五堵國小	七堵區	14,000,000	110.04.06
暖西國小	暖暖區	8,900,000	110.05.21
碇內國小	暖暖區	8,900,000	110.10.10
	合計	76,300,000	



圖 117：深美國小半戶外球場



圖 118：暖西國小半戶外球場

(2)改善 12 所學校運動環境及設施設備

市府積極向中央申請經費以改善各校運動環境及設施設備，教育部 111 年已核定第一階段本市堵南國小等 9 校經費 7,528 萬 0,678 元，第二階段預計核定本市信義國中等 3 校經費 2,276 萬 2,100 元，總經費預計達 9,804 萬 2,778 元(中央補助 7,353 萬 2,083 元，市府自籌 2,451 萬 0,695 元)，將整建本市 12 校操場、跑道及其附屬周邊設施，第一階段預計 111 年 11 月底完工。

本市所屬學校計 54 所，未來 12 校整建完成後，總計將有 42 所學校完成相關整建工程，屆時校園運動環境完善率將達到 77.78%。

本市 12 所學校運動環境及設施設備改善辦理情形，詳如下表所示：

表 19：本市 12 所學校運動環境及設施設備改善一覽表

校名	行政區	經費(元)	工程進度
堵南國小	七堵區	9,000,000	預計 111 年 11 月 30 日完工
長興國小	七堵區	7,584,442	預計 111 年 11 月 30 日完工
八斗國小	中正區	8,473,038	預計 111 年 11 月 30 日完工
八斗高中	中正區	9,504,609	預計 111 年 11 月 30 日完工
中正國小	中正區	6,743,338	預計 111 年 11 月 30 日完工
南榮國小	仁愛區	9,009,456	預計 111 年 11 月 30 日完工
南榮國中	仁愛區	7,756,441	預計 111 年 11 月 30 日完工
深澳國小	信義區	8,000,000	預計 111 年 11 月 30 日完工
碇內國小	暖暖區	9,209,354	預計 111 年 11 月 30 日完工
信義國中	仁愛區	9,111,869	教育部體育署將於第二階段補助
長樂國小	安樂區	6,650,231	教育部體育署將於第二階段補助
和平國小	中正區	7,000,000	教育部體育署將於第二階段補助
	合計	98,042,778	

六、美力校園運動計畫三部曲，投入逾 28 億元改善 16 所校園—教育處

市府透過美力校園計畫大力進行校園空間改造，以校園為核心，注入城市設計能量改造校園空間，期提供本市師生更安全美麗的校園環境。計畫分為三期，總計投入 28 億 6,563 萬 5,715 元，改善 16 所校園。

1.第一期「首部曲」(7 校)

包括已竣工的仁愛國小、明德國中、暖暖高中、中正國中(老舊校舍整建)、中和國小，及進行中的中正國中(活動中心新建)、信義國小、中興國小等共 7 所學校，其中信義國小及中興國小等 2 校，結合校園改造增設地下停車空間，分別獲得 2019、2020「國家卓越建設獎」的殊榮。

2.第二期「成銘曲」(2 校)

包括「銘傳國中文藝、科學大樓拆除整建工程」及「成功國小活動中心拆除整建工程」兩案。

銘傳國中將拆除年久失修的老舊教室，新建結合風雨球場的新式教學大樓，預計重建面積 6,600 平方公尺，總經費計 2 億 8,428 萬餘元，已於 111 年 1 月 19 日開工，預計 113 年 4 月完工。

成功國小舊有活動中心設計狹隘、安全強度不足，將拆除興建包含有運動場、音樂廳的多功能展演廳，總經費計 3 億 7,000 萬元，已於 110 年 9 月 24 日開工，預計 113 年 1 月完工。完工後將能提供學生充足的運動空間及使用高規格的音樂展演場地，以學校為核心推廣本市藝術教育。

3.第三期「圓舞曲」(7校)

結合 7 所學校教職員生與建築專業對話，激盪創意與融合在地美感，共同擘劃新校園願景，賦予校園硬體更多想像與創新。7 所學校包括德和國小、中和國小、中華國小、碇內國小、正濱國小、八堵國小、安樂高中。其中八堵國小及安樂高中已分別獲核定經費 8,030 萬餘元及 2 億 822 萬餘元，刻正進行規劃設計。

表 20：美力校園運動計畫各校整建情形

階段	校舍整建工程名稱	經費	工程進度
首部曲	已完成	仁愛國小校舍整建工程	1 億 3,567 萬 3,778 元 103 年 4 月 26 日開工 105 年 7 月 21 日完工
		明德國中校舍整建工程	1 億 379 萬 9,396 元 105 年 1 月 4 日開工 107 年 2 月 13 日完工
		暖暖高中校舍改建三期工程	1 億 5,900 萬元 106 年 6 月 13 日開工 108 年 3 月 20 日完工
		中正國中老舊校舍整建第三期工程	1 億 1,700 萬元 106 年 3 月 1 日開工 108 年 8 月 12 日完工

階段	校舍整建工程名稱		經費	工程進度
進行中		中和國小老舊校舍整建工程	6,648 萬 2,274 元	109 年 6 月 1 日開工 111 年 4 月 12 日完工
		中正國中活動中心新建工程	1 億 3,694 萬 3,767 元	109 年 5 月 16 日開工 預計 111 年 10 月 27 日完工
		信義國小老舊校舍整建暨停車場新建工程	8 億 1,303 萬 7,000 元	106 年 7 月 25 日開工，第 1 期工程於 108 年 8 月完工。目前進行第 2 期工程，預計 111 年 10 月底完工。
		中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程	3 億 8,949 萬元	108 年 7 月 20 日開工 111 年 7 月 26 日完工
小計			19 億 2,142 萬 6,215 元	
二部曲	成功國小活動中心整建工程		3 億 7,000 萬元	110 年 9 月 24 日開工 預計 113 年 1 月完工
	銘傳國中老舊校舍整建工程		2 億 8,428 萬 5,000 元	111 年 1 月 19 日開工 預計 113 年 4 月 16 日完工
小計			6 億 5,428 萬 5,000 元	
三部曲	德和國小	139 萬	尚待教育部核定經費中	-
	中和國小	3,500 元		-
	中華國小	(七校校園		-
	碇內國小	規劃)		-
	正濱國小			-
	八堵國小			8,030 萬 8,000 元
	安樂高中		2 億 822 萬 3,000 元	刻正進行規劃設計
小計			2 億 8,992 萬 4,500 元	
經費總計			28 億 6,563 萬 5,715 元	

七、以校園為核心的環境改善計畫

本府推動「以校園為核心的城市改造計畫」，期望藉由改造校園空間的機會，一併滿足學校周邊地區的社區服務與環境需求，與社區共好。

1. 成功國小

105 年以成功國小為示範點，整合都發處、工務處、教育處及仁愛區公所各項計畫，成功改善該校校園周邊環境，過程中最重要是透過社會參，以及以「成功國小周邊街區再生行動」進行擾動與共識凝聚，策劃一系列的社區參與結合社會設計精神，並整合各項資源，以凝聚師生、地方居民之共識成功推動。



圖 119：成功國小示範以校園為核心的城市改造計畫

2.中興國小

中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程拆除使用逾 50 年的 3 棟老舊校舍，配合校舍改建合併進行停車場新建，將校舍地坪提升 3 公尺高度，總經費計 3 億 8,949 萬元經費，中央補助 1 億 6,521 萬元，市府自籌 2 億 2,428 萬元，於 111 年 8 月 30 日啟用。

中興國小突破校地限制，以創新的人字型設計校舍外觀，新設百米直線跑道與環狀散步空間，以及 2 樓到 1 樓大型溜滑梯與人工草皮，完善的規劃期使學校成為社區中心。

完工後的新校舍，有 40 間教室，包括普通教室、階梯教室、舞蹈教室及幼兒園活動教室，提供師生多元化學習空間，並營造一座可容納 120 個汽車停車格和 95 個機車停車格的半地下停車場，除供學校師長及社區民眾停車外，也可做為家長臨停接送之用，同時為體育館運動民眾，創造便利的停車空間，也將成為未來以校園為核心的環境改善計畫另一個新起點。



圖 120：中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程完工



圖 121：中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程完工

3.信義國小

「信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」為地下 2 層、地上 5 層鋼筋混凝土構造，教室 43 間、停車數量 348 位，新建所增加的汽車停車格解決廟口夜市及周邊社區停車問題；仁二路 137 巷增設 2 米人行道，改善路幅過窄及缺乏友善人行空間問題，並打開學校圍牆讓視野通透，實踐本市以校園為核心的社區改造理念，呈現校園嶄新的風貌。

本府已擇定以仙洞國小、和平國小、百福國中、安樂國小等 4 校，研提都市空間改造計畫，並以校園為核心，結合周邊公共空間進行整體規劃。未來將持續推動，由相關單位共組專案團隊，建立推動平台，藉由平台整合相關資源，與校方交流以達成規劃共識，建立校方對於周邊環境之認同與責任感。

八、中和國小老舊校舍整建工程已於今年 6 月 20 日 落成啟用

中和國小原先因校區小，缺乏室內運動空間，因此新大樓特地挑高九米，打造明亮的室內多元活動中心，並設置專用音樂教室、美勞教室、智慧創客教室、自然教室、資源班教室及專輔教室，解決校園長期缺乏專科教室及大型室內活動空間不足之困境。

新大樓為地上五層建物，兼具綠能永續概念，雨滴造型的透光窗與百葉窗設計，使陽光、空氣能自然流動融合，達成節能減碳目的。

整建工程總經費計 6,648 萬 2,274 元，中央補助 4,611 萬 5,000 萬元，本府自籌 2,036 萬 7,274 元，已於 111 年 4 月 12 日完工，6 月 20 日落成啟用。



圖 122：中和國小老舊校舍整建工程於 111 年 6 月 20 日落成啟用

九、0 至未滿 5 歲育兒津貼，核發金額超過 9.3 億元

本市 0 至未滿 2 歲育兒津貼發放，自 107 年 8 月 1 日起至 111 年 8 月 31 日止，共計發放 15 萬 7,723 人次，4 億 8,340 萬餘元；2 至未滿 5 歲育兒津貼，自 108 年 8 月起至 111 年 8 月 31 日止，共計發放 15 萬 5,021 人次，4 億 5,442 萬餘元。以上合計核發金額超過 9.3 億元，如下圖、表所示。

表 21：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形

發放人數與金額		年度	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	合計
		(8/1 起)	(8/1 起)				(截至 8/31)	
0 至未 滿 2 歲	發放人數		16,828	40,351	38,637	36,256	25,651	157,723
	撥付金額(萬元)		4,463	10,783	10,332	12,377	10,385	48,340
2 至未 滿 5 歲	發放人數		-	20,823	55,996	50,143	28,059	155,021
	撥付金額(萬元)		-	5,367	14,528	14,981	10,566	45,442
合計 93,782 萬元								




圖 123：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形

十、公幼、準公幼及非營利幼兒園占比已達 78.7%

本府自 106 年起陸續規劃設置非營利幼兒園，已於 110 年達成「一區一所非營利幼兒園」目標，目前共有 8 所非營利幼兒園，年度招生名額達 857 名。

本市公幼及非營利幼兒園 111 年度核定 5,493 個名額，較 110 年增加 216 個招生名額。目前全市公幼、準公幼、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心占比已達 78.7%（私立幼兒園占比 21.3%），大幅減輕民眾育兒負擔。

111 年 8 月起，準公共幼兒園每位幼兒月繳交 3,000 元，非營利幼兒園月繳交 2,000 元，此兩類幼兒園寒、暑假均正常收托。公立幼兒園雖然有寒、暑假，但市府體恤家長的短暫托育需要，率全國之先，公立幼兒園全面開辦課後留園到 18 時，為全國唯一公立幼兒園 100% 開辦課後留園的縣市。

目前本市 39 所國小，僅餘八堵國小尚未設置幼兒園，將搭配老舊校舍拆除改建設置幼兒園，預計 113 學年度完成，屆時將可達成「國小校校有幼兒園」的目標。

此外，本市 2 歲幼兒入園比例自 104 學年起逐年攀升，110 學年收托人數共 784 名（包含公幼及非營利幼兒園 479 人、私立幼兒園 305 人），入園比例達到 36.7%，7 年成長 4.4 倍。




圖 124：本市公立及非營利幼兒園收托名額成長圖




圖 125：本市 2 歲幼兒入園比例成長圖

十一、信義區親子館預計今年底完工，即將完成一區一親子館里程碑

本市已於安樂、七堵、中山、暖暖及仁愛區 5 個行政區設置親子館，並於中正區成立基隆祖孫館，經統計，104 年至 111 年 8 月底止，6 個館共計辦理逾 9,000 場次活動，參與人次總計將近 68 萬人次。

七區最後設置的信義區親子館，市府投入 2,000 萬餘元，於東信路舊宿舍原址新建，目前已完成基礎結構工程，刻正進行外牆及內部施工作業。

截至 111 年 8 月 28 日止，實際進度為 71.65%，已請廠商積極趕工，新建工程預計於今年底前完工。

表 22：各親子館 104-111 年度(截至 8 月)活動場次及人次

親子館	104 年度至 111 年度(截至 8 月)	
	活動場次	人次
安樂親子館	1,359	140,336
七堵親子館	1,206	125,875
西定親子館	1,639	109,958
暖暖親子館	1,772	108,924
仁愛親子館	1,090	84,389
祖孫館	2,136	109,146
信義親子館	新建中	
合計	9,202	678,628



圖 126：仁愛親子館修繕工程於 106 年 12 月完工



圖 127：基隆祖孫館修繕工程於 106 年 12 月完工



圖 128：信義親子館示意圖

十二、「一區一特色遊戲場」全數完工，將於今年 9 月 開學後陸續開放社區使用

市府積極向中央爭取 3,538 萬 9,994，本府自籌 2,659 萬 9,401 元，總計投入 6,198 萬 9,395 元，打造符合衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」並富有生命力之兒童特色遊戲場，兼顧安全與樂趣。

本市七區具地區代表性之特色遊戲場，以兒童的角度思考，提倡參與式設計，並納入課程，讓師生及家長一同創作，不僅規劃設計空間功能，也讓遊戲設施與現地自然環境、生

態相互呼應，並與在地文化融合，打造兼具功能與美感的遊戲場。

七區特色遊戲場已全數完工啟用，包括暖西國小「軟絲樂園」、堵南國小「大船入港」、仙洞國小「城堡貨櫃屋」、深美國小「森林樹屋主題」、八斗國小「原住民文化主題」、長樂國小「蜻蜓、昆蟲主題」、成功國小「音樂教育主題」，將於 111 年 9 月 1 日開學後一一啟用開放，提供社區親子休憩場所。本市各區特色遊戲場辦理情形詳如下表所示：

表 23：本市各區特色遊戲場辦理情形

行政區	學校兒童特色遊戲場	特色說明	完工時間	工程經費
暖暖區	暖西國小-軟絲樂園	設計軟絲外型的兒童遊樂場，兼具海洋教育元素。	109 年 12 月底完工。	總經費 440 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 350 萬元。
七堵區	堵南國小-大船入港	設計船型城堡的兒童遊戲場，兼具海洋及探險元素。	110 年 2 月底完工。	總經費 430 萬元，中央補助 90 萬元，市府自籌 340 萬元。
中山區	仙洞國小-城堡貨櫃屋	以貨櫃屋及城堡為主題，因學校靠近貨櫃場，融為在地文化主題。	110 年 6 月底完工。	總經費 220 萬，中央補助 90 萬元，本府自籌 130 萬元。
信義區	深美國小-森美小精靈	利用學校地形地貌特色，規劃探險樹屋，兼具環境教育與探險元素。	111 年 4 月 20 日完工。	總經費 728 萬元，中央補助 130 萬元，本府自籌 598 萬元。
中正區	八斗國小-八斗部落文化村	以原住民特色為主題，結合在地文化及藝術特色。	111 年 6 月 28 日完工。	總經費 500 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 410 萬元。
安樂區	長樂國小-蜻春蜓園	搭配學校地形金龍湖之特色，以蜻蜓、昆蟲為遊戲場主題。	111 年 7 月 18 日完工。	總經費 500 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 410 萬元。
仁愛區	成功國小-fun 電樂園	結合學校特色及推廣音樂教育文化，以音樂樂器為遊戲場主題。	111 年 4 月 20 日底完工。	總經費 190 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 100 萬元。



圖 129：暖西國小-軟絲樂園



圖 130：堵南國小-大船入港



圖 131：仙洞國小-城堡貨櫃屋



圖 132：八斗國小-八斗部落文化村



圖 133：長樂國小-蜻春蜓園



圖 134：成功國小-fun 電樂園

十三、校園「班班有冷氣」，本市共計 2 萬 1 千多名國 中小學生受惠

本市配合行政院「班班有冷氣」政策，爭取中央補助經費 3 億 5,807 萬 3,381 元，市府自籌預算 9,872 萬 8,647 元，總計 4 億 5,680 萬 2,028 元，改善全市 54 所國中小校區，共 1,562 間教室的電力系統，裝設 3,117 台冷氣，總計有 2 萬 1 千多名國中小學生受惠。另為妥善管理校園用電，兼顧安全與節能，也同步建置校園能源管理系統(EMS)。

電力系統改善工程分 10 群招標，已於 110 年 7 月 15 日前全數決標，8 月陸續開工，新設電力工程已於 110 年 12 月 31 日以前全數竣工，既設電力工程已於 111 年 4 月初全數完工。

另教室冷氣機部分，中央補助經費 1 億 2,665 萬 1,390 元，市府自籌預算 7,012 萬 5,930 元，總計 1 億 9,677 萬 7,320 元，已於 110 年 4 月完成公開評選採購，並於 7 月開始進行各校教室冷氣安裝，並於 110 年 12 月 31 日以前全數安裝完成，於 111 年 4 月底前全數驗收完畢。

市府於 110 年 7 月 15 日完成全市校園能源管理系統(EMS)採購，由中央補助本市經費 3,490 萬 5,800 元，市府自

籌 431 萬 4,200 元，總計 3,922 萬元，於教室裝設冷氣分電表、每校設置 1 台「再生能源發電量測電表」與面板 42 吋以上的「即時資訊看板」，以掌握全校用電資訊，避免用電超載，亦可收集全校總用電、冷氣用電、太陽能光電板發電、個別教室用電狀況等訊息，進行學生能源教育，已於 111 年 3 月 15 日以前全數安裝完畢，並於 4 月起開始實測各校冷氣使用狀況，5 月起開始正式啟用冷氣。

疫情期間學校教室需要保持通風，本市除了安裝冷氣以外，^{右昌}也指示各學校搭配裝設細水霧、抽風扇等設備，增加空氣流通與節能。

十四、本市學校屋頂標租太陽光電比例居全國之冠

教育部於 109 年全面推動實施校園「班班有冷氣」計畫，因應冷氣消耗之電能，搭配配套方案「校園推動裝設太陽光電計畫」，於全國學校屋頂裝設太陽光電。

本市開放全市 54 所國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板，共建置 56 校區(含月眉、尚智)，建置比例突破 100%，為全國第一。已於 110 年 7 月 3 日前與各校完成簽約，共計裝設容量計 16,451Kwp，回饋比例為 21%，亦為全國之冠。

若發電容量未達契約預估容量，也將以契約約定的九成容量回饋，預估全市各國中小年度回饋金總計至少為 1,347 萬 4,278 元，自 111 年 1 月 9 日起開始收取。截至 111 年 8 月 24 日止，已有 36 校完工併聯發電，4 校待報竣，18 校施工中，最慢於 111 年底前全數完工。

表 24：本市國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板執行進度

執行進度	校區	校名
完成併聯掛網	36	復興國小、深澳國小、正濱國小、月眉國小、華興國小、德和國小、港西國小、碇內國中、中山高中、大德分校、中華國小、中和國小、中興國小、七堵國小、明德國中、銘傳國中、八堵國小、尚仁國小、八斗高中、瑪陵國小、尚智國小、中正國小、碇內國小、安樂國小、南榮國中、堵南國小、中正國中、建德國小、長興國小、南榮國小、百福國中、暖暖國小、武崙國小、八斗國小、仙洞國小、建德國中(游泳池)
待報竣	4	和平國小、暖江國小、仁愛國小、成功國小
施工中	18	東信國小、建德國中、安樂高中、五堵國小、深美國小、信義國中、忠孝國小、正濱國中、東光國小、信義國小、中山國小、成功國中、隆聖國小、長樂國小、西定國小、暖暖高中、暖西國小、八斗高中(游泳池)



圖 135：本市開放全市 54 所國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板

十五、全台首座實體社區大學於 110 年 12 月啟用

基隆社大成立於 88 年，為國內最早成立的三所社大之一，二十幾年來鼓勵市民關懷公共事務，不僅為市民建構起全方位的終身學習平台，也經由各項公民活動結合在地文化深耕、接軌全球視野。

110 年適逢月眉國小併校，本府隨即評估各項需求，協助社大召開跨局處會議，將校舍改善為全齡友善的開放式教學場域，在籌備、搬遷、整頓僅歷時半年，於 110 年 12 月 8 日舉行揭牌典禮，成為首座供市民學習與社群合作之實體場

域，也是在地青年培力基地、社造基地、環境教育場域及地方學推展中心。

未來，社大將致力於達成下列各項辦學目標，以實現「翻轉學習共創基隆·打造全世代宜居城」之願景：

- 1.培力現代公民，發展具有行動力的實踐社群。
- 2.厚植在地知識，建構基隆學與發展地方文化。
- 3.融合城市治理，推動地方創生與青年培力。
- 4.深化公共關懷，促進各年齡層的健康與福祉。
- 5.回應全球挑戰，關注永續海洋與生態議題。
- 6.打造實體社大，落實共學共創共好之場域精神。

本市社區大學持續兼顧通識教育及專科培訓，111 年度成效如下表所示：

表 25：111 年度基隆市區大學辦理成效說明

課程類別	課程名稱	辦理成效
一般性課程	春季班	開設 122 門課程，學員數高達 2,045 人次。
	夏季班	開設 58 門課程，學員數共計 885 人。
	秋季班	預計於 9 月 5 日至隔年 1 月 8 日開設 122 門課程，預估人數達 2,000 人次。
專案性課程	提升英語學習力計畫	包含旅讀基隆學英文、英語解說導覽員、泡茶學英語等不同形式課程，共計 5 門課程，170 人次參與。
	促進公共參與特色議題計畫	規劃認識海洋生物多樣性與地形地質、與蜜蜂共舞-一日蜂農體驗、愛月農場-友善農耕工作坊、「明日惜食主廚養成-零廚餘料理」工作坊、遇見基隆最美的山徑-基隆步道學、2022 基隆河流域論壇、「悠遊海洋·體驗經濟」地方創生論壇等深度化的 7 項在地主題，引領民眾更為認識自己所在的城市。
	學習型城市計畫	綜整本市在地團隊資源，回應聯合國永續發展目標，以「在地共榮、在地共學、在地共好」為主軸，邀集 8 組在地青年團隊，發想出 17 項豐富的子計畫活動，其中社大負責不老新生活—創齡五感藝術體驗、銀髮藝術師資培訓、基隆步道學、打造觀光廊帶-魅力基隆散步策暨觀光導覽人才進階培力、創生儲備人才培力營等特色活動。
	12 年國教計畫	1. 邀請 10 所市屬學校進行跨界合作，以學校為中心，向外出發與社區連結，進行英語營隊課程。 2. 與基隆高中合作，以清法戰爭為主題規劃系列文史課程。

課程類別	課程名稱	辦理成效
		3. 與建德國小合作舉辦安樂區文史生態踏查 4. 與中山國小合作舉辦食農教育中山田園樂系列課程，實現「自發、互動、共好」的全人教育課程。



圖 136：基隆社區大學辦理「大基隆歷史場景導覽人才培訓」

十六、基隆教育，七大全國第一

基隆是大台北首都圈中的非直轄市，資源相對少很多，但市府仍然非常關心基隆教育的發展，因此積極向中央爭取經費、逐年提升教育預算，把一分錢當十分錢來用，透過努力、創意力和執行力，運用最少的資源創造出最大效益，提升完善教育資源與環境。歷經 8 年來的努力，市府於今年 8 月 27 日至 9 月 4 日在基隆舊火車站舉辦「基隆教育成果展」，呈現這幾年來基隆教育的翻轉蛻變。

在致力將基隆升級為嶄新起點城市的前提下，市府 8 年來傾全力投入各項教育的軟硬體投資，獲得豐碩的成果，教育亮點包括「七大全國第一」：班班數位化領先全國、學校社區共讀站設置比例全國最高、本市各行政區皆有雙語學校、課後留園開辦率全國第一、全國唯一公立幼兒園免抽籤、職業試探學生參與率全國第一、每一行政區都有一特色共融式遊戲場；可見這幾年市府用心規劃、盡力提供基隆孩子最優質的學習場域所做的努力，成果已與雙北並駕齊驅！

市府期望透過教育成果展，以靜態展示與動態活動的方式，讓民眾可以輕易的參與展覽，進而了解基隆教育的推動

亮點與成果，理解學生使用到的學習資源與環境，從各層面
深刻了解基隆教育的不斷蛻變與飛躍前行。

捌、提升城市文化力

一、文化中心美術館展場提升及場館升級整建

本市文化中心以美術館規格重新設計展場空間，除了 1 樓打通讓動線更流暢，3-7 樓迴廊整建為新的休憩空間，容納更多遊客參觀駐足，而表演藝術中心的演藝廳內則重新調整座椅間距及替換更耐久舒適的座椅，提升演藝廳整體環境舒適度，讓文化中心大樓整體環境更舒適新穎，提供市民更優質的藝文空間。

1.基隆美術館展場提升計畫

文化中心一至三樓的「基隆美術館展場提升計畫」，總核定經費 2 億 4,285 萬 8,000 元，已於 110 年 6 月 12 日開工，目前施工中，預計 111 年 10 月 31 日完工。

2.文化中心場館升級整建計畫

文化中心四至七樓的「文化中心場館升級整建計畫」，總核定經費 1 億 500 萬元，共分三案執行，三案皆已完工，分別說明如下：

- (1)演藝廳暨周邊整體裝修工程：111 年 7 月 20 日完工。
- (2)義一路貨梯更新工程：111 年 1 月 22 日完工。

(3)演藝廳座椅暨周邊傢俱安裝：演藝廳內座椅，111年1月17日竣工；大廳櫃台及傢俱，已於111年8月底裝設完成。



圖 137：文化中心演藝廳暨周邊整體裝修工程已於111年7月完工



圖 138：文化中心演藝廳暨周邊整體裝修工程已於111年7月完工

二、強化市圖書館軟硬體建設

1.市圖書館整建

為改善文化中心圖書館空間，市府向中央爭取圖書館整建計畫經費，教育部核定補助改建經費 8,500 萬元，執行期程為 111 年至 113 年，刻正辦理規劃設計作業。

完工後，將能改善圖書館空間動線，並提升閱讀空間舒適性與服務機能，打造成新世代圖書館，成為本市重要知識中心。

2.區圖改隸文化局，建立總分館體制

文化局自 109 年起向教育部爭取 3 年共 695 萬元之補助經費，推動「健全公共圖書館營運體制及組織體系發展」計畫，透過專業委員的輔導，全面健全圖書館體制的發展，同時，將原隸屬各區公所的區圖書館，逐步納回文化局圖書館統籌，進行整合性管理，增編購書預算 300 萬以及數位設備、延長開放時間所需人力等相關費用，提供專業化、更優質的閱讀環境給市民，達到與直轄市相同的總分館體制。

目前已完成行政體制改隸，為強化圖書館間連結，每月辦理業務會報以及專業培訓課程，同時逐步汰舊更新各區圖書館硬體設施，以提升各公共圖書館服務品質。

3.充實圖書館藏

圖書館藏充實部分，市府 8 年來總計投入 4,377 萬元經費採購約 17 萬 5,000 冊新書，並透過募書活動充實館藏，8 年已募得近 8 萬冊贈書，使本市平均每人擁書量從 104 年的 1.22 冊增加至 111 年的 2.04 冊，打造基隆成為書香城市。

三、大力推廣閱讀，本市首獲台灣閱讀績優城市

為提升本市閱讀力，市府陸續推動各項便民措施，透過廣設閱讀服務據點，如自助借還書站、社區服務站、學校社區共讀站等，讓民眾借閱不受空間限制；而 111 年起推出信義區、安樂區、七堵區百福圖書館等 3 館夜間延長開放服務，則增加圖書館服務時間，排除時間的限制。

此外，市府亦積極推動分齡分眾的閱讀推廣活動，包含新生兒閱讀禮袋、小小館員體驗、學校班訪、新住民、樂齡等多元族群閱讀推廣活動，打造從出生到老年的閱讀服務。

在 110 年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告中，本市首度獲得「110 年台灣閱讀績優城市」獎項。而閱讀力指標在全國各縣市中，「每人持證比例」高達 90%、「每人到館次數」3.2 次，分別榮獲第一及第二名，足見閱讀推廣成效卓著。

四、打造基隆成為藝術之都

1. 《潮藝術》打造專屬基隆特色的藝術品牌

市府自 104 年起舉辦《潮藝術》，從海洋關懷的角度出發，將環境、藝術與在地文化三者重新構思，邀集國內外藝術家、在地居民、職人一起梳理基隆這座城市的點滴，將海的元素轉譯為藝術形式，透過各類型藝術作品呈現基隆城市的集體記憶，路樹、漁船、街景、建物都成為藝術家的畫布，讓整座城市變成一座展演館。

8 年來，《潮藝術》吸引台灣、法國、荷蘭、墨西哥、日本、菲律賓等，超過 10 位以上國際藝術家進駐基隆進行藝術創作，近百件展出作品，吸引國內外遊客共計約百萬人次前來參觀，成功建立專屬基隆特色的藝術節慶。

藉由每一年潮藝術結合地方發展藝術祭的型態，持續累積品牌知名度，透過每年與地方產業、民眾合作，成為各種可能性的延伸，持續穩固潮藝術的品牌，讓潮藝術在未來能夠成為最能代表台灣海洋文化的藝術祭，有如日本瀨戶內海藝術祭，讓潮藝術由在地走向國際，讓藝術精神得以成為一種永續。




圖 139：基隆潮藝術作品

2. 「向大師致敬」系列活動

市府自 104 年起辦理「向大師致敬」重量級藝文活動，藉由邀請出生於基隆的傑出藝術工作者，擔當主題藝術家，與文化局齊力策辦活動及演出內容，並且讓民眾可以近距離與大師交流對談，向大師學習，提升民眾藝文涵養。

歷年來，市府已策辦馬水龍、林麗珍、葉俊麟、廖瓊枝、林秀偉、吳天章、周美玲以及 V.K 克(許勤毅)等大師，分享音樂、舞蹈、電影、傳統戲曲、展覽等面向之藝文創作，共計吸引上萬人次參與。



圖 140：舊情綿綿-葉俊麟懷念音樂
音樂劇



圖 141：廖瓊枝的歌仔戲歲月特展及
璀璨牡丹音樂會

3. 「藝術進區」將藝術帶入社區

105 年起，市府開始將藝術帶入社區，藉由邀請藝文團體直接進入社區表演，讓民眾在社區內就能觀賞到藝文活動，與藝文團體進行近距離的接觸與面對面互動。

7 年來，市府邀請到基隆交響管樂團、慾望劇團、綻放中東肚皮舞團、紙風車劇團、九天民俗技藝團、臺灣特技團、豆子劇團、蘋果劇團及福爾摩沙馬戲團等知名藝文團體，深入基隆各行政區，進行兒童劇、特技雜耍、陣頭藝術、當代馬戲等演出，共計吸引數萬人次參與，帶給市民朋友美好的記憶。



圖 142：紙風車劇團藝文表演



圖 143：台灣特技團表演特技雜耍

4. 藝術教育與文化平權

為了落實文化平權，讓所有的孩子們都有機會可以接觸藝術，市府自 106 年起辦理大班幼兒劇場體驗，由幼兒園帶領大班幼兒進入演藝廳欣賞兒童劇，讓藝術向下紮根，提升兒童藝文素養。6 年來，市府帶領孩子前往文化中心演藝廳、國父紀念館欣賞演出，共計有 1 萬 5,000 名幼兒受益。

而學齡階段的孩子，市府自 109 年起，帶領國小四年級學生進劇場體驗，共計有 2,000 位學生受益；此外，也透過「基隆市所屬學校改善音樂樂器及設備計畫」補助學校更新或增購樂器，110、111 年市府共計補助 34 所學校、1,008 萬 5,086 元經費，讓孩子多元探索，啟發孩子的藝術涵養。



圖 144：大班幼兒劇場體驗落實文化平權 圖 145：大班幼兒劇場體驗落實文化平權

五、黃蠟石文化館持續深耕地理環境教育

暖暖擁有世界級的壺穴景觀，以及獨步全台的基隆黃蠟石，經文化局花一年左右時間整修暖暖區過港路的舊員工宿舍，作為黃蠟石文化館，該館於 108 年 7 月 1 日開館迄今，已辦理基隆河流域環境教育導覽人員培訓、黃蠟石文化館導覽志工培訓、黃蠟石文化館小小導覽人員培訓等課程，各年度辦理之展覽成果如下表所示。

表 26：黃蠟石文化館歷年辦展成果

年度	內容	累計參觀人次
109	雅石協會會員聯展、森林與水地方資源特展 I、II 以及中元節「好祭好散」專題展等 4 檔次；暖暖區人文教育 10 場次等。	7,600 人次
110	1. 第一檔展覽由基隆雅石藝術學會展出「基隆黃蠟石賞石玩石研究特展」。 2. 第二檔次由社大雞籠學社團規劃展出「葉俊麟音樂創作」暨二檔次「葉俊麟音樂創作暨生活文物展」，展出期間為 110 年 4 月 8 日至 12 月 28 日止，本次進行展示的除了精彩手稿真跡與生活文物之外，現場也展出葉俊麟大師生前所使用的鋼琴，開幕當日現場熱鬧非凡。	5,330 人次
111	1. 第一檔展覽由基隆雅石藝術學會展出「上善喜緣養德潤聲」雅石展，展出期間 1-3 月，參觀人次 1,300 人次。 2. 第二檔次展出「被白浪淹沒的台灣作家」，展出期間 4-7 月，參觀人數 2,500 人次。 3. 第三檔次由文化局辦理中元祭百年傳承藝師展「那些人、那些事-鷄籠中元祭必須知道的細節」特展，展期自 8 月 6 日至 9 月 30 日，本檔展覽已於 8 月 6 日上午辦理開幕茶會，計有約 200 人次參與。	4,000 人次 (截至 111 年 8 月底)

六、主普壇耐震補強暨修復工程於 110 年 1 月完工

主普壇由於建物年代已久遠，出現斑駁剝落的狀況，市府於 104 年辦理「基隆市主普壇屋簷周邊混凝土及屋瓦掉落修復工程」，工程總經費為 273 萬餘元。後因主普壇壇體屋瓦掉落情形仍然嚴重且氯離子係數始終偏高，基於安全考量，於 107 年向文化部文化資產局爭取補助，加上地方配合款，總經費達 2,200 萬餘元，辦理「主普壇耐震補強暨修復工程」，於 109 年 4 月 9 日開工，並於 110 年 1 月 15 日竣工。



圖 146：主普壇耐震補強暨修復工程於 110 年 1 月完工

七、老屋保存再生計畫至今年 4 月共 10 件獲文化部核定通過

文化部補助私有老建築保存再生計畫獲本市民眾響應，截至 111 年 8 月，本市共有 10 件獲文化部核定通過，包括中正區的「海之丘」、「自立書局再生計畫」、「哨船頭文創小巷」、「正濱海門」、「憶起義種町『飾』第二期」等 5 案，仁愛區的「梅英居」及「草店尾老屋保存再生計畫」、「林開郡宅保存再生計畫」、「魚日二手書店」等 4 案，信義區「基隆散策。小北投」案。

除「憶起義種町『飾』第二期」及「魚日二手書店」為文化經營類之租金補助計畫外，均屬建物整修類計畫，個案進度說明如下：

1. 「梅英居」、「哨船頭」、「草店尾」三案均已整修完成，待成果報告書修正完妥後即可報文化部結案。
2. 「海之丘」(55%)、「正濱海門」(85%)案工程進度均已逾 50%，並通過期中報告審查。
3. 「自立書店」(15%)正在進行初步清理作業。

4. 「小北投」及「林開郡洋樓案」尚屬預算書圖規畫設計階段，預計今年底完成相關規劃設計。

其中，「林開郡宅保存再生計畫」被列為文化部私有老建築保存再生的旗艦級計畫，109年9月文化部同意補助修復經費1,500萬元，進行洋宅的建築特色保存，留下更多的歷史風貌。

110年6月由林家後代人與本市文化局簽署合作意向書，借用洋樓一樓空間，改善騎樓空間照明，提升公共安全及市容景觀。同時，配合城市博覽會，以「光照港灣—林開郡洋樓亮起來！」為主題，打開洋樓大門，運用一樓空間展示，並且以安全性與公共性為核心價值，整理騎樓空間、點亮外牆，希望引起觀展者對於洋樓的重新認識，對洋樓的未來給予討論與祝福。

110年12月所有權人委外辦理調查研究計畫，111年4月底研究團隊進場進行建物測量調查等作業，調查計畫需時約18個月，後續再進行施工修復，修復完成後，將能再現百年洋樓的歷史風華。

透過老屋的建物修繕補助，希望讓昔日老屋光環再次被周圍居民看到，並藉由屋主理念讓修繕後的老屋可以變成舊街區的新生點。

表 27：私有老建築保存再生計畫

文化部審查通過案件		文化部核定時間	申請類別	核定
1	中正區中正路 363 號 海之丘	107/11/30 核定 110/1/4 簽約核備	建物整修類	核定比例 50% 總金額:10,698,942 補助額度:5,349,471
2	中正區義二路 46 號 自立書局再生計畫	108/6/6 核定 109/12/18 簽約核備	建物整修類	核定比例 50% 總金額:7,159,750 補助額度:3,579,875
3	仁愛區南榮路 243 巷 16 號 梅英居	108/6/6 核定 109/2/25 簽約核備	建物整修類	核定比例 40% 總金額:3,147,301 補助額度:1,258,920
4	中正區信二路 286 巷 8 號 1-2 樓 哨船頭文創小巷	108/7/19 核定 109/12/11 簽約核備	建物整修類	核定比例 50% 總金額:3,300,000 補助額度:1,650,000
5	中正區正濱路 96 號 正濱海門	108/9/6 核定 109/8/3 簽約核備	建物整修類	核定比例 45% 總金額:2,885,738 補助額度:1,298,582
6	仁愛區愛二路 54 巷 2-1 號 草店尾老屋保存再生計畫	108/11/25 核定 109/6/10 簽約核備	建物整修類	核定比例 45% 總金額:1,800,978 補助額度:810,440
7	中正區義二路 124 號 憶起義種町「飾」	109/1/16 核定 109/3/24 簽約核備	文化經營類	租金：6,000/月 共 12 期合計 72,000
8	基隆市仁愛區愛一路 45 號 林開郡宅保存再生計畫	109/11/5 核定 110/12/30 簽約核備	建物整修類	核定比例 80% 總金額 15,000,000 補助額度 12,000,000
9	基隆市信義區義六路 67 巷 1 號 小北投。基隆散策	110/12/3 核定 111/4/14 簽約核備	建物整修類	核定比例 34.8% 總金額 4,892,071 補助額度 1,700,800
10	基隆市仁愛區孝二路 96 號 新店路上的舊書店 魚日二手書店老屋再生計畫	111/4/25 核定	文化經營類	租金：10,000/月 共 12 期合計 120,000
總補助金額				27,840,088



圖 147：私有老建築保存再生計畫—整修完成之「梅英居」

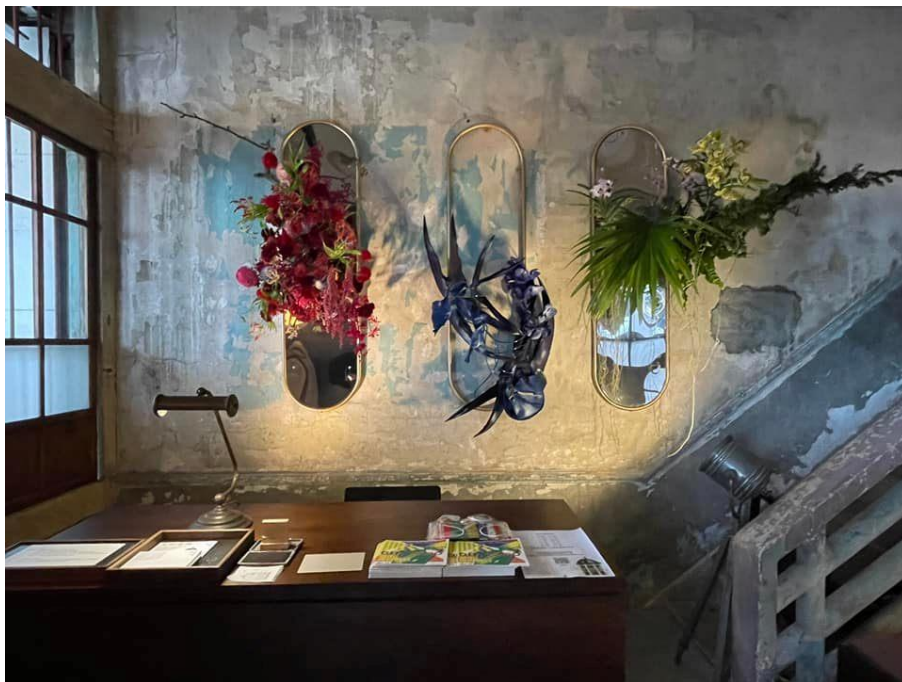


圖 148：城市博覽會期間以「光照港灣—林開郡洋樓亮起來！」為主題，打開洋樓大門



圖 149：城市博覽會期間林開郡洋樓一樓展出歷史文物

八、「高遠新村港務局局長官舍」修復工程預計 112 年 12 月完工

位於中山區歷史建築「高遠新村港務局局長官舍」，管理單位基隆港務分公司自籌 5,600 萬元經費，將修復港務局長官舍及周邊建物，並整頓周邊景觀，串聯至下方中山三路 103 巷的歷史建築「建港紀念碑」。

本工程已於 110 年 5 月開工，工期 540 個工作天，目前港公司進行新增工作鋼棚架、新增隱蔽處發現之工項及新增駁坎清潔等工作，預計 112 年 12 月底完工。

玖、打造優質環境

一、優化市容，打造美麗清朗的生活空間

右昌
上任後，為了解決市容狹窄陰暗、老舊髒亂的問題，逐年推動各項市政建設，逐步將本市打造成美麗清朗、寬敞舒適的生活空間，完成項目分述如下：

1.海洋廣場空間活化改善工程

為改善海洋廣場木板破損嚴重的問題，投入經費 3,850 萬元，本工程選用硬度高的太平洋鐵木，施工時以雷射定位讓木材間幾乎無空隙，並調整 KEELUNG 景觀造型燈飾之位置，讓中間腹地變大。工程於 105 年完工，提供民眾更安全舒適的水岸休閒空間。本工程並榮獲 2018「國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎。



圖 150：海洋廣場空間活化改善工程

2.東岸複合式商場

東岸廣場原為 2 層樓露天建築，過去長期作為停車場使用，空間陰暗成為治安死角。市府推動促參案件引進民間業者，廠商共投入經費約 3.4 億元，將東岸廣場改造為 4 層樓東岸複合式商場，結合商場、空中花園及運動跑道，於 107 年完工啟用，提供購物、餐飲、運動、休閒等功能，成為嶄新公共空間，並榮獲 2018「金擘獎」、2019「台灣建築獎首獎」。



圖 151：東岸複合式商場

3.田寮河畔公園闢建

延宕數十年的田寮河畔老舊違章建築拆遷戶問題，在市府及相關單位積極斡旋及協調下，於 107 年完成拆遷作業，並完成田寮河畔公園闢建，投入經費 1,300 萬元，將田寮河岸打造成擁有河岸綠地的水岸廊帶公園，營造宜居水岸生活環境。



圖 152：田寮河畔公園闢建

4.成功國小西側 29 號橋下環境美化與空間整建工程

為改善 29 號橋下空間髒亂、陰暗之情形，本府投入經費 1,435 萬元改善，工程採大量綠化為基底，並留設大尺度行人穿越動線及開放空間，形塑良好人行空間及優質學童通學步道，也搭配運動設施空間及夜間照明，讓原本陰暗的場地變得更加開闊及寬敞，大幅提升當地生活品質。本工程於 107 年完工啟用，並榮獲「2019 第七屆台灣景觀大獎」公園綠地公共開放空間類優質獎。



圖 153：成功國小西側 29 號橋下環境美化與空間整建工程

5.正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫

正濱漁港曾是繁榮的漁港，隨著近代漁業發展，漁船噸位逐漸增加，漁港水位不堪負荷而逐漸沒落。市府推動正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫，並邀請專家與當地居民共同合作努力，為老舊港灣塗上繽紛色彩，於 107 年完成，有「台版威尼斯」的美譽，成為網路打卡熱點，並榮獲 2018 台灣景觀大賞社區營造/地方創生類優質獎、2019「國際景觀建築師協會景觀大賞」。



圖 154：正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫

6.社區規劃師(建築師)駐地輔導計畫

自 104 年起至 110 年，本府推動社區規劃師(建築師)駐地輔導，總計投入經費 5,007 萬元，提升社區參與能量並美化社區環境，總計完成 108 個空間改造點。

7.建築物立面清整改善

本市港區為國際之門戶，為提升周邊建築物立面整潔，投入經費 375 萬元，針對忠一路、孝一路、孝四路、港西街及中山一、二路建築物立面清整，協助建物所有人改善雨遮、外牆飾材剝落與清潔以及廣告物之合法化，讓旅客、市民漫步於國門廣場時，能有整潔明亮之建物環境及景觀。

8. 架空纜線及台電桿線下地

本市自 104 年起至 109 年，架空纜線清整數量總計達 144.69 公噸，總計投入約 694 萬元進行改善，108 年及 109 年因主要及次要幹道的架空纜線已清整完畢，需清理數量大幅減少，成效市民有目共睹。為進一步深化成果，自 108 起至 111 年，一併推動台電桿線下地，清除近 6.542 公里、共計 132 支電桿，還給市民美麗寬闊的天際線。

二、形塑港城特色、訂定景觀自治條例

基隆市港區周邊近年來推動了許多國家級重大建設，包含國門廣場、東岸轉角廣場(旭川河口廣場)、東岸郵輪廣場、基隆塔等工程，並結合郵輪產業，形成國家門戶，使基隆成為北臺灣海洋國門之入口門面。為維護及塑造市港優質環境，市府也推動「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，以國門廣場周邊地區為劃設範圍，於市區中優先作為城市景觀計畫示範區域，並於 111 年 2 月 25 日公布施行。

為進一步實踐本自治條例的城市景觀計畫，本府已爭取編列基隆市都市發展與都市更新基金預算(500 萬元)辦理，未來將與相關部會、地方凝聚發展共識後，訂定出適地、適

性之城市景觀計畫，導入相關獎補助機制並強化市民參與景觀事務與文化能量。

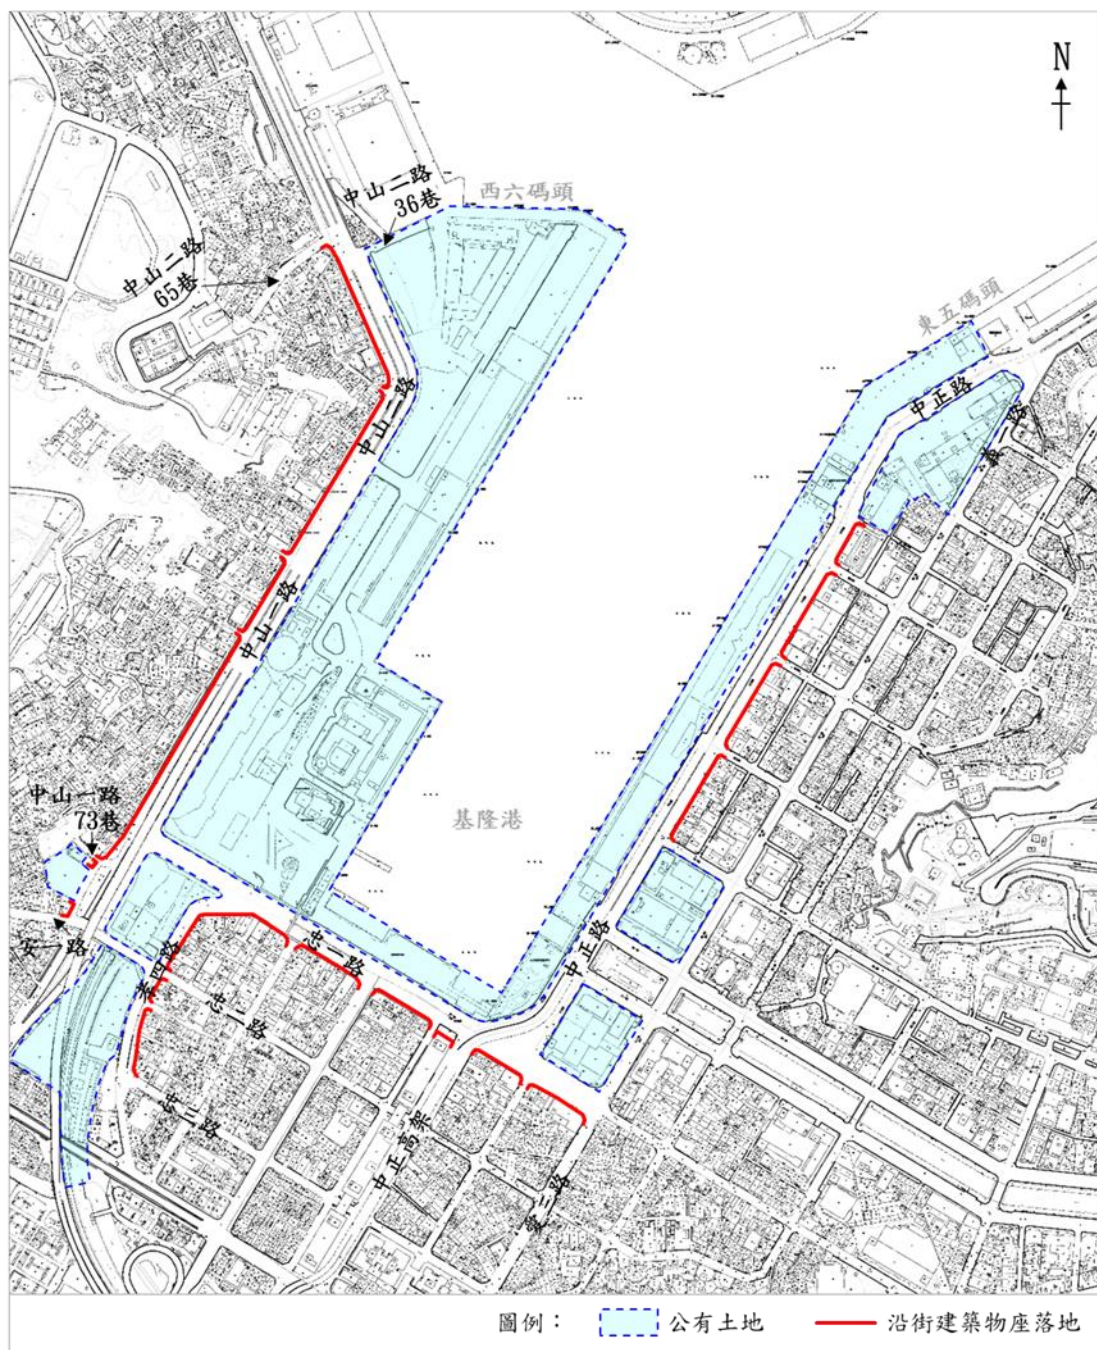


圖 155：「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，以國門廣場周邊地區為劃設範圍

三、8 年投入超過 4.7 億元進行全市公園綠地改造

為提供市民更優質的休閒遊憩空間，本府自 104 年起逐步推動本市公園綠地改造，截至 111 年 8 月 24 日止，總計已投入 4 億 7,332 萬元進行改造，各公園綠地辦理情形如下表所示：

表 28：104 年-111 年本市各區公園綠地改造計畫一覽表

行政區	計畫名稱	執行年度	計畫經費(萬元)	辦理進度
七堵	永安公園景觀風貌營造計畫	104-105	427	105 年 4 月 26 日完工
	六堵河濱公園景觀縫合計畫	106	550	106 年 10 月 27 日完工
	友蚋生態園區環境改造計畫	106-107	366	107 年 1 月 8 日完工
	正光公園及周遭環境整合計畫	107-108	550	108 年 9 月 10 日完工
	福一街公園暨周邊環境縫合計畫	110-111	600	111 年 4 月 22 日完工
	百福公園改造計畫工程委託規劃設計	111	600	刻正辦理二期工程細部設計。
	百福公園改造計畫工程	111	6,714	第一期工程已於 111 年 4 月 28 日開工。 第二期工程經費內政部營建署於 111 年 4 月 11 日核定補助 4,800 萬元，市府自籌 914 萬餘元，經費總計 5,714 萬餘元。
泰安公園環境改造計畫委託規劃設計	111	125	刻正辦理規劃設計中。	
中山	通明里親子公園	106-107	357	107 年 1 月完工
	仁正里天空之樹球場	106-107	250	107 年 2 月完工
	居仁里閒置空地改造親子公園	107-108	400	108 年 1 月 11 日完工
	基隆港西岸 KEELUNG 地標至九華山步道串聯整修工程	108	500	108 年 11 月 8 日完工
	白米甕、球仔山、仙洞巖、佛手洞步道及周遭環境整修工程(第一期)	109	1,940	109 年 10 月 5 日完工
	西岸人行路廊景觀空間環境改善工程	110-111	810	111 年 2 月 10 日開工， 預訂 111 年 9 月 14 日完工。
中正	改善要塞司令部人行空間、增加綠色廊帶	106-107	842	107 年 8 月 21 日完工
	新中正區公所至要塞司令部串聯計畫	107-108	1,120	108 年 12 月 18 日完工
	希望之丘親子遊戲空間更新工程	107-111	6,500	111 年 5 月 31 日開工， 預計 112 年 2 月底前完

行政區	計畫名稱	執行年度	計畫經費(萬元)	辦理進度
				工。
仁愛	成功陸橋下環境改善	104-107	685	107年8月16日完工
	光一路多功能休閒運動場	105-107	1,400	107年2月14日完工
	基隆市山海散步道系統建置工程(紅淡山步道及姜子寮山步道)	108	875	108年3月4日完工
安樂	鶯歌里親子公園	106	48	106年10月完工
	安樂三期社區公園周邊環境改善計畫	107-109	1,725	109年6月29日完工
	安樂區內寮里民活動中心周邊公園改善	109	314	109年12月完工
	基隆市大武崙森林運動公園第一期工程	109-110	2,500	110年4月12日完工
	基隆市大武崙森林運動公園第二期工程(規劃設計)	110-111	869	刻正進行規劃設計
信義	田寮河畔公園關建計畫	103-107	1,300	107年8月21日完工
	信義區孝德里鄰里公園環境景觀營造計畫	106-107	350	107年3月完工
	信義區東安里/孝德里自然公園環境景觀營造計畫	107-108	700	108年6月30日完工
	東光公園關建工程	111	130	刻正辦理規劃設計業務。
暖暖	暖暖親水公園	106	500	106年6月30日完工
	暖暖區碗內15號公園籃球場及周邊改善工程	105-107	1,600	107年5月12日完工
	暖暖區暖暖街溪探索廊帶整建工程	107-108	700	108年1月31日完工
	暖暖區過港兒童公園整建工程	107-108	120	108年4月底完工
	暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程	107-110	2,277	110年6月4日完工
	龍門谷步道公園(兼候車空間)關建工程	108-109	480	109年1月18日完工
	基隆市生態教育中心園區活躍計畫-生態教育池及園區生態步道景觀工程(第一期)	108	1,200	108年9月24日完工
	基隆市生態教育中心園區活躍計畫-暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)	108-110	2,309	搶災：110年2月26日完工。 溫室：110年12月23日完工。
	暖暖區碗安籃球場地坪改善工程	110	126	110年12月10日完工
	碗內里民活動中心旁空地整建工程	111	242	111年3月1日完工
	暖暖運動公園附屬各運動場地地坪及照明設施整修工程	110-111	1,031	111年6月6日完工
暖東峽谷環山遊憩步道改善工程	111	3,200	111年8月20日完工	
經費總計			4億7,332萬元	

四、基隆市大武崙森林運動公園

市府分三期工程打造大武崙森林運動公園，占地約 45.13 公頃，鄰近人口稠密的安樂區，交通便利，除規劃大武崙山森林道、新山水庫綠地、大武崙溪水岸公園，還包含多功能場、戶外越野單車、滑板區等極限運動設施、槌球場、親子活動區，以改善本市體育場所不足的問題，讓市民有更多地方運動，身心健康發展。

本案目前已完成第一期工程，全部完工後將有兒童遊戲場、簡易極限運動設施練習場、市立棒球場、主題公園與市民廣場、自行車越野場、極限運動場區、垂降冒險遊憩區及景觀吊橋、室內綜合體育館等場地設施，全區景觀規劃配置如下圖所示。



圖 156：大武崙森林運動公園全區景觀規劃配置圖

1. 第一期工程

第一期工程總經費 2,500 萬元，教育部體育署補助 1,750 萬元，市府自籌 750 萬元，工程已於 110 年 4 月 12 日完工，完工項目包括兒童遊戲場、籃球場及簡易極限運動公園。



圖 157：基隆市大武崙森林運動公園第一期工程完工啟用

2. 第二期工程

第二期規劃設計部分，市府已自籌經費 869 萬 7,623 元，目前基本設計階段已完成，整體規劃設計方向將依民眾參與工作坊及專家學者圓桌論壇進行設計。工程經費預估約 3 億元，並積極向中央申請相關補助。

第二期工程部分，施工項目將包含三大類型，有全齡化之入口廣場、主題公園(共融性遊戲場、挑戰體驗型遊戲場)及休閒健走步道、青少年為主之探索冒險場、定向越野場地及生態保護、環境教育等學習場域。為提高場區服務性及使用

者安全性，配合活動區域增加休憩、廁所等服務設施，以及照明、監控、廣播系統等安全設施。

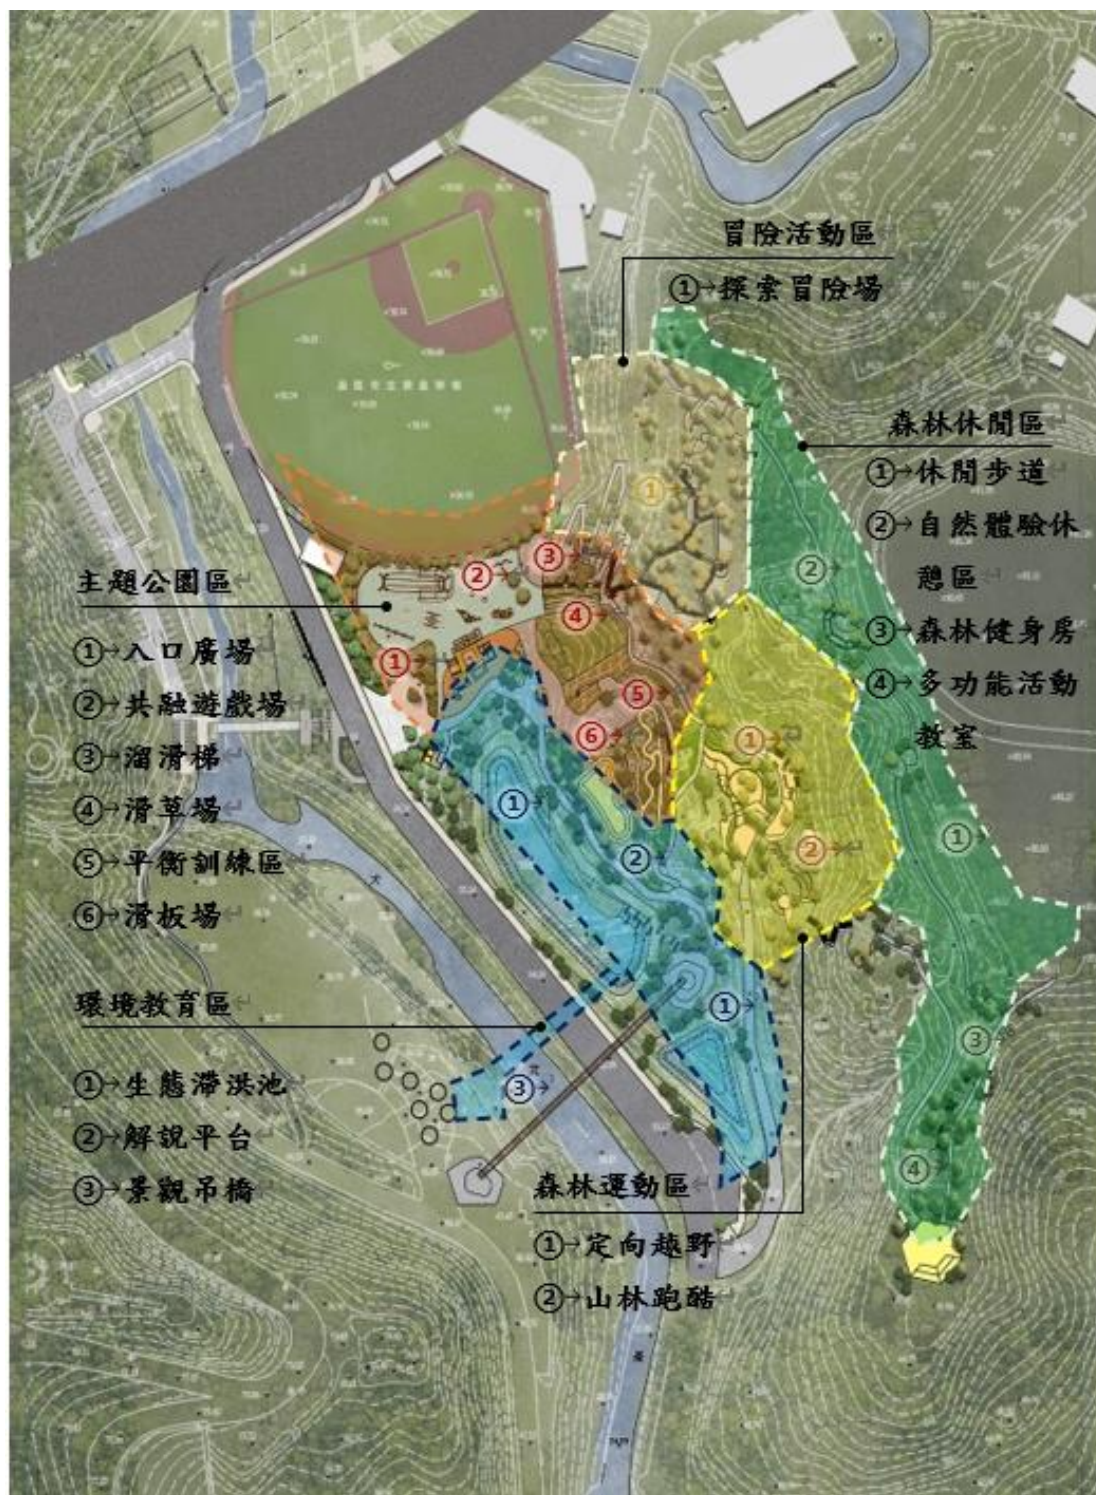


圖 158：大武崙森林運動公園二期規劃設計圖

五、暖暖運動公園遊戲場於今年 6 月 21 日落成啟用

「暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程」總計投入 2,277 萬 7,040 元經費(教育部補助 1,120 萬元，市府自籌 1,157 萬 7,040 元)，已於 110 年 6 月 4 日完工。環場步道工程部分，於 110 年 2 月 25 日已開放民眾使用；遊戲場工程部分，為了提升遊樂項目的豐富度及安全性，市府持續進行遊樂設施設置工程，亦於 111 年 6 月 21 日正式落成啟用。

市府為了讓更多年齡層可以使用遊戲場，特別與廠商調整溜滑梯及相關設施，完工後，現在除了有 2-12 歲可使用的溜滑梯、鳥巢盪鞦韆，5-12 歲可以挑戰的水平吊梯(Monkey Bar)，還有 13 歲以上可以使用的冒險區繩索攀爬網，長青族群則可以在周邊的體健設施健身，改造後的遊戲場更符合全齡、共融精神。

此外，「暖暖運動公園附屬各運動場地地坪及照明設施整修工程」共計投入 1,031 萬 4,525 元經費(教育部補助 825 萬元，市府自籌 206 萬 4,525 元)，也已於 111 年 6 月 6 日完工。



圖 159：暖暖運動公園遊戲場於 111 年 6 月 21 日落成啟用



圖 160：暖暖運動公園遊戲場於 111 年 6 月 21 日落成啟用

六、暖東峽谷環山遊憩步道改善工程 111 年 8 月 20 日 完工

為改善暖東峽谷停車場、環山步道、廣場、休憩涼亭及座椅等設施，更新全區導覽指標系統及周邊植栽景觀綠美化，本府積極向中央爭取工程經費，獲交通部觀光局補助 2,128 萬元，本府自籌 1,072 萬元，經費總計 3,200 萬元，以建置友善的觀光遊憩服務設施及提升旅遊環境品質及安全。本工程於 110 年 12 月 20 日開工，111 年 8 月 20 日竣工。



圖 161：暖東峽谷環山遊憩步道改善工程



圖 162：暖東峽谷環山遊憩步道改善工程

七、西岸高架橋下空間改造工程預訂今年 9 月中旬完工

位於中山區西岸聯外高架橋下的「西岸人行路廊景觀空間環境改善工程」，經本府於 110 年向內政部營建署爭取經費獲補助 400 萬元，另向台電公司電協會爭取專案補助 350 萬元，中山區公所自籌配合款 60 萬元，進行規劃設計改善空間環境。

本案基地面積 1,803 平方公尺，經協調，台肥公司同意將圍牆拆除，台電公司則將現有人行道上 5 支電線桿拆除改為地下供電，讓人行道寬度增加為 2.2 公尺，打造人本友善

的通行環境。並規劃設置地景滑梯、造型鞦韆、翹翹板、體健設施、景觀燈具、休閒步道、座椅、植栽美化等，提供市民優質的休閒活動空間。

工程已於 111 年 2 月 10 日動工，截至 111 年 8 月 20 日止，工程進度 88%，預訂 111 年 9 月 14 日完工。



圖 163：「西岸人行路廊景觀空間環境改善工程」完工示意圖

八、基隆港市水環境改善計畫

為改善基隆港及本市主要河川水質，並提供市民優質的水岸休憩空間，市府向行政院爭取前瞻基礎建設計畫「全國水環境改善計畫」經費，共計 4 億 1,770 萬 9,000 元，各計畫執行情形詳如下表。

表 29：基隆港市水環境改善計畫執行情形

項次	工程名稱	經費	水淨場每日汙水處理量	執行進度
1	旭川河水質改善現地處理工程	8,889 萬元	5,000CMD	111 年 3 月 4 日申報竣工。
2	旭川河沉砂池二期水環境改善工程	5,000 萬元		截至 111 年 8 月 20 日止，工程進度達 97.63%，預計 111 年底前完工。
3	田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程	1 億元	3,400CMD	截至 111 年 8 月 20 日止，工程進度達 97.66%，目前辦理第三次變更設計，預計 111 年底前完工。
4	田寮河二期水環境改善規畫設計計畫	600 萬元		辦理細部設計作業，待景觀工程發包。
5	南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程	1 億 5,281 萬 9,000 元	2,700CMD	截至 111 年 8 月 20 日止，工程進度達 51.08%，預計 112 年 2 月完工。
6	西定河水環境改善計畫規劃設計	2,000 萬元	6,000CMD+ 5,000CMD	110 年 8 月 31 日完成細部設計定案。
合計		4 億 1,770 萬 9,000 元		

未來，本市主要河川水環境改善工程，也將配合全市第三期污水下水道工程一併提升河川水質，屆時將可大幅改善基隆水域整體環境。



圖 164：旭川河水質改善現地處理工程



圖 165：田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程



圖 166：南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程



圖 167：西定河水環境改善計畫細部設計圖

九、守護海洋資源，發展永續海洋

1. 劃設望海巷潮境海灣資源保育區

市府為了保育海洋生態及發展永續海洋，於 105 年 5 月劃設望海巷潮境海灣資源保育區，劃設面積 15 公頃。106 年起由本市漁民自發性組成海洋巡守隊，若發現違規事項立即通報市府與海巡署前往查緝，110 年海洋巡守隊巡護共計 90 航次。

107 年起市府招募本市在地大專院校學生及居民，於保育區觀光人潮熱點時間與區域，進行保育區違規巡查及保育宣導，截至 111 年 8 月 31 日止，共巡護 621 人次，勸導觸及 1,505 人次。

6 年多來，透過政府與民間合作，保育區海底生態已逐漸恢復生機。



圖 168：潮境海灣資源保育區海底恢復蓬勃生機



圖 169：潮境海灣資源保育區海底恢復蓬勃生機

2.輔導漁民轉型為友善漁法

本府自 106 年起輔導漁民轉型為友善漁法(如一支釣及曳繩釣)，至 110 年底，共計轉型 101 艘，轉型率達 77.1%(原 131 艘)，過戶買賣、無從事刺網作業或無出港作業之漁船 15 艘，本市目前實際經營刺網的漁船僅剩 15 艘，111 年已有 5 艘漁船有意參與轉型作業，截至 111 年 8 月 31 日止，已有 4 艘完成漁業執照更變，並已核發 3 艘刺網漁船(1 主營、2 兼營)轉型輔導金。

3.島礁磯釣證管理

配合中央向海致敬政策，市府推動友善釣魚活動，以「積極開放、有效管理」及「使用者付費」立場，管理休閒垂釣，兼顧環境資源永續。106 年 2 月，市府率全國之先首創島礁磯釣證管理收費辦法，一年期之磯釣證收費 300 元，三年期收費 750 元。

截至 111 年 8 月止，一年證辦理 1,416 張，三年證 9,180 張，磯釣證申辦累計 10,596 張，合計收入約 730 萬元及加計業者規費新台幣約 402 萬，共計收入約 1,132 萬元，收費部分扣除行政及管理費，全數用於島礁環境管理與海洋資源復

育，希望透過使用者付費原則，宣傳海洋保育觀念及強化海洋復育履行責任，使海洋資源得以永續利用。

4.於八斗子岸置中心建置北臺灣最友善的鯨豚救援基地

過去北海岸、東北角海岸發現擱淺鯨豚，都得送往遠在苗栗的崎頂鯨豚救護中心，然而鯨豚常在協調運送的過程中就失去生命跡象了。為了解決這樣的問題，市府自 109 年起提供八斗子岸置中心協助海洋委員會之海保救援網(MARN)作為北部地區臨時救傷中心及志工培訓基地，為近年來北部接二連三發生的鯨豚擱淺事件，提供最佳的救援場域。市府積極配合 MARN 進行場地協調、救援物資調配及設施整備等相關救傷工作，截至 111 年 8 月底止，八斗子岸置中心已收容過 7 隻活體擱淺之鯨豚，並成功野放 5 隻鯨豚重回大海的懷抱。

十、培訓熱心山友守護基隆山林

有鑑於本市山林間違法獵具、流浪犬貓危害野生動物及違法墾伐山坡地事件不斷發生，本府於 111 年編列 35 萬元經費辦理「山林守衛隊訓練及活動委託案」，進行山林守衛隊志工組織訓練。

經公開招標，111 年 1 月 13 日起委由社團法人自然生態保育協會辦理。本案訓練課程之教具手冊已彙編印製完畢，並已於 6 月 25 日及 7 月 2 日至七堵區瑪西里辦理 2 場次訓練課程，後續將與基隆社區大學洽談合作訓練，預計於 9 月 30 日前完成 6 場次訓練，預計核發 180 張結訓證書並辦理 1 場次清山活動。

市府期結合民間志工力量與警政、民政系統合作，積極辦理山區捕獸鉗、山豬吊及鳥網等違法獵具清除，並嚇阻違法濫墾濫伐行為，維護本市山林的自然生態與生物多樣性。

十一、本市 PM_{2.5} 濃度為西半部最佳縣市，且已優於美國制定標準值

市府 8 年來努力改善本市空氣品質，逐步推動各項策略，說明如下：

1. **電力業管制：**要求協和發電廠使用低含硫量燃料油與增加污染防制設備。
2. **基隆港區管制：**率全國之先自 105 年起執行船舶黑煙稽查，於 109 年協調中油於基隆港僅供售含硫量 0.5% 以下之低硫船用油品，並於 111 年基隆港劃設空氣品質維護區，管制高污染車輛行駛於區域內。
3. **移動源管制：**推動機車汰舊加碼補助及 1 至 3 期老舊柴車汰舊作業，並推行移動式定檢服務，有效提高車輛標章率。
4. **逸散污染管制：**以推行環保祭祀紙錢集中焚燒與以善代金等方式。
5. **營建工程管制：**以勤查嚴罰管制，提升符合率，減少污染發生。
6. **餐飲業油煙管制：**透過輔導裝設油煙防制設備及推動環保夜市等等，有效降低污染排放。

本市 PM_{2.5} 濃度自 103 年平均 18.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，下降到 110 年平均 11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善達 39.23%，已連續 5 年低於臺灣空氣品質標準值 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，為西半部最佳縣市，甚至也已優於美國標準值 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。下個階段，市府將以 2025 年達到世界衛生組織(WHO)第四階段過渡期目標(IT-4)年平均 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 為目標努力，以守護民眾生活品質。

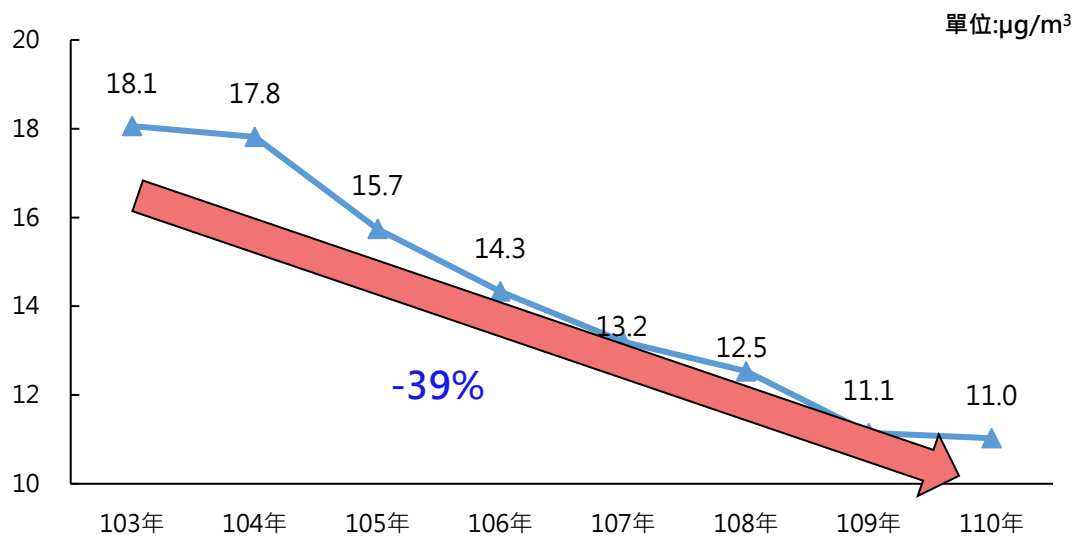


圖 170：103 年至 110 年基隆市 PM_{2.5} 濃度下降趨勢圖

十二、市政大樓興建工程案

市政大樓興建工程專案管理技術服務案(PCM)預算5,400萬元，於109年8月20日辦理決標。

市府於109年10月30日、110年2月4日完成「工作執行計畫書」、「興建工程初步規劃構想報告書」之審定作業，並依契約支付規劃之諮詢及審查服務費用第一、二期款撥付作業。

110年5月6日完成「競圖作業執行計劃書」審定作業，惟因受新冠肺炎疫情影響，相關會議暫緩進行，後續因疫情已緩解，於110年10月8日、111年1月6日召開第1、2次評選委員會，邀請內外聘專家針對招標文件內容進行審議。

後續將辦理「市政大樓興建工程委託設計、監造技術服務」勞務採購案公開閱覽作業，招標說明會、公告招標、評選及決標簽約等相關作業。

十三、持續推動基隆市生命典藏館新建工程

南榮公墓市立納骨塔使用已逾 35 年，塔體老舊，且塔位已達到飽和，目前市府已選定納骨塔現址改建方案並完成工程基本設計，舊有納骨塔骨灰罈暫厝區工程施工已於 111 年 7 月完成，刻正辦理基隆市生命典藏館主體工程細部規劃設計，預計 114 年上旬完成新建工程。

市府自 110 年 3 月 12 日至 4 月 24 日止，共計召開 14 場次家屬說明會，說明骨灰罈暫厝事宜。完工後之建築物為地下一層、地上六層之現代化生命典藏館，將規劃可容納個人骨灰櫃 55,506 個櫃位、雙人骨灰櫃 4,180 組、骨骸櫃 4,636 個櫃位，靈位牌位 18,349 位。總工程經費概估 5 億 2,600 餘萬元，完工後將提升本市殯葬設施服務品質。

南榮公墓也力求公墓公園化，將原有殯葬區轉型設置「環保樹葬區」，使緬懷先人的祭祀活動兼具環保、景觀及生態復育功能。崇璞園樹葬區於 108 年 10 月啟用，面積近 86 坪，園區共分為 9 個小區，採輪葬方式辦理，市民申請免收規費，截至 111 年 8 月 30 日止，市民申請樹葬案件計 798 件。

壹拾、深耕本市觀光品牌

一、正濱漁港周邊環境設施整建，帶動海濱地區觀光廊帶發展

正濱漁港已經是本市的觀光發展重點地區之一，「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」於 110 年 4 月 3 日完工，為今年城市博覽會 B 展區之中心。為進一步完善周邊環境設施，市府於去年間分別完成「正濱漁港觀景平台周邊改善工程」、「正濱漁港碼頭損壞修復工程」，辦理漁港頂棚修復、地燈鋪設、地磅站及停車場周邊鋪面改善、周邊人行道串聯改善工程，藉由優化周邊基礎與觀光設施，提升觀光旅遊服務品質，以帶動海濱地區觀光廊帶發展，逐年完工項目如下表所示。

表 30：正濱漁港周邊環境設施整建完工項目

完成年度	完工項目	經費(萬元)	開工日	完工日
106	和平橋色彩塗佈工程	218	105.08.02	106.01.10
106	和平橋夜間照明工程	225	106.08.16	106.09.29
106	自行車道濱海支線 (串聯正濱漁會大樓、正濱漁港、和平島、碧砂漁港、海科館、潮境公園等景點)	982	105.11.08	106.08.27
107	城市色彩示範計畫－正濱漁港地區(色彩屋)	39	106.07.21	107.03.23
110	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程	10,369	108.11.13	110.04.03
110	正濱漁會大樓新式候車亭	55	110.08.30	110.10.08
110	和平橋頭新式候車亭	53	110.05.21	110.06.29
110	舊漁會大樓周邊人行道串聯改善工程	145	110.08.09	110.10.15
110	正濱漁港觀景平台周邊改善工程	179	110.03.04	110.06.21
110	正濱漁港碼頭損壞修復工程	336	110.04.15	110.07.16
111	正濱漁港漁獲拍賣場頂棚損壞修復工程	515	110.09.13	110.12.24
111	正濱漁港地燈鋪設工程	62	110.11.01	110.11.23
111	正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程	4,174	110.04.10	111.03.20
111	正濱漁港地磅站及停車場周邊鋪面改善工程	583	110.02.10	110.04.10
111	正濱漁港作業漁棚彩繪 (本市地表最大地景藝術)	108	111.03.21	111.04.22



圖 171：城市色彩示範計畫－正濱漁港地區(色彩屋)



圖 172：歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程



圖 173：正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程



圖 174：正濱漁港作業漁棚彩繪

二、城市博覽會海派浪漫光雕秀吸引超過 10 萬人次 參訪

2022 城市博覽會海派浪漫光雕秀於 6 月 10 日至 19 日在正濱漁港色彩屋登場，透過插畫家活潑鮮明的畫風，搭配音樂藝術家及地景聲音採集人的作品，從視覺和聽覺呈現充滿海港元素的奇幻光雕投影作品，營造出專屬基隆的海派浪漫。

今年市府特別邀請八斗國小、中正國小、正濱國小、和平國小、忠孝國小等 5 所中正區的國小學童共創，讓 51 班、853 件小朋友的作品變成光雕秀展演的一部分，更於 5 月 27 日擴大邀請全台民眾共創，募集各地的療癒力量，讓在地學童及民眾的作品成為展演的一部分。活動期間總計 10 萬 183 人次參訪、127 篇媒體報導，線上貼文觸及數達 31 萬 8,139 人次。



圖 175：2022 城市博覽會海派浪漫光雕秀

三、全市觀光據點導覽指示系統改善工程，已於 111 年 4 月完工

為營造國際化的友善觀光環境，市府積極向中央申請經費，獲交通部觀光局補助工程經費 1,008 萬元，本府自籌 592 萬元，總計 1,600 萬元經費，從國際觀光遊客角度審視全市名勝風景遊憩區，規劃雙語化道路指引、導覽牌及智慧化導覽系統，並依旅遊環境特色及資源納入規劃需求，以圖案或色彩提升城市識別性，帶動地方深度旅遊發展與整體觀光環境服務品質。

本工程第一階段已於 109 年 11 月 20 日更新完成雙語化道路觀光指標牌，第二階段之城市博覽會 A 展區導覽指標牌面，已於 111 年 4 月 8 日竣工。



圖 176：全市觀光據點導覽指示系統改善工程

四、基隆觀光巴士 109 年 6 月正式上路

市府自 109 年 6 月 6 日起推出基隆觀光巴士，以小旅行方式串連佛手洞、仙洞巖、基隆西岸旅服中心、基港大樓、正濱漁港、和平島公園、海科館(潮境公園)、廟口夜市等景點，在地旅遊深度體驗行程受到遊客好評，109 年共吸引 565 人搭乘。

110 年基隆觀光巴士新增「外木山」、「要塞司令官邸」、「舊漁會正濱大樓」及「碧砂漁港」等 4 個站點，全面擴大民眾旅遊範圍，兼具東、西岸觀光發展；市府亦利用疫情停駛期間針對車體進行塗裝，由在地藝術家馮昌宏結合郵輪、海洋、色彩屋等基隆意象進行車體設計，並打造「基兒」、「朵兒」兩位形象大使伴隨觀光巴士陪伴民眾暢遊基隆。

基隆觀光巴士因 110 年底疫情趨緩，於 110 年 12 月復駛，推出「沙灣+和平島掀風潮」、「沙灣色彩屋海科館暖基隆之旅」、「聖誕跨年嗨遊基隆」及「漫步兩都暖心之旅」等遊程，透過一系列基隆觀巴主題式旅遊，結合在地導覽人員隨車提供解說服務，帶領旅客走訪基隆各大景點，110 年度共計吸引 2,749 人購買及搭乘，受到遊客喜愛。

因自 111 年 1 月起受疫情影響，基隆觀光巴士遊程停售，目前已推出「和平島+正濱漁港一日走讀」、「八斗子潮境忘憂藻樂趣一日遊」、「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」、「外木山濱海浪漫行一日遊」4 大精選遊程，以及「基隆觀巴 City Tour」、「海洋老鷹嘉年華與潮境海灣節」等期間限定的主題專車，另今年 6 月 10 日至 19 日市府與高鐵假期合作推出城市博覽會限

定基隆觀巴遊程，吸引外縣市旅客來到基隆深度旅遊，廣受好評。

目前 111 年度已有 2,456 人參加基隆觀巴遊程，包含基隆觀光巴士 1,283 人及旅行社出團 1,173 人，以今(111)年目標 2,600 人為基準，達成率為 94.46%。基隆觀光巴士將持續帶動本市觀光發展，期許本年度搭乘人數可達 4,009 人，創造本年度目標達成率 154.19%。



圖 177：基隆觀光巴士結合藝術家彩繪，於 110 年 12 月新裝亮相

五、「海派基隆食旅卷」今年5月21日起開賣，帶動 1,528萬元觀光消費

市府持續推動智慧觀光旅遊服務，自今年5月21日起至12月31日止，推出「海派基隆食旅券」，串聯60家在地觀光特色店家，合作店家包括美食、伴手禮、景點、住宿、交通等店家，透過「海派浪漫基隆 Go Shopping 線上平台」及店家行動支付，提供零接觸旅遊消費服務。

同時也推出6組電子旅遊套票，包含長銷型套票4組、城市博覽會期間限定海上看展套票2組。經統計，5月21日至8月29日累積銷售1萬9,332筆食旅券及電子旅遊套票，實際販售金額為740萬1,953元，預估為基隆帶來1,528萬6,211元的觀光產值。

六、發展暖暖七堵為北台灣生態觀光與休閒農業勝地

1. 打造「拉波波村」為北台灣最佳親子露營空間之一

市府整建童軍暨生態遊學中心，將暖東峽谷生態與童軍營地打造成結合生態、教育、觀光遊憩、露營與餐飲的複合式生態遊學中心，園區又名「拉波波村」，白色帳篷區充滿法式童話感，民眾可選擇直接住進已搭好的舒適帳篷，或自己搭帳棚，是北台灣最好的親子露營空間之一。

經 ROT 招商後，拉波波村於 109 年 8 月正式對外營運，目前主要經營項目包括露營(含住宿)、餐飲、自然生態導覽、手工藝製作及配合教育單位辦理童軍教育活動。

基隆市民及基隆市大專院校師生參與本基地營隊與各項活動，參與設施活動使用至少八折優惠；並提供一定日數免費之市屬學校校外教學活動及童軍訓練與露營活動。



圖 178：打造「拉波波村」為北台灣最佳親子露營空間之一

2.力推淡蘭百年山徑暖暖七堵遊程

北北基宜淡蘭百年山徑路網於今年串聯完成，本市的暖東峽谷步道即是淡蘭百年山徑的重要路徑。市府今年整合推廣「淡蘭百年山徑暖暖行」及「漫遊百年小城七堵行」，並製作旅遊手冊，暖暖行推出「山徑朝聖者」、「輕騎慢走」、「希望山水」等三條路線，七堵行推出「時光追憶」、「田園山水」、「百年風華」等三條路線，電子旅遊手冊也放置在基隆旅遊網供民眾規劃安排遊程。

此外，本市與「淡蘭跨縣市平台」合作，於今年5月28日在台北舉辦會師記者會，共同宣傳台灣步道日，本府以6月10日至6月19日在基隆舉辦的城市博覽會為號召，力推暖暖七堵遊程。而第四屆亞洲步道大會啟動記者會於8月31日在台北舉辦，本府將持續推廣暖暖七堵雙城旅遊。

亞洲步道大會將在今年12月1日至12月5日於台北正式登場，本市暖東峽谷步道將與日本宮城偶來步道締結為國際友誼步道，並互設締結紀念裝置，預計於12月4日在暖東峽谷舉辦揭牌儀式，日方揭牌代表、亞洲步道聯盟組織代表都將派員共襄盛舉。



圖 179：淡蘭百年山徑暖暖行旅遊手冊



圖 180：漫遊百年小城七堵行旅遊手冊

七、優化基隆嶼旅遊服務品質，4 年總計吸引 21.7 萬 人次登島觀光

基隆嶼曾因遭颱風襲擊封島多年，經市府整建完成後，於 108 年 6 月以嶄新面貌重新開放登島觀光，為發展永續觀光，限定每日登島人數總量管制 1,200 人(疫情期間另實施人數降載措施)，東北季風期間為維護安全禁止登島；同時落實使用者付費概念，隨票徵收 100 元規費，作為基隆嶼資源保育及環境維護費用。

4 年來，市府除了重整購票流程，持續進行載客登島船舶評鑑作業、要求船上服務人員取得急救證書，也針對基隆嶼進行相關硬體設備更新，包括執行「基隆嶼碼頭零星修繕工程」、「基隆嶼遊客遊憩步道改善工程」、「基隆嶼生態展示館木地板修復工程」、「基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善

工程」等，建置安全的休憩空間與友善的旅遊服務設施，提供優良的基隆嶼遊程體驗。自 108 年 6 月重新開放登島至 111 年 8 月 29 日止，累計吸引 21 萬 7,955 人次登島觀光。

八、基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善工程已於今年 7 月完工

為改善基隆嶼濱海步道、休憩涼亭、全區導覽指標系統及周邊景觀設施，本府向中央爭取經費，獲交通部觀光局補助 1,995 萬元，本府自籌 1,005 萬元，經費總計 3,000 萬元，以建置友善的觀光遊憩服務設施及提升旅遊環境品質及安全，工程已於 111 年 7 月竣工。

本工程除了拓寬步道以增加安全性，融合現況地景及石頭蜿蜒前行，並於步道交會節點附近增加遮陽避雨的休憩亭。

全新設計的導覽指標更是跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上 QR Code 智慧導覽，完全融入地景環境，讓登島遊客耳目一新。

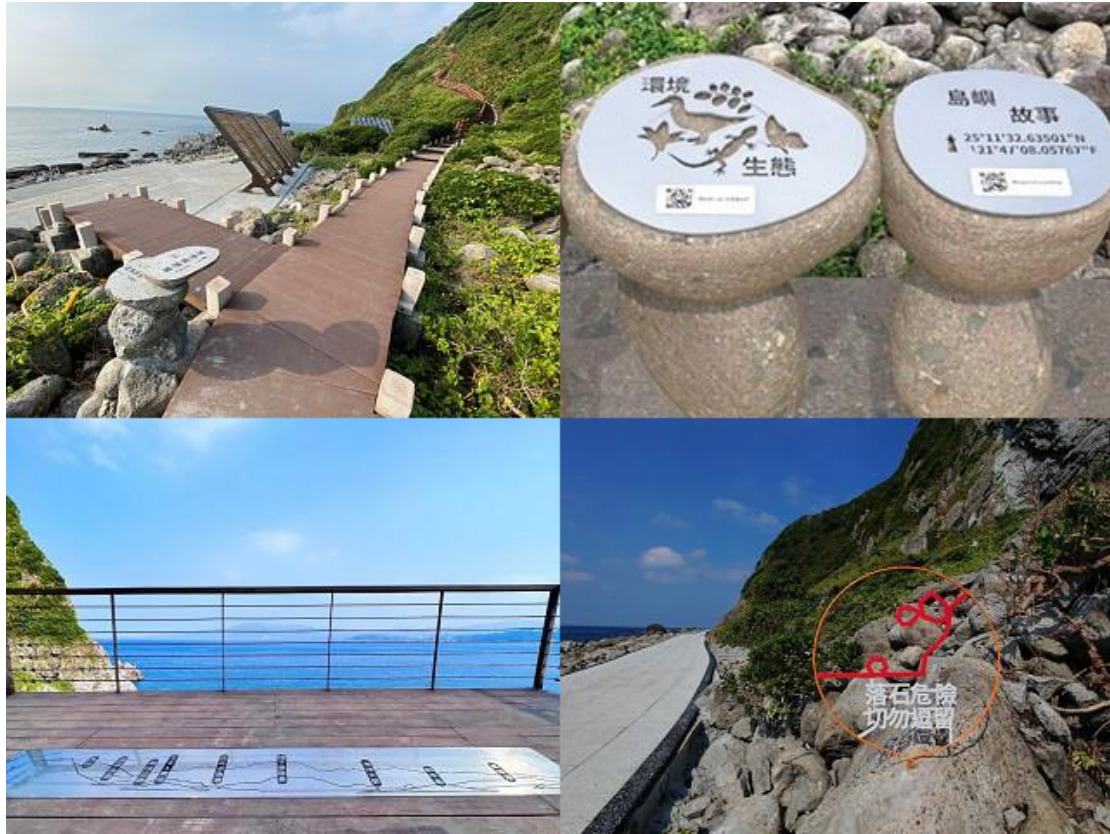


圖 181：基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善工程

九、8 年來劇組協拍數量累計達 484 件

市府提供劇組友善便利的協拍作業，已建立口碑，成功透過媒體影像傳播，行銷基隆城市意象。市府建置「隆來拍電影」專屬網站揭露協拍資訊，讓影視劇組來基隆拍攝的詢問度愈來愈高，透過主動、積極的行政協助作業，協拍件數顯著成長，從 104 年協拍 17 件、105 年協拍 26 件、106 年協拍 43 件、107 年協拍 90 件、108 年協拍 80 件、109 年協拍 60 件(受到 COVID-19 疫情影響，協拍數量略有下降)、110 年協拍 98 件、111 年 70 件且持續增加中。

近年協拍影片以電視劇、電影居多，其次是網路影片(短片)、音樂 MV、廣告及紀錄片等。國內電視台包括大愛電視、中視、公共電視等，均不約而同前來本市取景，包含大愛劇場連續劇「搜尋者」、中視綜藝節目「綜藝玩很大」、公共電視知性節目「我又在市場待了一整天」、電視劇「國際橋牌社-和平歸來」等；此外，「親愛的房客」、「緝魂」等 2 部榮獲金馬獎三金殊榮的電影，也都選擇在基隆拍攝。

基隆是有港口人文、山海生態、文化歷史的魅力城市，更是台灣的國門，在過去就引領風騷，引領台灣的時尚，而現在更有了新時尚，包括太平青鳥、城際轉運站、國門廣場、基隆塔、沙灣歷史文化園區、望海巷景觀橋等，新景觀新氣象，歡迎更多劇組來基隆取景拍攝，藉由鏡頭視角，讓基隆之美無遠弗屆。

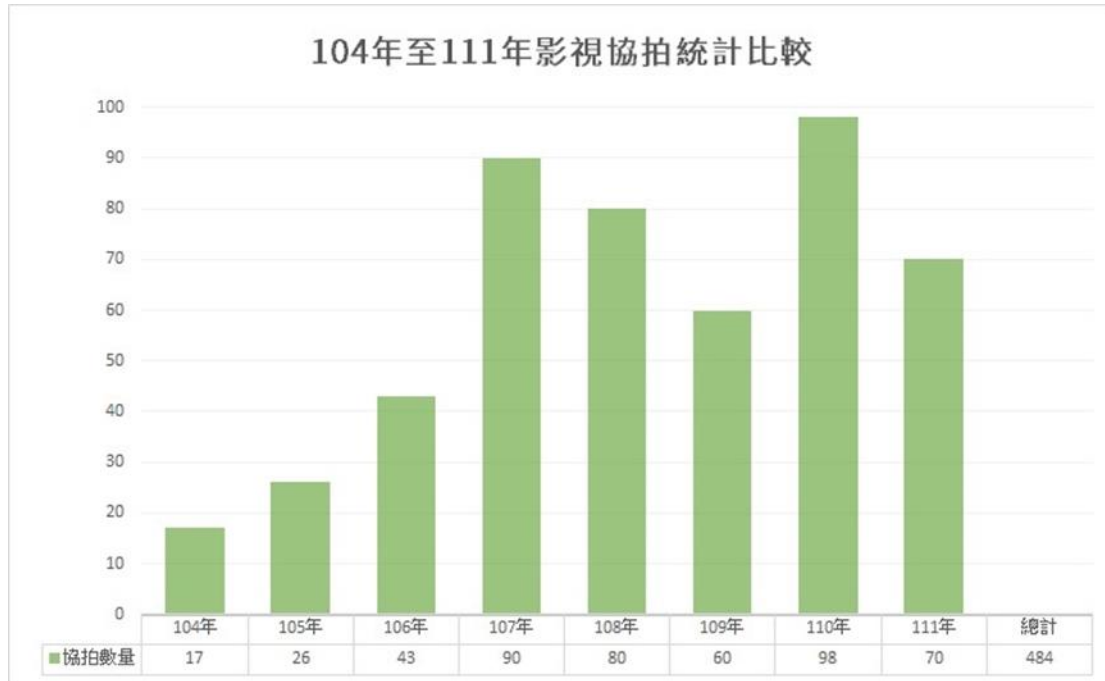


圖 182：104 至 111 年影視協拍件數統計比較

十、「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍於 110 年公告調整

（縣）市級「基隆濱海風景特定區」於 107 年 9 月經交通部同意核定，市府於同年 10 月公告劃定範圍，劃定面積共計約 670 公頃。因本市西岸及基隆嶼涵蓋豐富的觀光資源，原未被納入本市風景特定區範圍，本府自 107 年起辦理「基隆西岸暨基隆嶼風景特定區規劃評鑑委託技術服務案」，於 110 年 5 月 18 日完成並公告調整「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍。

十一、金包里文教中心興建營運移轉案，已於今年 6 月 24 日公告招商

本市位於新北市金山區五福段 35、244、270、271、272、234-4 及 225-3 地號等 7 筆市有土地，面積合計 9,713.73 平方公尺，因都市計畫使用分區為教育休閒專用區，市府為引進民間資金投入公共建設、提升公共建設服務水準，爰依據促進民間參與公共建設法辦理「金包里文教中心興建營運移轉案」。本案前於 110 年 3 月至 8 月間分別辦理 2 次公告招商，惟受疫情影響，均無申請人遞件，經修訂本案招商條件後，於 111 年 6 月 24 日至 8 月 29 日辦理第 3 次公告招商。

本案招商條件調整為要求興建可容納 150 人以上之會議廳、培訓空間及至少 40 個房間之住宿空間，契約期間合計 50 年（興建期 7 年、營運期 43 年），預估投資金額將達 3 億元以上。完工後，將提供政府公務、企業團體培訓使用。期待結合北海岸周邊文化及特產，帶領遊客體驗在地旅行，成為北海岸文教旅遊勝地。

十二、北觀處於本市轄管景點重點建設

自 104 年起，北觀處轄管本市情人湖、外木山、和平島三大景點，總計投入 4 億 6 千萬餘元經費挹注相關建設，完工項目詳如下表。

表 31：北觀處於本市轄管景點完成之重點建設

景點	項次	工程	經費(萬元)	開工及完工日期
情人湖	1	情人湖入口及步道周邊景觀改善工程	1,750	104 年 7 月開工，104 年 11 月完工。
	2	基隆情人湖步道周邊景觀改善工程	800	105 年 7 月開工，105 年 10 月完工。
	3	情人湖公園既有設施修繕工程	1,600	110 年 10 月 25 日開工，110 年 11 月 12 日完工。
外木山	1	北海岸自行車道基隆段及周邊環境景觀改善工程	1,200	105 年開工，106 年完工。
	2	外木山湖海路一段自行車步道改善工程	2,200	109 年 5 月開工，109 年 10 月完工。
	3	外木山湖海路二段燈桿美化工程	400	108 年 9 月完工
	4	外木山遊憩區洪水澳周邊景觀改善工程	1,100	106 年 9 月開工，106 年 12 月完工。
	5	基隆湖海路周邊景觀改善工程(第一期)	2,300	108 年 7 月 4 日開工，108 年 11 月 5 日完工。
和平島	1	和平島海巡營舍周邊環境改善工程	2,700	105 年完工。
	2	基隆和平島公園服務設施改善工程	3,000	108 年 3 月 20 日開工，108 年 12 月 4 日完工。
	3	基隆和平島周邊服務設施及景觀改善工程	800	108 年 4 月開工，108 年 9 月完工。
	4	和平營區二圍牆退縮及人行道廣場新建工程	1,200	110 年 6 月 15 日開工，110 年 10 月 31 日完工。
	5	和平島公園通用步道暨景觀改善工程	1,600	110 年 5 月開工，110 年 10 月完工。
	6	阿拉寶灣周邊步道及景觀改善工程	1,760	110 年 10 月開工，111 年 5 月完工。



圖 184：情人湖入口及步道周邊景觀改善工程



圖 185：外木山湖海路一段自行車步道改善工程



圖 186：和平營區二圍牆退縮及人行道廣場新建工程



圖 187：阿拉寶灣周邊步道及景觀改善工程

壹拾壹、照顧原住民朋友

一、8年來原民預算增加超過50%

市府重視原住民文化，8年來總計投入2億餘元的經費，104年編列預算2,087.4萬元、105年編列2,017.9萬元、106年編列2,034.8萬元、107年編列2,342.6萬元、108年編列2,439.9萬元、109年編列2,828.5萬元、110年編列3,120.8萬元，今(111)年則編列3,144.4萬元，8年來經費成長規模達50.64%。

其中，原住民駕駛技藝訓練補助原每年補助名額為18位，自111年度起，補助名額增至38位，預算從7萬2千元調整為15萬2千元，補助經費倍增；聯合豐年祭活動長者到場指導金原每人發放2,000元，自111年起，指導金提高至2,500元，預算金額從40萬元調整為75萬元，補助經費增加近一倍；體育活動經費部分，預算從42萬餘元增加至111年的80萬元，經費增加近一倍；而地區協進會活動經費，自110年起首度破百萬，從原本的75萬元提升至105萬元。




圖 188：104-111 年度本市原住民文化經費預算數趨勢圖

表 32：原住民福利調整表

福利項目	原執行情形	現行辦理情形	備註
基隆市原住民微型傷害保險	原由社會處承辦，自 106 年起移至民政處辦理。由新光人壽承保，納保人數上限 2,500 人，保險金額 30 萬元。	自 112 年起，將納保人數上限調整至 6,000 人，保險金額最高 20 萬元。	
原住民子女教育獎助學金	獎勵小學至大學成績達公告標準之優秀原住民子女。	自 109 年起擴大開放社會人士就讀專科、大學在職進修班申請。	
原住民駕駛技藝訓練補助	原每年補助名額為 18 位(每人補助 4 千元)	自 111 年度起，增加 20 個名額，每年補助名額為 38 位。	預算金額從 7 萬 2 千元調整為 15 萬 2 千元
本市原住民聯合豐年祭活動長者到場指導金	為鼓勵長者親自到場指導豐年祭活動，傳承原民文化，到場之 70 歲以上長者，每人發放 2,000 元。	自 111 年起到場之 70 歲以上長者，到場指導金提高至 2,500 元。	預算金額從 40 萬元調整為 75 萬元

福利項目	原執行情形	現行辦理情形	備註
體育經費	年度體育活動經費422,370。	為健全本市體育發展，自111年起提高年度體育經費至80萬元。	預算金額從422,370元調整為800,000元
地區協進會活動經費	本市編列預算補助各地區原住民生活教育協進會年度活動經費50,000元。	自110年起提高至70,000元，俾利各地區原住民生活教育協進會加強辦理原住民地區豐年祭等相關原住民文化傳承事項。	預算金額從75萬元調整為105萬元

表 33：原住民新增福利項目

新增福利項目	開辦日期	執行情形	備註
原住民文化健康站	積極向中央原民會申請經費，於109年3月16日設置第一站，並於111年3月15日設置第二間。	目前第1站設置於中正區本市原住民文化會館五樓、111年開設之第2站位於七堵區七美教會，2處文化健康站，每站每日服務長者的量能為29人。	
原住民學童課後輔導班	積極向中央原民會申請經費，自105年起開設第1班，並於109年再開設1班。	105年起每班有20位原住民學童學生參加課後輔導班。109年度起共計有40位原住民學童學生參加課後輔導班。	
原住民假日市集	111年首次辦理，原訂自111年3月19日至6月26日辦理，因受疫情影響，延後辦理至8月28日止，辦理期間的每週六、日於本市原民會館旁原民廣場辦理。	原住民假日市集設置攤位約15攤，主要以原民美食、原民農特產品及原民文創商品為主要販售項目，期能透過市集的開設，增加本市都會地區原住民族人經濟收入。	

二、致力保存與推廣原住民文化

1.完成海濱原住民國宅周邊環境改善

市府投入 1,597 萬元經費進行「海濱原住民國宅周邊環境改善工程」，於 109 年 1 月 21 日開工，109 年 12 月 21 日完工。完工項目包含部落聚會所整修、原住民特色瞭望台整建、觀景平台改善、社區擋土牆及廣場整建、社區籃球場施作、步道欄杆及棚架改善等，打造優質的原住民社區居住環境。



圖 189：海濱原住民國宅周邊環境改善工程—部落聚會所整建



圖 190：海濱原住民國宅周邊環境改善工程—原住民特色瞭望台整建

2.舉辦原住民假日市集

為發展本市原住民文化活動，讓更多民眾了解原住民文化，市府辦理原住民假日市集，輔導特色農漁產品、食品、文創產品行銷，增加原住民朋友經濟收入，並推廣原住民族文化體驗，以原住民獨特的人文色彩為基礎，營造友善觀光環境。

市府期透過原民市集活化原住民文化會館，串接周邊正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、和平島、海科館、潮境公園等觀光景點，帶動海濱地區觀光廊帶發展，活絡當地經濟。

自 111 年 3 月 19 日起至 8 月 21 日止，每週六、日於原住民文化廣場舉辦原住民假日市集，共計 31 場，累計 11,240 人次參與。



圖 191：2022 城市博覽會原住民
假日市集

圖 192：2022 城市博覽會原住民
假日市集

3.原住民文化會館文物典藏與活動展演

為保存與推廣原住民族文化，本市原住民文化會館目前典藏各族生活文物達二百餘件，且每年不定期舉辦原住民藝文策展，並於每週固定時段推出樂舞展演，原民會館周邊為原住民文化廣場，設置各項原住民意象造景。

參館人次部分，106 年來館人數約 3 萬 1 千人次，107 年約 6 萬 2 千人次，108 年約 6 萬 9 千人次，109 年約 6 萬 3 千人次，110 年配合防疫閉館約 3 個月，約 2 萬 6 千人次，111 年截至 8 月底約 3 萬 1 千人次來館參觀，8 年來累計 28.2 萬人次造訪。

4.原住民部落大學開設傳統文化課程

為傳承原住民文化資產，本市原住民部落大學每年開設多門原住民傳統編織、串珠、雕刻、原住民美食班等課程，培訓本市傳統技藝人才。

5.保存族語

為提高原住民族語傳承動力及培育新一代族語傳承人才，本市設有 1 名阿美族語言推廣人員、開設族語聚會所 2 處、族語學習家庭 3 戶、族語傳習教室 1 班次。

6.舉辦原住民傳統活動

本市每年舉辦原住民豐年祭、祖靈祭等傳統文化活動，將原住民傳統祭典精神傳承下去。此外，本市舉辦原住民運動會，也將撒漁網、傳統擲矛、射箭等原住民傳統競技，與運動賽事做了絕佳結合。



圖 193：基隆原住民聯合豐年祭

三、設置 2 處文化健康站，提供原住民長者健康照顧服務

為照顧本市原住民長者健康及傳承原民文化，市府於 109 年 3 月 16 日在原住民文化會館設置第一間文化健康站，111 年 3 月 15 日在七堵區開辦第二間文化健康站，提供原住民長者在地化的老人照顧服務。

文化健康站服務項目包括辦理延緩老化失能活動、共餐、舉辦身心健康促進課程、文化教育課程、文康休閒活動等等。

自開辦日起，截至 111 年 8 月 30 日止，2 處文化健康站共計提供生理量測 8,615 人次、電話問安 9,571 人次、關懷訪視 4,280 人次，總計服務 22,466 人次，如下表所示。

表 34：本市文化健康站服務原住民長者情形(單位：人次)

站名 \ 服務項目	生理量測	電話問安	關懷訪視	合計
基隆文化健康站	7,542	9,414	4,280	21,236
七堵文化健康站	1,073	157	0	1,230
合計	8,615	9,571	4,280	22,466

四、辦理各項福利措施，照顧本市原住民朋友

為照顧本市原住民朋友，市府持續辦理各項原住民福利措施，包括開辦原住民子女教育獎助學金、擴大開放社會人士就讀專科及大學在職進修班申請、原住民學童課後輔導班增班、微型保險原民免保費、建購及修繕房屋補助、創業貸款、急難救助、技術士檢定證照獎勵、駕訓補助、成立原住民家庭服務中心、成立文化健康站等措施。

自 106 年起，市府結合新光人壽及新光人壽慈善基金會之捐贈保費，協助本市 15 歲至 70 歲的原住民投保微型傷害保險，採專案團體投保方式，由市府擔任要保單位，提供被保險人最高 30 萬元的保險保障，截至 111 年 8 月底止，總計

1,338 人受惠。自 112 年起，將納保人數上限調整至 6,000 人，
保險金額最高 20 萬元。

壹拾貳、社會照顧

一、強化本市社會安全網

本府持續執行「強化社會安全網第二期計畫」，計畫期程為 110 年至 114 年，預計投入 6 億 8,666 萬元經費(社政 4 億 4,166 萬元經費、衛政 2 億 4,500 萬元經費)，截至 111 年 8 月底止，第二期計畫已投入 1 億 2,366 萬 1,468 元經費(社政 8,773 萬元經費、衛政 3,593 萬 1,468 元經費)，執行情形如下表所示。

表 35：強化社會安全網第二期計畫執行情形

權責	執行項目	執行進度
社政	目標達成 7 區 4 處社會福利服務中心建置	已完成布建 4 處： 1.正義社會福利服務中心(服務中正區與信義區) 2.暖七社會福利服務中心(服務七堵區與暖暖區) 3.仁山社會福利服務中心(服務仁愛區與中山區) 4.安樂社會福利服務中心(服務安樂區)
	目標社會福利中心進用 4 名社工督導、26 名社工員、1 督 4 名身心障礙需求評估社工人力、5 名脫貧社工人力	社會福利服務中心已進用 3 名社工督導、22 名社工員，身障需求評估已進用 1 督 4 名社工，脫貧社工已進用 3 名社工。

權責	執行項目	執行進度
	目標保護性社工人力進用 4 名 保護性社工督導、24 名保護性 社工員	已進用 2 名督導、13 名社工。
	透過專家學者輔導會議和跨局 處網絡會議，積極合作發掘潛 在個案議題、加強通報準確度、 精進風險評估預警機制	已召開會議 91 次(社區聯繫會 議與跨局處網絡會議)
	服務對象包含家庭暴力被害 人、兒虐、性侵害被害人、脆弱 家庭等各項社區與網絡單位通 報案件。	受理 16,070 通報案次。
衛政	目標布建社區心理衛生中心 1 處	已完成布建 1 處
	目標增聘心理師 4 名、職能治 療師 1 名	已聘諮商心理師 2 名及職能治 療師 1 名
	精神疾病與自殺防治合併多重 議題個案服務	已服務 129 案、服務涵蓋率 97.6%
	服務家暴及性侵害加害人處遇 業務個案	已服務家暴加害人 80 名、性侵 加害人 250 名
	服務一般精神疾病與一般自殺 企圖個案	列管一般精神疾病 3,996 人， 服務 102,580 人次。 自殺企圖 3,818 人，服務 35,801 人次。
	藥癮個案管理服务涵蓋率目標 達 85%	服務 776 人、服務涵蓋率 98.73%

二、本市長期照顧計畫 2.0 執行成果

本市長期照顧計畫 2.0 執行期程為 106 年(長照 2.0 元年)至 111 年，執行成果說明如下：

1. **長照服務據點**：由 106 年 1A-2B-5C 開始布建，截至 111 年 8 月底止，布建總數達 10A-126B-60C。使用服務者自 106 年 2,099 人成長至 110 年 3,742 人，成長率達 78.28%。
2. **設置長照機構**：目前已設置 6 家日間照顧中心、2 家小規模多機能服務中心，今(111)年預計將於中正區及仁愛區設立 3 處日間照顧中心，目前中山區有 2 處單位與市府接洽日間照顧服務設立事宜。
3. **布建家照暖心站**：106 年布建 41 處，截至 111 年 8 月底止，共計布建 217 處，成長約 4.3 倍，期打造點線面服務網，協助家庭照顧者紓壓。
4. **長期照顧管理中心服務人數**：108 年計 4,607 人，109 年 6,040 人，110 年 5,956 人，111 年截至 8 月 25 日止共計服務 5,735 人。
5. **長期照顧給付及支付使用人數**：108 年計 2,985 人，109 年計 4,564 人，110 年計 3,742 人，111 年截至 7 月止共計 3,536 人。

6.長期照顧各服務項目使用情形：詳如下表所示。

表 36：本市長期照顧計畫 2.0 各服務項目使用情形

權責	服務項目	108 年 服務量	109 年 服務量	110 年 服務量	111 年 服務量 (截至 7 月)
衛政	醫事專業服務	900 人	1,061 人 18,110 人次	1,158 人 8,558 人次	848 人 5,015 人次
	喘息服務	415 人	717 人 6,450 人次	647 人 8,482 人次	470 人 5,612 人次
	失智共照	1,003 人	1,260 人	1,443 人	1,259 人
	失智社區據點	個案 112 人 家屬 38 人	個案 141 家屬 55 人	個案 202 人 家屬 31 人	個案 222 人 家屬 19 人
	長照出院準備	643 人次	636 人次	780 人次	318 人次
	失能家醫計畫	17 人	793 人	438 人	804 人
社政	居家服務	1,362 人	1,916 人	2,284 人	2,250 人
	日間照顧	117 人	135 人	258 人	279 人
	家庭托顧 (於 111 年開始)	-	-	-	11 人
	交通接送	440 人 13,006 人次	620 人 16,764 人次	772 人 19,445 人次	732 人 14,127 人次
	餐飲服務	460 人	633 人	781 人	575 人
	輔具購買補助	779 人	1283 人 3,050 人次	837 人 2,327 人次	768 人 1,721 人次
	團體家屋	9 人	9 人	9 人	10 人

三、老人假牙補助 8 年投入約 2.91 億元，造福 10,053 位長者，裝置後 3 個月滿意度達 9 成以上

本市自 104 年起開辦老人假牙補助計畫，至 111 年 8 月 31 日止，市府共投入約 2.91 億元經費，已完成假牙裝置共 10,053 件，平均約每 7 位長者就有 1 位以上受惠。

104 年申請人次為 2,132 人，經費支出約 6,595 萬，到 110 年申請人次降至 1,058 人，經費支出也降到約 2,900 萬，呈現穩定下降趨勢，並未出現申請人次激增造成本市財政負擔的問題。

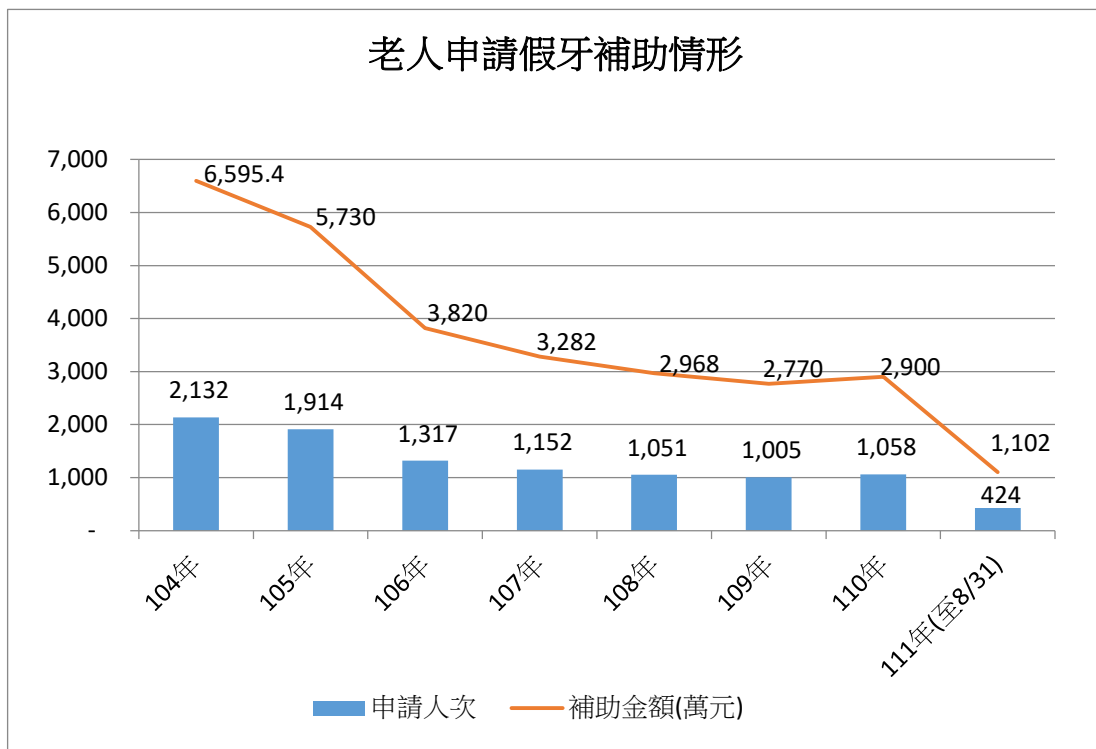


圖 194：104 年至 111 年 8 月 31 日老人申請假牙補助情形

假牙裝置完成後，原診治醫療院所提供 1 年的調整服務，衛生局進行假牙裝置完成後 3 個月及 6 個月電訪關懷，予以適時衛教。經調查統計，自 104 年至 111 年 8 月 30 日止，完成裝置後 3 個月關懷服務，滿意及非常滿意度情形為 91.1%，普通佔 7.31%，不滿意及非常不滿意佔 1.58%，滿意度維持在 9 成以上。




圖 195：假牙裝置完成後 3 個月滿意度分析

四、輔具資源中心設置 5 處據點，提供鄰近便利服務

為提升本市輔具服務量能，自 108 年 11 月起，本市輔具資源中心於信義區(身障中心)、七堵區(實踐里關懷據點)及中山區(民治里里民活動中心)設立服務據點，提供民眾輔具諮詢、維修、轉贈、回收及評估等服務。

109 年 9 月及 110 年 5 月於安樂區照管中心及暖暖區暖暖聖光堂成立輔具便利站，提供民眾諮詢、轉贈及回收的便民服務。自 110 年 2 月起，亦於各區公所設立民眾領用及回收之輔具服務處，就近提供便利服務。

截至 111 年 8 月 30 日止，輔具資源中心(含輔具服務據點及便利站)提供輔具諮詢 3,416 人次、維修 926 人次、借用 1,762 人次、回收 599 人次及評估 2,189 人次，總服務人次達 8,892 人次。

五、敬老卡福利 8 年投入 3.9 億元，使用近 4,743 萬人次

本市敬老卡開辦至今已逾 17 年，累計發行超過 13 萬 4,500 張，提供敬老卡持卡人免費無限次搭乘市公車及基隆客運市區路線，較雙北市的點數制度更為優惠；另配合補助搭乘臺北、新北、桃園、高雄捷運及輕軌，以法定優惠票價計算。104 年至 111 年 7 月 31 日止，市府共計投入 3 億 9,273 萬元經費，使用達 4,743 萬人次。

表 37：104 年至 111 年 7 月敬老卡乘車補助情形

年度	市公車及基隆客運		大眾捷運		人次 總計	補助金額 總計(元)
	搭乘人次	補助金額	搭乘人次	補助金額		
104 年	550 萬 7,479	4,414 萬 5,224	33 萬 5,766	556 萬 5,534	584 萬 3,245	4,971 萬 0,758
105 年	563 萬 7,386	4,509 萬 9,088	40 萬 0,859	428 萬 3,290	603 萬 8,245	4,938 萬 2,378
106 年	612 萬 4,388	4,899 萬 5,104	48 萬 5,307	547 萬 2,322	660 萬 9,695	5,446 萬 7,426
107 年	640 萬 4,353	5,123 萬 4,824	56 萬 1,824	638 萬 0,368	696 萬 6,177	5,761 萬 5,192
108 年	659 萬 7,787	5,278 萬 0,880	66 萬 2,234	731 萬 5,559	726 萬 0,021	6,009 萬 6,439
109 年	598 萬 9,561	4,791 萬 6,488	57 萬 2,881	624 萬 2,159	656 萬 2,442	5,415 萬 8,647
110 年	482 萬 9,936	3,863 萬 9,488	49 萬 8,042	532 萬 7,690	532 萬 7,978	4,396 萬 7,178
111 年 (至 7 月 31 日)	258 萬 0,928	2,064 萬 7,424	24 萬 6,825	269 萬 3,359	282 萬 7,753	2334 萬 0,783
總計	4,367 萬 1,818	3 億 4,945 萬 8,520	376 萬 3,738	4,328 萬 0,281	4,743 萬 5,556	3 億 9,273 萬 8,801

六、長照福利服務園區促參案

為因應本市長照人口日益增加及市立仁愛之家轉型，市府向財政部提報「基隆市長照福利服務園區促參案」，108 年獲核定補助辦理先期規劃作業並列為長照促參全國示範案件。

本計畫秉持「多層級連續性服務」思考方針，重視、強化開放民間業者規劃融入當地生活支持設施，擴大受眾，設置居家、社區到住宿式照顧之多元類型長照相關服務，提供自立到中重症、不同經濟狀況的高齡者生活之多元需求，並成為社區居民能夠進出與長者互動的新交流場所。

全案開發面積約 3.76 公頃，含 88% 社會福利設施用地及 12% 住宅區，整體政策規劃設置「住宿式」服務至少 600 床 (含長照床至少 400 床、公費長照床至少 150 床公費、身心障礙福利機構重癱養護床至少 50 床)，以及「社區式」長照服務至少 60 人等 (如日間照顧中心、小規模多機能中心、失智團體家屋等)。另允許民間機構依其創意及營運需要自行規劃，例如青銀共創辦公室、全齡友善居住單元、長照交流研習、諮詢或經營住民及家屬相關附屬社福設施，或是青銀共居、小型商場、餐飲或診所等服務空間。

本案於 109 年 10 月 28 日首次公告招商，迄今累計 3 次，前 2 次皆有 1 組投資人投件且為同一團隊，經甄審未達標準；第 3 次參採潛在廠商意見及市場考量，修正招商文件後重新公告，於 111 年 3 月 22 日截止收件，無投資人遞件。

目前正辦理第 4 次招商，經參酌潛在備標投資人意見，重新審視招商條件並檢核財務重新評估，在保有基本政策需求與合理自償性前提下，修正公費床位數及財務負擔等條件，已於 111 年 8 月 3 日上網公告，為期 60 日，於 10 月 3 日截止收件。期望能透過民間投資，再提升本市長期照顧服務品質及周邊設施經營效率。

七、整合住宅補貼資源實施方案補貼名額 8 年成長近 3 倍

為減輕單身青年及新婚育兒家庭的經濟負擔，並建立宜居的住宅環境，本府積極爭取預算，擴大辦理租金補貼，補助名額逐年成長，自 103 年 449 戶、104 年 826 戶、105 年 902 戶、106 年 996 戶、107 年 1,073 戶、108 年 1,109 戶、109 年 1,517 戶、110 年 1,602 戶(再加上超額戶 135 戶，總計補助 1,737 戶)，8 年來成長 2.87 倍。

為使補貼金額更貼近各種條件家庭的需求，自 110 年度實施「分級補貼制」，依據各個家庭人口數、經濟社會弱勢狀況及租屋地區租金水準，每戶每月最高補貼額度為新台幣 2,000 元至 3,600 元不等，最長補貼 1 年。

110 年度租金補貼分 2 梯次受理，總計受理 2,056 戶，並於 111 年 1 月、5 月總計核定補助計畫戶數 1,602 戶，另經中央同意超額 135 戶全額補助。111 年度租金補貼經中央政策裁示，改由營建署統籌辦理「300 億元中央擴大租金補貼專案」。




圖 196：本市租金補貼名額成長圖

八、社會住宅包租代管第三期累計媒合數量為全國第 3 名

內政部於 108 年 6 月核定全額補助本市 1 億 1,592 萬餘元辦理「社會住宅包租代管第二期計畫」，推動 600 戶包租代管，於 109 年 5 月 25 日正式上路，截至 110 年 10 月 31 日止(第二期)，已成功媒合 726 組房東房客(包租 192 件、代管 534 件)，執行率超過 100%，累計媒合數量為非六都縣市第一名。

市府以照顧弱勢為目標，將本計畫弱勢戶占比自中央規定的 4 成提高至 6 成，並積極串聯社福系統，主動協助覓屋困難族群，最低提供市場價格 5 折優惠租金，減輕其負擔。

為讓更多市民受惠，110 年市府再向中央爭取資源，獲內政部核定全額補助 2 億 648 萬餘元，於第三期再釋出 1,000 戶名額，自 110 年 11 月 3 日起開放申請。本期包租代管名額放寬條件，申請者不限戶籍地在基隆，只要想在本市租屋且家庭成員於北北基桃沒有房子、未享有租金補貼、每戶家庭年所得低於 99 萬元、每人每月平均收入低於 4 萬 9,805 元，就有機會享租金 8 折至 9 折優惠。第三期統計截至 111 年 8

月 31 日止，已成功媒合 862 組房東房客(包租 135 件、代管 727 件)，累計媒合數量為全國第 3 名。

九、國家住宅及都市更新中心於本市首批社會住宅

「光明安居」，統包工程於今年 8 月中旬決標，預計 116 年完工營運

市府與內政部營建署盤點本市各區公、私有土地後，優先選定七堵區大華橋頭台鐵局七堵調車場旁的國有財產署空地，面積約 7 千多平方公尺，幾經協調，由國家住宅及都市更新中心負責出資興建及營運社會住宅「光明安居」，預計投入 23 億 2,870 萬元經費，規劃興建 450 戶，只租不售。

本次社會住宅的地點位在七堵火車站周邊，也在未來七堵捷運站附近，是七堵往市區的重要節點，因此將規劃相關門戶意象，爭取公共藝術導入的理念，營造具特色生活風格的居住環境。此外，本次社會住宅設計包含套房、二房、三房等房型，低樓層有托育中心及商業機能。未來將保留 4 成給弱勢戶居住，其他則開放給一般民眾申請。

社會住宅計畫是基隆河谷廊帶與基隆捷運計畫的一部分，捷運沿線將以人本空間，打造水岸、自然與人文空間與

系統，結合七堵商圈與市場，及鐵路、捷運場站動能，逐步營造七堵新氣象，推動七堵地區及基隆河谷廊帶的再生。

統包工程於 111 年 5 月 31 日公告招標至 111 年 7 月 11 日，因無廠商投標，於 7 月 18 日再次上網公告，8 月 18 日順利決標，預計於 116 年完工營運。

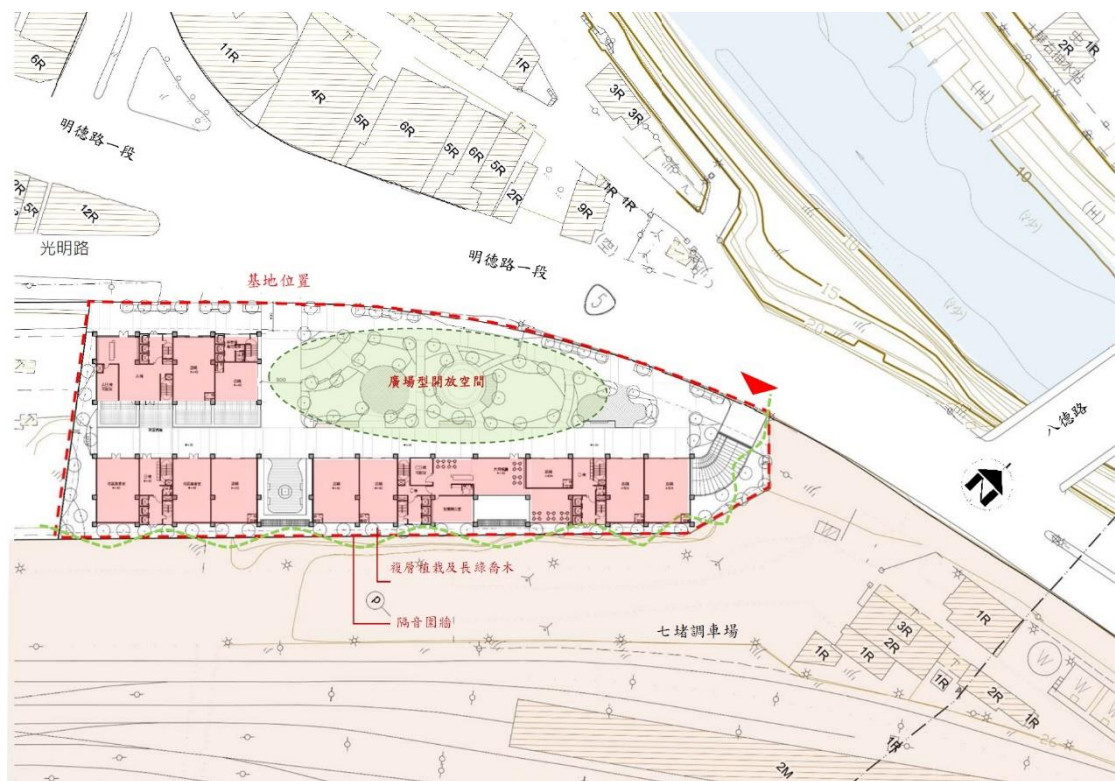


圖 197：本市社會住宅「光明安居」初步規劃示意圖(後續仍依招標及實際執行為準)

十、婦女生育獎勵金 8 年補助超過 3 億元

為鼓勵婦女生育，市府自 104 年起提高婦女生育獎勵金，每一胎次補助新台幣 2 萬元，截至 111 年 8 月 31 日止，共計補助 15,991 人次，計 3 億 1,840 萬元。

表 38：104 年至 111 年 8 月 31 日止婦女生育獎勵金發放情形

年度	104	105	106	107	108	109	110	111 年 (截至 8 月底)
核發人次	2,352	2,529	2,196	2,176	2,037	1,983	1,796	922
發放金額 (萬元)	4,562	5,058	4,392	4,352	4,074	3,966	3,592	1,844

十一、中低收入戶及身心障礙者微型保險共計約 2 萬人受惠

自 105 年起，市府結合南山人壽及南山人壽慈善基金會之捐贈保費，提供設籍本市年滿 15 歲至 75 歲的中低收入戶，免費集體投保微型傷害保險。另自 109 年 4 月 15 日起，由原本的集體投保制改為團體投保制，市府提供符合名冊經核保後納保，簡化流程，此保險依意外失能程度，可獲得 1 萬 5 千至 30 萬元的保險理賠，涵蓋率達九成七，截至 111 年 8 月 10 日止，計有 6,571 人受惠。

此外，市府自 110 年起結合新光人壽及新光人壽慈善基金會捐贈保費，辦理經濟弱勢身心障礙者微型保險，提供設籍本市年齡 15 歲以上、70 歲以下且符合領取 110 年 7 月份本市身心障礙生活補助者投保團體微型保險，計有 5,248 人受惠，佔整體身障人數 24.4%，最高可獲得 30 萬元的意外保險理賠；自 111 年 8 月 5 日起，同樣額度意外保險理賠，凡於 111 年 7 月 29 日設籍本市 15 至 70 歲領有身心障礙證明之市民，均可納入微型保險，提升至 13,500 人受惠，佔整體身障人數 63.4%，涵蓋率提升近 4 成。

十二、打造友善動物城市

1. 打造五星級「浪浪豪宅」，預計 111 年 10 月完工

本市寵物銀行(公立動物收容處所)於 88 年興建，為本市唯一的動物收容所，惟迄今已歷 23 年，且整個寵物銀行，其實只能說是一間「鐵皮屋」，內部的設施設備也已老舊，不符合現代動物收容的標準。

為提升收容動物福利及民眾認領養環境舒適性，市府向中央爭取經費，總計投入 1.16 億元經費進行原地整建動物收

容所(寵物銀行)，截至 111 年 8 月 24 日，工程進度 95.45%，預計於 111 年 10 月 10 日完工。

完工後每隻犬隻的收容空間將大幅增為 7.5 平方公尺，為原收容空間 1.92 平方公尺的 3.9 倍。改建後的寵物銀行除了有更寬敞的動物收容與戶外活動空間，也將兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流的多功能友善環境，具體落實尊重生命之普世價值。

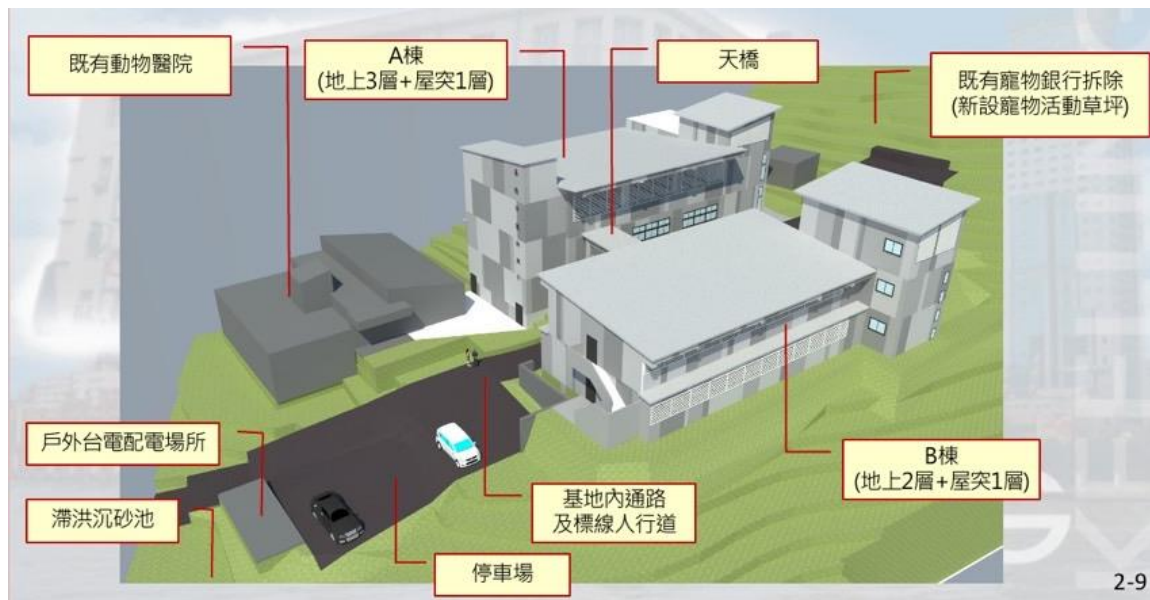


圖 198：本市動物收容所(寵物銀行)整建工程規劃示意圖



圖 199：本市動物收容所(寵物銀行)整建工程預計於 111 年 10 月 10 日完工

2. 寵物公園規劃進度

為提供本市飼主與毛小孩活動遊憩空間，本府將選定 2 處地點建置專屬犬隻活動之寵物公園，經公開招標，已於 111 年 2 月 16 日以 79 萬元決標，由鵬程工程股份有限公司辦理選址及先期規劃工作。

目前已篩選役政公園、長興公園、天外天復育公園、暖暖運動公園、暖心公園、百福公園、泰安公園、65 高地、四

階平台(望幽谷)、碧砂漁港等市有大型公園進行評估中，並已編列明(112)年工程預算 500 萬元建置第一座寵物公園。

本市寵物公園規劃已邀請台灣動物保護行政監督聯盟執行長指導，預計設置面積 2,400 平方公尺以上，內含大型犬區(9 公斤以上)、小型犬區(9 公斤以下)、各區含有 5 種遊具，未來並可作為公私立團體舉辦動物保護宣導教育場域。

3.辦理「狗狗森友會」活動

市府自 109 年起辦理「狗狗森友會」活動，透過趣味遊戲、寵物健康諮詢、飼養觀念宣導等內容，促進民眾與寵物和諧關係。今(111)年活動邁入第三年，本次活動擴大規模辦理，8 月至 9 月期間陸續於本市七個行政區分別辦理多元特色活動，邀請飼主與寵物到活動現場同樂，現場也安排專業獸醫師進行寵物登記及狂犬病疫苗注射站，維護狗狗健康安全，落實「尊重生命，愛護動物」理念。



圖 200：2020 狗狗森友會趣味遊戲



圖 201：2022 狗狗森友會狂犬病疫苗注射站

壹拾參、務實嚴謹做好防疫工作

依照中央流行疫情指揮中心說明，國際上 Omicron 亞型變異株 BA.4 及 BA.5 分別於今年 1 月及 2 月首次於南非發現，研究顯示該二變異株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

統計至 8 月 23 日止，本市 111 年 COVID-19 本土病例共計 99,618 例，其中，BA.5 本土確診病例 2 例，尚無 BA.4 確診病例；目前居家隔離 642 人，居家檢疫 468 人，防疫旅館 92 人，專責病房空床率維持七成。

統計至 8 月 23 日止，COVID-19 疫苗施打情形，第一劑覆蓋率 90.77%，第二劑覆蓋率 87.81%，第三劑覆蓋率 76.91%，第四劑覆蓋率 11.30%。

其中，111 年統計至 8 月 23 日止，本市 18 歲以下學(幼)童染疫人數累計約有 16,525 人，接種率偏低，為提升學(幼)童防護力，除了於暑假期間持續針對染疫已滿 3 個月學童進行催注，安排至合約院所補種外，因應本市中小學校 111 學年度第一學期即將於 8 月 30 日開學，除開學前安排於 111 年 8 月 27 日上午假基隆港務分公司開設大型接種站提供 5-17

歲學童接種疫苗外，並於開學後 2 週內安排入校巡迴集中接種，及持續於合約院所提供預約接種服務；另為加速提升 6 個月至 5 歲幼童防護力，訂於 111 年 8 月 27 日下午、28 日及 9 月 3、4 日假基隆港務分公司開設 BNT 大型接種站。

目前加入本市快篩陽診斷醫療院所計 54 家，包括 7 家醫院、47 家診所；加入確診者居家醫療照護之機構共計 89 家，包括長庚醫院、部立基隆醫院、新昆明醫院等 3 家醫院，以及 86 家專責診所。

本市自 4 月 19 日起開始實施確診者居家醫療照護暨生活照顧支持計畫，截至 8 月 23 日止，居家醫療評估 79,734 人(入案 60,766 人、18,968 人條件不符合)、在案 2,070 人。

以下謹就 110 年本土疫情發生以來，本市實施之重要防疫措施做簡要報告：

一、率全國之先，針對傳統市場進行管制

110 年 5 月中旬國內疫情升溫，本市率全國之先，於 5 月 30 日起針對傳統市場進行管制，市場出入口除了量體溫、噴酒精、強制戴口罩，並落實身分證單、雙號人流管制、實施實聯制等加強防疫工作。

此外，市府人員手持大聲公及標語向採買民眾、攤商宣導政府防疫政策，並呼籲民眾遵守市場「防疫三招」：不試吃、不觸摸、買好儘速回家。



圖 202：本市率全國之先針對傳統市場進行管制

二、率全國之先實施「雙罩一套」高規格防疫措施

本市崁仔頂漁市是北台灣的重要漁貨供應地，經市府與崁仔頂漁市自治會取得共識，於 110 年 6 月 6 日率先實施「雙罩一套」(口罩、面罩及手套)防疫措施，市府並於 6 月 8 日要求所有傳統市場生鮮肉品攤商即日起一律採取「雙罩一套」防疫措施，並禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。6 月 23 日更提高市場防疫等級，市府要求全市公有市場即日起全面採「雙罩一套」防疫作為，並配發手套供各市場、暫准設攤區及攤販集中場從業人員防疫使用。



圖 203：本市率全國之先實施「雙罩一套」高規格防疫措施

三、率全國之先，共善餐食直送急困學生家中

本市率全國之先，與慈濟基金會合作，共同照顧經濟弱勢的急困學生家戶，並結合在地計程車配發食物箱及蔬果箱，照顧學童同時也惠及計程車業者。110 年暑假期間「安心寶飽箱」、「健康蔬果箱」將每月配送一次至本市急困學生家中，並透過營養師設計餐食確保學生飲食均衡營養。受惠人數計有低收入戶 821 位、中低收入戶 507 位、弱勢兒少 166 位、清寒 703 位，合計 2,197 位學生。



圖 204：率全國之先與慈濟基金會合作，共善餐食直送急困學生家中

四、推動「全民防疫、愛心篩檢」示範計畫

本府推動「全民防疫、愛心篩檢」示範計畫，期建立操作模式，在一定時間內執行達一定人口比例的快篩試劑檢測，找出社區感染源，為「以篩檢取代隔離、用快篩取代 PCR」之政策目標建立基礎。

市府針對 18 歲以上設籍本市或於本市有居住事實之民眾，分區域、分類別、規劃時序，111 年 4 月 5 日至 4 月 9 日分批發放總計 19 萬 7,434 片的快篩試劑。試劑一律拿回家自主施作篩檢，快篩陽性回報、陰性不回報。

市府並設立「全民防疫、愛心篩檢」諮詢專線及 24 小時快篩陽性通報專線，並建立充足的防疫車隊(防疫計程車 36 輛、防疫巴士 3 輛)，由衛生局安排免費接送至指定地點，並建立新的 PCR 篩檢量能，可快速得到篩檢結果。民眾可透過 24 小時快篩陽性專線進行後續的 PCR 採檢、防疫車輛派遣以及 PCR 確診後的收容收治。

從快篩陽性進線到 PCR 採檢平均每人花費 1.5 小時，而從 PCR 採檢完成到檢驗報告出爐平均 2.8 小時，總計 4.3 小時，大幅縮短一般篩檢時間，可爭取時間進行疫調及匡列居隔，在最短時間內減少社區傳播的機會。

本府進一步於 111 年 4 月 20 日將快篩陽性通報及服務專線擴充為「24 小時防疫專線」，總計增加至 30 線以強化服務量能。

五、全國首創確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道

為縮短確診者在家等待時間，市府首推「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」，民眾只要接到醫療院所通知陽性確診，可依照自身狀況，自行填寫問卷，送出之後就會送至本市合作的醫療院所進行評估，符合資格者會直接入案；或者目前已是確診者，尚未派送到醫院收治或集中檢疫所的民眾，都可以立即上網提出自我申請，加速相關程序。

本項創舉一方面可以減省醫療端的工作負擔，一方面也可讓確診者加速得到回應與服務的支持。111 年 4 月 22 日自我申請快速通道公布後，民眾反應熱烈，甚至臺北市、臺中市、嘉義市等縣市均來電詢問詳細執行細節，參考本市作法。

六、市民廣場 PCR 篩檢站提供快篩陽民眾領藥服務

自 111 年 3 月 29 日起，本府於本市各區設有 PCR 社區篩檢站，包括市民廣場、火車站南站廣場、孝忠里民活動中心前廣場、通化里民活動中心前空地、外寮防災廣場、碇祥里風雨球場、七堵衛生所、舊公車修理廠，共計 8 處。

為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，影響中重症醫療量能，本市市民廣場快篩陽 PCR 篩檢站自 5 月 16 日起擴大服務，做 PCR 篩檢的同時，也提供有症狀者藥物治療，民眾攜帶健保卡及部分負擔 80 元(免掛號費)，由駐站醫師給藥。

此項服務推出後，也有雙北民眾前來本市篩檢，因雙北 PCR 篩檢需要預約且有限額，雙北民眾碰到預約不到或塞車的狀況，而本市社區篩檢站無限制掛號人數且免預約，快篩陽性民眾都可篩檢得到，因此雙北民眾得知基隆市民廣場篩檢站除了篩檢還提供給藥服務，就直接開車前來本市篩檢，迅速解決民眾篩檢及用藥需求，獲得雙北民眾好評。

經中央、地方政府及民眾共同努力防疫，至 6 月 17 日，本市確診數已連續 6 天在 900 例以下，專責病床空床率也首度超過 5 成，最後留守之市民廣場社區篩檢站每日篩檢人數

已降至 50 人以下，可完全由社區診所提供服務，因此，至 6 月 18 日，本市所有社區篩檢站皆已解除任務退場。



圖 205：本市於各區設置社區篩檢站，111 年 6 月 18 日起已全數功成身退

七、領先全國設置機構型後送收治站

長照機構染疫風險高，依照中央指引係就地分艙安置，但本府也預想萬一爆發機構大規模感染，養護機構多屬中小型規模，空間有限，現實上難以依照中央指引來規劃分區隔離照顧與人力分流。

因此，^{右昌}於今年 4 月份前往本市已裁撤的市立仁愛之家場勘，隨即下令社會處，透過跨局處與公私合作方式，以

該院內仁德樓三樓為第一階段整備區域，領先全國設置機構型後送收治站，協助染疫的機構執行住民降載、照顧分流與環境清消任務。

收治站僅歷時 12 個工作天就完成各項軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業，可提供 20 間房間、40 個床位、1 間儲藏室、1 間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。

此外，基隆長期照顧協會也與本府密切合作，領先全台推動三大措施：

- (1)自 4 月 21 日起，率先全台「主動發放長照機構工作人員快篩試劑」，協助機構監測。
- (2)成立「基隆市染疫機構抗疫群組」，結合社會處、衛生局與本市長照協會，即時協助染疫機構第一時間應變，包括規劃照護分流區域、協助護理師操作 PCR、緊急就醫通報、結合特約院所啟動預防性投藥、開立死亡證明書處理及全台徵召進場備援人力等。
- (3)領先全台「公私協力搭建社福機構後送場所」(即仁愛之家作為機構型後送收治站)，協助機構降載分流與環境清消。



圖 206：整備本市已裁撤之市立仁愛之家，領先全國設置機構型後送收治站

八、小結：防疫不鬆懈，迎向疫情曙光

9 月開學後，國人及境外生返臺入境需求增加，返臺民眾請務必遵守入境時及入境後「3 天居家檢疫+4 天自主防疫」期間之各項檢疫防疫措施，共同維護國內社區安全；而各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，延長至今(111)年 9 月 30 日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩 2 次(身心障礙者、失智症者、2 至 18 歲則每週 1 次，未滿 2 歲免篩)，工作人員每週至少 1 次，已確診康復者 3 個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率，9 月份疫情

恐有升溫跡象，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應持續警惕避免發生機構群聚感染風險，故公費快篩延長實施至 9 月 30 日。

此外，為因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，及保護幼兒健康，自 111 年 8 月 15 日起，實施第四輪家用抗原快篩試劑實名制販售及第三輪 0-6 歲學齡前幼兒免費領取 1 份 (5 劑) 快篩試劑。另，為使 65 歲以上民眾有症狀能儘快篩檢、確診及儘早用藥，降低重症發生率，9 月 1 日起發放 5 劑免費快篩。

新冠肺炎本土疫情後，基隆市一直走在全國疫情的最前線，在中央、地方、所有防疫人員以及市民的支持配合之下，基隆市的疫情也是恢復得最早、下降最快的城市，相信台灣也將在不久後走出疫情黑暗期，並且已經可以隱隱看到曙光了，讓我們一起努力！

壹拾肆、安心城市

一、科技執法有效遏止車輛違規行駛及維護居家安寧

為提升執法效能，本府妥善利用科技執法設備維護本市秩序安寧，執行成果說明如下：

1.取締大型車輛違規行駛東岸高架橋

為遏止大型車輛違規行駛東岸高架橋造成橋體結構損壞，本府 108 年向交通部爭取全額補助，建置全國首創「大型車輛違規行駛東岸高架橋科技執法設備」。該套設備自 109 年 2 月 1 日起開始執法取締，由 109 年 2 月份取締 452 件，降至 111 年 8 月份取締 128 件；111 年 1 至 8 月共計取締 528 件，相較於 110 年同期 575 件，減少 47 件 (-8.17%)，有效遏止大型車輛違規行為。

2.取締仁五路公車停靠區違規停車

本府 108 年向交通部爭取建置「仁五路公車停靠區違規停車偵測執法系統」，該套設備自 109 年 1 月 1 日起開始執法取締，統計 111 年 1 至 8 月，取締違停 1,429 件、事故發生 18 件，相較於 110 年同期取締 1,144 件、事故發生 36 件，取締增加 285 件 (+24.91%)、事故發生減少 18 件 (-50%)，

顯見該設備能有效淨空公車停靠區違停車輛，防制相關事故發生。

3.區間速率取締違規超速

109 年交通部補助本市建置「台 62 線(11.3K 至 6.2K 西向)」及「台 62 甲線(2 號隧道至東海街出口北向)」二處區間速率科技執法，藉由行車速率管制的有效距離，由點的控制轉變為對線的長距離控制，提升該路段交通安全，自 111 年 4 月 1 日起正式執法取締。建置前，108-110 年交通事故發生月平均數 29 件、受傷 28 人；建置後，111 年 4-8 月交通事故發生月平均數 14 件、受傷 5 人，計減少 15 件、23 人，防制事故成效良好。

4.取締車輛超速及噪音

本府於 109 年 3 月及 110 年 4 月共購置「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」2 台，針對易發生車輛超速路段以及民眾噪音檢舉熱點進行取締及採證，包括本市基福公路(東勢街)、明德一路、明德二路、八堵路、中正路、北寧路及外木山等周邊道路加強執法。

統計 111 年 1 至 8 月，該設備取締噪音移送環保局裁處 55 件，較 110 年同期取締移送裁處 102 件，共減少 47 件，顯見該設備已改善本市噪音車輛情形，防制噪音成效良好。

二、全面提升本市重要路口監視器效能

為建造本市綿密、多功能的治安防護網，提升跨縣市偵辦案件效能，並結合多方面增值功能方案，市府將汰換 3,430 支類比式攝影機為數位式攝影機，並向電信業者租賃後端雲端機房、平台各項功能，需求預算共計 3 億 2,775 萬 5,000 元，預計將分 4 年(111-114 年)建置，111 年建置 600 支，112 年建置 780 支，113 年建置 1,250 支，114 年建置 800 支。今(111)年建置作業截至 111 年 8 月 31 日止，刻正辦理招標作業前置事項。

三、領先全國建置 119 及 110 報案互通系統

為提升本市 119 及 110 受理報案之派遣時效及案件準確性，106 年起本市消防局與警察局基於報案資源共享之共識，積極協調以既有之「119、110 報案系統」，規劃「119 與 110 案件電子化互通轉報功能建置案」，於 107 年 11 月 12 日建置完成啟用。

透過 119 與 110 案件電子化互通轉報功能，不用再互相打電話重覆口述、重新登打資料，可充分提升 119 與 110 案件受理、轉報、派遣之效率，縮短民眾等待警察或救護車、消防車到達現場時間，讓民眾更安心。統計 108 年至 111 年 8 月 31 日，本市轉報案件總計 27,546 件。

四、獨居老人戶住警器安裝率達 100%，持續強化弱勢家庭防火安全

為提升民眾居家安全，本市投入大量義消人力到府免費安裝住警器，自 104 年至 111 年 8 月底，本市完成安裝住警器計 57,855 戶。

目前獨居老人住戶設置率達 100%，低收入戶設置率達 99.4%，身心障礙者住戶設置率達 85.61%，持續針對本市身

心障礙者及高齡者家庭安裝住警器，強化弱勢家庭之防火安全。

104 年至 111 年 8 月，本市住警器成功預警計 59 件，對於提升保護市民的生命財產安全發揮很大效用。111 年至 115 年，市府將持續每年編列 100 萬元採購住警器，補助本市避難弱勢家庭有效提升火災預報能力，強化住宅安全。

五、強化救災設備與人力，提升本市救災能量

為提升本市救災能量，市府 8 年來強化各項救災設備與人力，說明如下：

1.新建暖暖消防分隊廳舍並成立無人機救災控制中心

市府投入 1 億 1,281 萬餘元新建暖暖消防分隊廳舍，已於 110 年完工啟用，並成立無人機救災控制中心，整合遙控無人機影像、遠端遙控飛行之機隊管理系統，對於本市搶救救災、山域海域救援、坡地觀察及各項防救災任務發揮重要協助功能。本府並積極研發 111 年由經濟部中小企業處補助研發之「遙控無人機影像結合 AI 影像人型(體)辨識系統」，於各縣市中處領先之消防科技救災作為，該系統研發完成後，將能強化本市無人機空中偵搜受困者能力。

2.購置救災車輛與裝備

市府 104 年至 111 年總計投入 2 億 8,107 萬餘元經費，購置各式救災車輛及裝備。

其中消防車輛部分，8 年來共投入 2 億 2,850 萬元，充實 4 輛及汰換 20 輛、共計 24 輛消防車，致力提升消防車性能，至 111 年 1 月底本市消防車輛已全數汰換完畢。

救災裝備器材方面，市府自 104 年至 111 年共計投入 5,257 萬元，致力提升消防人員及災害防救志工之災害搶救能量。

3.充實消防人力

市府逐年增加本市消防局預算員額及配賦員額，由 107 年員額 260 人增加至 111 年 292 人，增加 12.31%；另增加警察特考消防警察人員配賦員額，於 107 年至 111 年配賦員額共 77 人，具體落實本市對消防人力的重視與支持。內政部 110 年度「充實消防人力推動計畫」，經考評結果，本市榮獲全國第 3 名，亦見本市消防人力增補深獲中央肯定。

4.義消人力招募新血

本市義勇消防人力截至 111 年 8 月 31 日止，義消人數為 1,079 名，目前正積極招募新血，以實現義消人力年輕化的目標。

六、建置全國首創消防車即時影像系統

為提升本市救災救護視訊傳遞效率，本府於 111 年 3 月完成建置全國首創消防車即時影像系統，消防車出勤即可將沿途情資與災害現場影像同步回傳本市 119 中心電視螢幕及各級指揮官行動裝置。

119 人員可針對影像回傳的資訊，立即調派增援人力與車輛，尤其是大型或隧道內災害，不須等待同仁查明回報現場狀況，即可提早預判需要增援多少人車前往救援，爭取更多寶貴救災時間。

七、獅球里及信義花園獲內政部頒發韌性社區一星標章

本市仁愛區獅球里及信義區信義花園社區自 108 年起帶領社區執行防災工作，推動韌性社區發展至今已邁入第 4 年。輔導內容包含工作團隊建立及各項防救災技能訓練等，透過評估潛在的災害風險並依照社區資源與能力訂定防災計畫，因應各式規模的災害，於災害各階段建立防救災機制，以強化社區韌性。

其中，信義花園社區住戶約只有 178 戶，歷經 3 年多持續不斷深耕防災量能，在社區齊心努力之下，終於突破社區人數較少的因素，擁有足夠的自主防災能量，於 111 年 4 月成為全臺第一個且唯一一個公寓大廈型社區獲內政部頒發韌性社區一星標章。

八、公有建築物耐震補強工程 8 年總計投入超過 4.3 億元

台灣位處環太平洋地震帶上，地震頻繁發生，市府非常重視建築物結構安全與耐震能力，8 年來針對學校校舍及公有市場等公有建築物進行耐震補強工程，提供民眾安全的使用空間，說明如下。

1.學校校舍耐震補強工程

市府非常重視校舍結構安全，凡經耐震詳評後，耐震係數 CDR 值小於 1 的校舍，均爭取中央補助經費進行耐震補強工程。

市府自 104 年至 111 年，針對本市市立高中、國中、國小共計 65 棟校舍，投入總計 3 億 8,000 萬餘元經費，進行校舍耐震補強工程，目前已完工 62 棟校舍、執行中 3 棟校舍，提供師生安全無慮的學習環境。

2.公有市場建築物耐震補強工程

市府依內政部推動既有建築物耐震能力評估及補強方案，針對本市 88 年以前興建之公有零售市場建築物辦理耐震評估及補強工程，總計投入 5,469 萬元經費。

自 107 年起共完成基隆市仁博愛、源遠等 8 處市場建築物實施耐震能力初步評估計 10 萬元，基隆市 6 處公有市場建築物實施耐震能力詳細評估計 300 萬元。

「基隆市東光、源遠、七堵公有零售市場耐震能力補強工程」經費 2,153 萬元，工程已完工；「基隆市調和公有零售市場補強工程」經費 1,224 萬元，工程已完工；「基隆市祥豐公有零售市場補強工程」經費 1,782 萬元，預計於 111 年底前完工。

表 39：公有市場建築物耐震補強工程

項次	工程名稱	進度	經費(萬元)
1	基隆市東光、源遠、七堵公有零售市場耐震能力補強工程	109 年 4 月 10 日開工 111 年 10 月 26 日完工	2,153
		109 年 4 月 10 日開工 111 年 10 月 26 日完工	
		109 年 4 月 10 日開工 111 年 10 月 26 日完工	
2	基隆市調和公有零售市場補強工程	109 年 4 月 10 日開工 111 年 7 月 4 日完工	1,224
3	基隆市祥豐公有零售市場補強工程	111 年 8 月 15 日開工 預計於 111 年底前完工	1,782
合計			5,159

壹拾伍、建構友善創業投資環境

一、本市商業登記家數 8 年來穩定成長

本市商業登記家數 104 年登記為 11,521 家，截至 111 年 7 月止登記為 12,765 家，8 年來呈現穩定成長趨勢，共計增加 1,244 間商家。




圖 207：本市 104 年至 111 年 7 月止商業登記家數成長圖

二、本市二大工業區經濟發展有目共睹，8 年廠商投資逾 87 億元

據經濟部統計處資料，本市大武崙工業區之年營業收入由 104 年的 80 多億元，至 109 年增加至 118 多億元，廠商從 50 家增加為 58 家，員工從 2 千 2 百多人增加到 2 千 5 百多人；六堵科技園區暨周邊廠商之年營收入由 103 年 280 多億元，至 109 年已突破 300 億元，廠商從 41 家增加為 53 家，

員工從 3 千 6 百多人增加到 5 千 3 百多人，二大工業區經濟發展成果有目共睹。

另統計 104 年至 111 年 8 月底為止，二大工業區共 45 家廠商，投資已逾 87 億元，如下表所示。

表 40：本市二大工業區近年投資金額與投資家數

年度	投資金額 (單位:元)	投資家數	
104-111	8,772,380,000	45	
大武崙工業區			
年度	投資金額	投資家數	投資類別
104 年	6,700,000	1	科技業
105 年	28,000,000	2	工程業、食品業
106 年	無	0	
107 年	820,000,000	6	加油站、水泥營建業、環保產業、沖壓業、貿易業
108 年	350,000,000	3	食品業、科技業
109 年	1,590,000,000	5	食品業、科技業、其他產業
110 年	625,000,000	3	非金屬礦物製品製造業、科技業、紡織業
111 年	810,700,000	2	電子零組件製造業、其他製造業
小計	4,230,400,000	22	
六堵科技園區			
年度	投資金額	投資家數	投資類別
104 年	355,200,000	3	生技業、科技業、機電業
105 年	615,000,000	5	科技業、工程業、機電業

年度	投資金額	投資家數	投資類別
106 年	130,000,000	2	科技業、嬰兒用品
107 年	450,000,000	2	科技業
108 年	920,000,000	2	科技業
109 年	1,730,000,000	3	科技業、製藥業
110 年	44,000,000	3	科技業、食品製造業
111 年	297,780,000	3	電腦、電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業
小計	4,541,980,000	23	

三、工業區周邊環境改善及推動工業區立體化

為打造本市優質的投資環境，市府進行工業區周邊環境改善及推動工業區立體化，以吸引企業進駐本市，說明如下：

1.改善工業區周邊環境

本府積極向中央爭取經費，於 109 年完成六堵科技園區工東街道路拓寬工程及大武崙工業區強化周邊排水工程。其中，工東街道路拓寬工程獲中央補助 5,000 萬經費，於 107 年 10 月動工，109 年 2 月完工；大武崙工業區強化周邊排水工程，總經費 8,456 萬，於 108 年 5 月 14 日開工，109 年 10 月 15 日完工，有效改善大武崙溪河堤護岸功能，提升大武崙工業園區及鄰近東都社區穩定安全性，營造更穩健的投資環境。

2.工業區立體化

行政院於 108 年核定「工業區更新立體化發展方案」，市府積極推動以解決企業缺地問題，提供本市六堵科技園區及大武崙工業區廠商最高 50% 的容積率獎勵，鼓勵廠商升級轉型及翻新廠房，辦理成果如下表所示。

表 41：本市二大工業區申請工業區立體化方案審查結果

工業區	提出申請家數	審查中	審查通過
六堵科技園區	3	1	2
大武崙工業區	3	1	2
合計	6	2	4

表 42：本市二大工業區之工業區立體化方案執行成果

工業區	新增投資額	增加就業人口	興建總樓地板面積	申請立體化後增加的坪數
六堵科技園區	7.384 億元	250-340 人	7132.37 坪	656.2 坪
大武崙工業區	13.09 億元	60-285 人	11536.4 坪	953.8 坪
合計	20.474 億元	310-625 人	18668.77 坪	1610 坪

四、扶植青年於本市發展基隆特色產業

為活絡本市產業發展，創造更多就業機會，本府支持青年朋友於本市創業，發展具基隆特色之產業，8年來投入各項資源與協助，減輕青年朋友創業負擔，說明如下：

1. 「青年創業孵育計畫」與「青年投入創業及公共服務補助計畫」

市府自 105 年至 109 年推動辦理「青年創業孵育計畫」，以文化創意、時尚產業、智慧科技應用及地方特色服務領域為主，透過甄選計畫選出務實具有特色的產業，酌予補助創業獎勵金，上限 20 萬元。

110 年起則推動「青年投入創業及公共服務補助計畫」，甄選內容除了既有類別之外，另加入「聯合國 17 項永續發展目標以解決城市發展所面臨問題」之公共服務類別，今(111)年公共服務補助計畫更擴大向下延伸受理本市各大專院校及高中職學生社團提案，補助金額以 5 萬元為上限，以培訓學生創業前知能素養與技能。

經統計，105 年至 111 年共計補助 76 家業者，包括創業類 68 家、公共服務類 8 家。

110 年計畫期間共增加就業人數 37 人、成立新據點或門市 6 處、建立品牌數 6 項、開發新商品 33 項、異業結盟家數 29 家(如小獸書屋、海那邊、隆特色咖啡廳、見書店……等)、註冊新商標 2 個(fernybar、台灣頭人)。



圖 208：110 年基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫青創團隊「海洋廢人工作室」，以親海教育遊程為創業內容

2.提供一站式創業輔導

本府自 110 年起提供一站式創業輔導，包括創業實務課程 8 堂(B2B 業務開發、打造性別友善職場、勞動法規及勞資關係、天使投資行銷、領導力管理、品牌形象塑造、創業財

會管理及企業永續)、受補助廠商期中與期末專家訪視及業師創業諮詢一對一門診 10 家。

3.設立青創貸款諮詢專線

本府自 109 年起，協助經濟部中小企業處「免免 157 專案」(100 萬以下融資案)設立青創貸款諮詢專線，統計自 109 年 9 月開辦至 111 年 3 月為止，本市青創融資核貸件數共計 741 件、融資金額 4 億 9,527 萬元、保證金額 4 億 6,816 萬 2,000 元。

4.「紅磚屋」建置青年交流公共空間平台

為建置青年交流公共空間平台及鼓勵青年接觸地方事務，市府編列 1,762 萬元經費，並於 110 年獲國家發展委員會核定補助工程經費 500 萬元，總計投入 2,262 萬元經費，辦理「紅磚屋建物補強修繕工程及空間活化」。

本工程於 111 年 3 月 29 日決標，工期為 250 日曆天，目前辦理申請建造執照作業，預訂今年 9 月開工。空間建置完成後，將於場域中提供專業諮詢、創業門診、課程學習，並串聯多方合作，提升地方創生與青年人才培育中心能量。

五、地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)執行效益總計達 1.7 億元

為促進本市中小企業創新研發動能，本府自 105 年起辦理「地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)」。

105 至 110 年度共計申請 114 家、補助 47 家中小企業，補助金額共計 2,532 萬餘元，成功帶動在地中小企業產值增加 1 億 7,064 萬餘元、促進投資 1 億 2,052 萬元、產出新產品或服務 94 項、增加就業人數 83 人、17 件專利，促成產業創新轉型及升級，帶動地方產業創新創業示範效果。

111 年為因應廣大需求，提高金額辦理本計畫，本府編列 300 萬元，獲經濟部核定 547.8 萬元配合款，共計 847.8 萬元。今年特別鼓勵策略聯盟，透過兩家企業合作將彼此獨特資源與能力整合起來，創造 1 加 1 大於 2 的獲利與價值，更將聯盟形式列為加分項目之一，以鼓勵本市 2 家中小企業聯盟，藉由產業上中下游及跨領域結盟，促進新興產業提升及傳統產業轉型與升級。

111 年度地方型 SBIR 共計 26 家業者投件，其中單一廠商提案計 11 案、廠商聯合提案計 2 案脫穎而出，持續推動本

市智慧科技數位應用、文化創意、綠色永續產業、及地方特色服務技術，期創造經濟發展新榮景。

六、中小企業圓夢貸款核貸金額累計達 4,040 萬元

為扶植本市小規模商業及中小企業發展，本府自 107 年起開辦「中小企業圓夢貸款」，5 年來核貸家數達 69 家，核貸金額累計達 4,040 萬元，如下表所示。

表 43：本市中小企業圓夢貸款核貸情形

年度	核貸家數	核貸金額(萬元)	疫情紓困措施
107	20	1,000	-
108	23	1,090	-
109	2	200	利率降息一碼，協助 112 家受衝擊廠商申請紓困，核准金額約 555 萬元。
110	22	1,620	利率降息一碼，協助 36 家受衝擊廠商申請紓困，核准金額約 1,620 萬元。
111 (截至 8 月)	2	130	-
總計	69	4,040	

七、推出「潮·嚮 | 山海基隆」品牌，積極推廣本市農漁產品

為推廣本市農漁產品，市府每年向行政院農業委員會積極爭取計畫補助，並持續辦理休閒農業推廣行銷、協助輔導農漁村及休閒農業區提升產業價值。為改善本市農漁村特色聚焦不足問題，本府去(110)年透過執行品牌營造，推出「潮·嚮 | 山海基隆」品牌，強調基隆的特色山海文化，以創新的態度，發展獨特的潮流新文化。

而今(111)年經農委會核定「社區農村再生計畫」、「休閒農業區跨域輔導計畫」，成功爭取經費約 1,262 萬元。後續將以山海歷史文化、綠色餐飲、青年駐村、遊程體驗等主題辦理系列活動與課程，並辦理農漁夫市集、體驗活動及產地餐桌以推廣相關農村再生成果，另辦理基礎食安、食農教育、創意餐飲等工作坊，行銷本市休閒農業，提升產品與產業價值。

未來市府將持續經營「潮·嚮 | 山海基隆」品牌，以有故事、有觀點、有文化的整合方式，將基隆山海遊憩資源做完整的整併，引導民眾聚焦基隆特色山海、農漁文化，重新認識基隆的美好。



圖 209：110 年本市辦理「潮嚮×山海基隆—八斗子市集」休閒農業推廣行銷

結語：基隆是一個成就夢想的地方

感恩

附件：104 至 111 年市政榮譽榜

表 44：104-111 年度中央/國際考核績效榮譽榜統計表

年度	104	105	106	107	108	109	110	111 (截至 8/25)	合計
獲獎數	56	63	59	51	47	47	53	24	400

表 45：104 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
104	103 年經濟警察業務督導實施計畫	乙組第 3 名
104	「淨安專案」評核工作	丙組第 2 名
104	103 年下半年查緝偽劣假藥工作	丙組第 1 名
104	103 年下半年各警察機關偵辦濫墾林地、山坡地案件工作	丙組第 1 名
104	103 年下半年警察機關協助取締地下通匯案件工作	全國第 3 名
104	103 年下半年各警察機關查緝重利罪案件工作	乙組第 1 名
104	103 年下半年檢肅黑道幫派工作	特優全國第 2 名
104	103 年度「稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽」	第 1 名
104	103 年下半年警察機關取締侵害智慧財產權案件工作	乙組第 3 名
104	103 年下半年加強查處人口販運仲介及集團專案工作	乙組第 2 名
104	103 年度地方政府環境清潔維護考核「鄉鎮市區組」	優等
104	103 年度地方政府環境清潔維護考核「村里組」	特優
104	行政院第 13 屆推動性別主流化金馨獎	團體獎
104	103 年下半年警察機關辦理性侵害案件工作	丙組第 3 名
104	103 年度健康促進雲端加值應用評選活動	地方縣市政府組- 優質獎
104	104 年度各縣市雨水下水道系統維護管理成效年度評核全國乙組	第 1 名
104	103 年下半年靖紀工作	優等
104	103 年下半年查緝走私工作	丙組第 1 名
104	菸害防制工作稽查績效	第二名
104	103 年下半年警察機關加強掃蕩毒品工作	乙組第 2 名

獲獎年度	項目	獎項
104	地方衛生局績效綜合考評檢驗業務	表現優異
104	行政院環境保護署 103 年度「直轄市、縣(市)政府執行空氣品質維護及改善工作績效考評」	特優
104	103 年流感接種計畫	目標達成獎
104	104 年婦女防火宣導隊評鑑	全國甲等
104	103 年畜牧類農情調查工作	第三組第 1 名
104	心理及口腔健康業務考評	優等獎
104	104 年防空避難設備管理維護督導評核	乙組第 2 名
104	103 年第 4 季「執行強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」	乙組第 1 名
104	104 年全民防衛動員暨災害防救(民安 1 號)演習	全國優等
104	104 年第 55 屆全國中小學科展-縣市團體獎第二名	縣市團體獎第二名
104	財政部「103 年度私劣菸酒查緝績效考核績優」第 6 名	第 6 名
104	財政部「103 年度縣市政府私劣菸品查獲量績優」本府榮獲全國第 1 名	第 1 名
104	104 年上半年檢肅黑道幫派工作	特優全國第 3 名
104	103 年度垃圾焚化廠查核評鑑	特優獎
104	104 年上半年警察機關加強查緝少年犯罪工作計畫	丙組第 1 名
104	103 年度加強結核病防治競賽獎勵計畫	團體獎-B 組第三名
104	104 年上半年警察機關辦理性侵害案件工作執行計畫	丙組第 1 名
104	「天外天復育公園生態保育及環境教育推廣計畫」	「地方治理標竿論壇」第 1 區佳作
104	103 年度推行公共造產業務	市級第一名
104	104 年度海洋教育全國年會	全國第一名
104	本市國民教育輔導團生活課程領域榮獲 104 年直轄市、縣(市)國民教育輔導團領域(議題)輔導小組運作績優團隊	最具潛能團隊
104	104 年毒性化學物質聯防運作管理績優	優良獎
104	104 年地政業務地價類(縣市組)	第一名
104	內政部 104 年地政業務督導考評縣市組總考評	第三名
104	內政部消防署 104 年度珍惜緊急救護資源演說比賽	全國 C 組第 1 名
104	104 年度「i-center 旅遊服務體系服務品質提昇作業」	非直轄市組第二名
104	104 年加強戶役政資訊稽核工作	丙組第 3 名
104	104 年兵役徵集業務考評	C 組第一名
104	本市安樂區圖書館獲評鑑為 104 年全國績優圖書館	全國績優圖書館
104	104 年度災害防救業務訪評	全國優等
104	社區健康營造肥胖防治類	縣市達標最速獎

獲獎年度	項目	獎項
104	社區健康營造肥胖防治類	縣市減重達標獎
104	社區健康營造肥胖防治類	縣市參與率卓越獎
104	104 年度「動物收容及管制業務」執行績效評鑑	甲等
104	104 年度「動物保護業務」執行績效評鑑	進步獎
104	本市 104 年度殯葬管理業務績效評量考核	甲等

表 46：105 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
105	104 年度地方稅跨機關知識管理推動績優機關	丙組第一名
105	104 年城市好旅宿評比	甲等
105	104 年全民防衛動員暨災害防救（民安 1 號）演習	優等
105	104 年度災害防救業務訪評	甲等
105	災害防救深耕第 2 期計畫 104 年度評鑑	優等
105	104 年城市好旅宿評比	甲等
105	104 年下半年警察機關協助取締地下通匯案件工作	全國第一名
105	104 年下半年警察機關偵辦濫墾林(山坡)地案件工作	丙組第一名
105	104 年下半年警察機關查緝重利罪工作	乙組第一名
105	104 年下半年加強戶役政資訊稽核工作	優等
105	104 年度防止新欠清理舊欠競賽	第二名
105	104 年度「稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽」	丙組第二名
105	104 年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」	銀質獎及團體獎勵金 64 萬元
105	104 年下半年查緝走私工作	丙組第一名
105	104 年下半年各警察機關協助查緝偽劣假藥工作	丙組第一名
105	104 年下半年警察機關加強查緝少年犯罪工作	丙組第二名
105	104 年度地方政府環境清潔維護考核「直轄市及縣(市)組」	優等
105	104 年度地方政府環境清潔維護考核「鄉鎮市區組」	特優
105	104 年度地方政府環境清潔維護考核「村里組」	特優
105	104 年地方衛生機關保健業務考評	第三組優等獎進步獎
105	104 年下半年警察機關辦理性侵害案件工作	丙組第一名

獲獎年度	項目	獎項
105	105 年度各縣市雨水下水道系統維護管理成效年度評核全國乙組	甲等
105	教育部國民及學前教育署【104 年預防少年兒童犯罪方案地方政府重點工作項目執行成果】	優良
105	104 年地方衛生局績效綜合考評檢驗業務	第三組優等獎
105	104 年地方衛生機關業務考評防疫業務	第三組優等獎
105	104 年畜牧類農情調查工作	第三組第一名
105	104 年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫	基礎築底項目評比乙組「特優獎」
105	104 年下半年加強查緝性犯罪工作	丙組第一名
105	直轄市、縣(市)政府執行 104 年戶政業務績效評鑑	人口總數未滿 45 萬縣(市)政府組第一名
105	104 年度財政部「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫-地方稅知識管理系統」	第一名
105	104 年度私劣菸酒查緝績效考核	績優第 6 名
105	104 年度縣市政府私劣菸品查獲量	績優第 3 名
105	心理及口腔健康業務考評	優等
105	105 年北北基桃聯合災害防救演習	全國績優單位
105	105 直轄市、(縣)市政府全民國防教育考核評鑑	全國優等
105	地方衛生機關業務考評—食品藥物類	第三組優等
105	104 年度流感疫苗接種計畫考評	丙組計畫完成「優等獎」
105	105 年第 56 屆全國中小學科展-縣市團體獎第一名	縣市團體獎第一名
105	105 年上半年地區安全情勢分析工作	丙組第三名
105	104 年度流感疫苗接種計畫考評	丙組優等
105	105 年上半年警察機關加強查緝少年犯罪工作	丙組第一名
105	104 年查核評鑑	優等
105	104 年度電子遊戲場業暨特定行業管理	優等
105	104 年度加強結核病防治競賽獎勵計畫	B 組第二名
105	104 年度推行公共造產業務	市級第一名

獲獎年度	項目	獎項
105	105 年臺灣學術網路危機處理中心-資訊安全通報演練	全國特優
105	105 年度 i-center 旅遊服務體系服務品質晉升評比	第一名
105	105 年度海洋教育全國年會	全國第二名
105	104 年度商品標示業務	甲等
105	104 年度外籍與大陸配偶照顧輔導措施實地考核	優等
105	地方衛生機關業務考評—長期照護類	第三組第三名
105	105 年度全國食品衛生志工監控食品廣告績效	優等
105	偏遠（含山地離島）及長照資源不足地區長照服務據點實地考評	甲等
105	105 年「教育有『I』，愛在他鄉『役』起來」微電影創作競賽	佳作（相當於第三名）及觀眾票選獎
105	105 年度災害防救業務訪評	全國優等
105	104 年地方衛生機關業務考評長期照護類	第三組第三名
105	105 年度空氣品質淨化區推動認養	績效卓著獎
105	105 年度「城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」業務評定	優等
105	105 年漁業產銷班績優輔導單位	全國漁業產銷班前六名
105	2017 年智慧城市創新應用獎	優勝
105	105 年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫-實際作為-交通工程-都會及城鎮型	第一名
105	105 年度「動物收容及管制業務」，執行績效獲行政院農業委員會評鑑為表現優秀獎成績	表現優秀獎
105	105 年度「動物保護業務」，執行績效獲行政院農業委員會評鑑為全國表現優秀獎成績	表現優秀獎

表 47：106 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
106	104 年度地方財政業務考核債務管理類	第三名
106	「105 年城市好旅宿評比-縣市政府管理績效評比」	優等
106	災害防救深耕第 2 期計畫 105 年度評鑑	基隆市政府特優、仁愛、信義及安樂區公所優等

獲獎年度	項目	獎項
106	105 年度肥胖防治成果績優單位評定縣市減重參與率	卓越獎
106	105 年度災害防救業務訪評	甲等
106	105 年下半年查捕逃犯	第一等第
106	105 年度役政業務督訪	全國 C 組第二名
106	基隆市清理欠稅榮獲財政部核定全國丙組第一名	第一名
106	基隆市地方稅網路申報作業榮獲財政部核定全國丙組第一名	第一名
106	105 年度地方政府環境清潔維護考核「直轄市及縣(市)組」	優等
106	105 年度地方政府環境清潔維護考核「鄉鎮市區組」	優等
106	105 年度地方政府環境清潔維護考核「村里組」	優等
106	執行 105 年下半年「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」績效評核	乙組第一名
106	105 年打擊電信網路詐欺犯罪工作	丙組第三名
106	105 年檢肅黑道幫派	乙組特優第一名
106	105 年度地方環境保護機關辦理環境教育績效考評	優等
106	105 年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」	金質獎及團體獎勵金 88 萬元
106	執行 105 年「加強查緝新型態毒品計畫」績效評核	乙組第一名
106	全般刑案破獲率	全國第三名
106	105 年地方衛生機關保健業務考評績優成績獎「菸害稽查績效」	同組第一名
106	105 年地方衛生機關保健業務考評績優成績獎「戒菸服務」	同組第二名
106	105 年地方衛生機關保健業務考評績優成績獎「不得供應菸品予未滿 18 歲之執法成效」	全國第二名
106	105 年地方衛生機關保健業務考評績優成績獎「消弭健康不平等(菸酒檳計畫)」	全國第二名
106	105 年度地方政府環境清潔維護考核	優等
106	105 年度推執行機關加強辦理資源回收工作績效考核	金質獎
106	106 年度各縣市雨水下水道系統維護管理成效年度評核全國乙組	甲等
106	105 年第 1 季「執行強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」	乙組第 1 名

獲獎年度	項目	獎項
106	「105 年度地方衛生機關業務考評—防疫業務」	第三組優等獎
106	「105 年地方衛生機關業務考評」綜合獎	第三組第 1 名
106	105 年下半年「警察機關辦理性侵害案件工作」	丙組第 1 名
106	105 年畜牧類農情調查工作考核	第三組第二名
106	105 年地方衛生局績效綜合考評檢驗業務	第三組優等獎
106	105 年度財政部稽徵業務考核—稅收績效類	第一名
106	基隆市研考處榮獲 105 年度推動「人口政策措施宣導執行績效」	第三組第三名
106	105 年查核評鑑	優等
106	105 年度全國癌症防治工作	整體四癌進步獎
106	本府「105 年推動社區治安工作」獲評優等	優等
106	106 年全民防衛動員暨災害防救(民安 3 號)演習全國區域型演習	全國優等
106	106 年上半年「加強查處人口販運仲介集團專案」，獲評乙組第 2 名	乙組第 2 名
106	105 年地方衛生機關業務考評食品藥物類	第三組優等獎
106	105 年度自殺防治成效	績優獎
106	106-107 直轄市、(縣)市政府全民國防教育考核評鑑	全國優等
106	106 年各級農、漁會改選查察賄選防制暴力工作獲評丙組第 1 名	丙組第 1 名
106	106 年上半年警察機關辦理性侵害案件工作獲評丙組第 2 名	丙組第 2 名
106	106 年上半年加強查緝性犯罪工作獲評丙組第 2 名	丙組第 2 名
106	105 年度防制人口販運工作考核成果	特優
106	106 年地政業務績優獎(縣市組)	第三名
106	106 年度中央聯合視導地方毒品危害防制中心視導	第三類組優良
106	基隆市衛生局榮獲 105 年度地方衛生機關業務考評-醫政業務第三組第一名	第三組第一名
106	106 年度環境教育機構及設施場所評鑑認證	合格
106	106 年度 i-center 旅遊服務體系服務品質晉升評比	優等
106	105 年工業及服務業普查	第 3 級普查處優等第 3 名
106	106 年「暑期保護青少年—青春專案」執行成效評鑑計畫	丙組特優第一名
106	105 年新住民照顧服務績效實地考核實施計畫	優等

獲獎年度	項目	獎項
106	106 年暑期保護—青春專案執行成果評鑑	特優
106	本市暖暖區衛生所榮獲衛生福利部國民健康署「第 11 屆金所獎」-輔導基層診所加入癌篩工作「佳作獎」	佳作獎
106	106 年度災害防救業務訪評	全國優等
106	基隆市衛生局榮獲 106 年度健康職場認證推動方案之「地方政府衛生局推動健康職場」優等獎	優等獎
106	基隆市衛生局榮獲衛生福利部國民健康署辦理之「106 年度健康傳播素材徵選活動」-桑梓溫情獎	桑梓溫情獎

表 48：107 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
107	內政部「災害防救深耕第 2 期計劃」106 年度評鑑	特優
107	交通部觀光局「106 年城市好旅宿評比-縣市政府管理績效評比」優等	優等
107	105 年經濟部督導地方政府辦理工廠管理及輔導業務	甲等
107	105 年度地方財政業務輔導方案公庫管理類	第 1 名
107	106 年度深耕第二期計畫期末評鑑	全國特優
107	106 年下半年「加強查處人口販運仲介及集團專案」	乙組第 2 名
107	106 年基隆市土壤及地下水污染整治業務推動績效考評	特優
107	106 年度防止新欠清理舊欠競賽	第三名
107	106 年上半年加強受(處)理各類案件督考評核工作	第 2 組第 3 名
107	106 年下半年「警察機關加強查緝少年犯罪工作計畫」	丙組第 2 名
107	106 年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」	銀質獎及團體獎勵金 100 萬元
107	106 年度直轄市及縣(市)空氣品質維護或改善工作執行績效考評-空氣品質管理	拔尖
107	106 年度地方政府環境清潔維護考核「直轄市及縣(市)組」	特優
107	106 年度地方政府環境清潔維護考核「鄉鎮市區組」	特優
107	106 年度地方政府環境清潔維護考核「鄉鎮市區組」	優等
107	106 年度地方政府環境清潔維護考核「村里組」	特優
107	106 年度地方政府環境清潔維護考核「村里組」	優等
107	基隆市衛生局榮獲第 11 屆金所獎督導有方衛生局獎	督導有方衛生局獎

獲獎年度	項目	獎項
107	本市暖暖區衛生所榮獲第 11 屆金所獎	佳作獎
107	基隆市衛生局榮獲國民健康署「乳癌篩檢目標達成率」	同組第 1 名
107	基隆市衛生局榮獲國民健康署「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」	同組第 1 名
107	基隆市衛生局榮獲國民健康署「不得供應菸品予未滿 18 歲之執法成效」	全國第 2 名
107	基隆市衛生局榮獲國民健康署「戒菸服務」	同組第 2 名
107	基隆市衛生局榮獲國民健康署「106 年地方衛生機關業務考評-保健業務」	第三組第一名
107	106 年下半年「警察機關辦理性侵害案件工作執行計畫」	丙組第 1 名
107	106 年下半年「加強查緝性犯罪計畫」	丙組第 2 名
107	基隆市衛生局榮獲衛生福利部食品藥物管理署「106 年度地方衛生機關業務考評—檢驗業務」	第三組優等獎
107	基隆市衛生局榮獲衛生福利部「106 年地方衛生機關業務考評」綜合獎	第三組第 1 名
107	基隆市衛生局榮獲衛生福利部疾病管制署「106 年度地方衛生機關業務考評—防疫業務」	第三組第一名
107	基隆市環境保護局榮獲 106 年度推動「土壤及地下水污染整治工作」	特優
107	基隆市研考處榮獲 106 年度推動「人口政策措施宣導執行績效」	第三組第一名
107	本市榮獲 106 年教育部對地方政府特殊教育行政績效	甲等
107	107 年上半年「加強查處人口販運仲介及集團專案」	乙組第 3 名
107	基隆市衛生局榮獲「106 年度自殺防治成效」	績優獎
107	基隆市衛生局榮獲 106 年度衛生教育業務推動	優等獎
107	基隆市衛生局榮獲 106 年地方衛生機關「心理及口腔健康業務」	優等獎
107	基隆市衛生局榮獲 107 年愛滋及藥癮者潛伏結核感染評估及治療計畫	特優獎
107	基隆市衛生局榮獲 106 年地方衛生機關「防疫業務」	優等獎
107	基隆市衛生局榮獲「106 年度地方衛生機關業務考評—食品藥物類」	第三組優等獎
107	107 年坡地金育獎	激勵獎
107	基隆市衛生局榮獲 106 年度地方衛生機關綜合考評醫政業務執行績效	第一名
107	107 年上半年「檢肅非法槍械工作」	丙組第 2 名
107	107 年上半年「警察機關辦理性侵害案件工作執行計畫」	丙組第 2 名

獲獎年度	項目	獎項
107	基隆市政府「107年暑期保護青少年-青春專案」	丙組特優第2名
107	基隆市政府採購稽核小組106年度績效考核榮獲行政院	優等
107	107年高齡友善城市優良獎	優良獎
107	107年動物保護業務評鑑	表現優秀獎(排除六都第1名)
107	「中正區行政大樓」榮獲2018國家卓越建設獎	最佳施工品質類卓越獎
107	「海洋廣場空間活化改善工程」榮獲2018國家卓越建設獎	最佳環境文化類金質獎
107	「基隆城際轉運站」榮獲2018國家卓越建設獎	最佳規劃設計類金質獎
107	「基隆市港再生標竿計畫」榮獲2018國家卓越建設獎	國土建設特別貢獻獎

表 49：108 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
108	107年預防犯罪宣導工作榮獲丙組第1名	丙組第1名
108	107年下半年「加強查處人口販運仲介及集團專案」榮獲乙組第1名	乙組第1名
108	107年「健全勤指功能」督考評核工作榮獲第2組第3名	第2組第3名
108	107年度清理欠稅競賽 榮獲丙組第一名	丙組第一名
108	第12屆金所獎「佳作獎」	佳作獎
108	第12屆金所獎督導有方衛生局獎	督導有方衛生局獎
108	107年地方衛生機關保健業務考評「四癌陽追率」同組第1名	同組第1名
108	107年地方衛生機關保健業務考評「乳癌篩檢目標達成率」同組第1名	同組第1名
108	107年地方衛生機關保健業務考評「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」同組第1名	同組第1名
108	107年地方衛生機關保健業務考評「戒菸服務」同組第1名	同組第1名
108	107年地方衛生機關保健業務考評「不得供應菸品予未滿18歲之執法成效」全國第2名	全國第2名
108	107年地方衛生機關保健業務考評「戒菸服務」同組第1名	同組第1名
108	107年地方衛生機關保健業務考評「稽查績效」同組第1名	同組第1名
108	107年地方衛生機關保健業務考評第三組第一名	第三組第一名
108	107年度地方衛生機關績效綜合考評檢驗業務第三組優等獎	第三組優等獎

獲獎年度	項目	獎項
108	107 年地方衛生機關食品藥物類業務考評第三組優等獎	第三組優等獎
108	「107 年地方衛生機關業務考評」綜合獎第三組第 2 名	第三組第 2 名
108	本市建德國中參與「108 年環境教育教育實作」榮獲行動組國中組全國第一	行動組國中組全國第一
108	「107 年環境保護績效考核績優機關」直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核績優機關	特優獎
108	「107 年度地方政府海洋污染防治考核」海洋第一組優等獎	海洋第一組優等獎
108	108 年全國義勇消防組織救災能力評核團體組特優獎	團體組特優獎
108	基隆市消防局榮獲國家發展委員會「第 2 屆政府服務獎」	2 屆政府服務獎
108	內政部辦理 107 年度人口政策措施宣導執行績優縣市政府	第三組績優縣市政府
108	「108 年度特種勤務情報業務協調訪問評鑑」榮獲評定優等	優等
108	本市環保局天外天資源回收(焚化)廠商特別獎-區域合作獎	廠商特別獎-區域合作獎
108	本市環保局天外天資源回收(焚化)廠商全國第 1 名特優獎	全國第 1 名特優獎
108	108 年上半年「加強查處人口販運仲介及集團專案」榮獲評定乙組第 2 名	乙組第 2 名
108	「107 年推動社區治安工作評鑑」榮獲評定優等第 2 名	優等第 2 名
108	108 年全民防衛動員暨災害防救(民安五號)演習丙組縣市特優	丙組縣市特優
108	108 年坡地金育獎	縣市組第四名及激勵獎
108	「2019 全國國小潔牙觀摩賽」榮獲獎項：甲組團體總成績金牌獎	甲組團體總成績金牌獎
108	108 年上半年「保護婦幼安全工作」榮獲評定全國特優	全國特優
108	108 年上半年「警察機關辦理性侵害案件工作執行計畫」榮獲評定全國特優	全國特優
108	基隆市「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」榮獲 2019 國際景觀建築師協會景觀大賞(2019 IFLA-APR LA Award) 社區營造類-卓越獎 (Communities Award of Excellenc)	社區營造類-卓越獎 (Communities Award of Excellenc)
108	「108 年度內政部地政業務考評」榮獲測量業務精進獎	業務精進獎

獲獎年度	項目	獎項
108	基隆市「E-square 基隆東岸廣場」榮獲 2019 臺灣建築獎首獎	首獎
108	「直轄市、縣(市)政府執行 107 年度新住民照顧服務績效實地考核」榮獲評定優等	優等
108	基隆市原住民族家庭服務中心 108 年度榮獲評鑑全國都會組優等(第一名)	優等第一名
108	107 年度運用有線基金執行情形考核優等	優等
108	2019 海洋教育推手獎—地方政府獎	地方政府獎
108	107 年度照護業務執行績效	第三組第三名
108	基隆市「基隆市成功國小西側 29 號橋下環境美化與空間整建工程」榮獲 2019 第七屆台灣景觀大獎「公園綠地公共開放空間」優質獎	優質獎
108	108 年度民防團隊整編工作	丙組第 2 名
108	2019 第七屆台灣景觀大賞-環境規劃設計類-基隆市望海巷海灣串聯計畫	佳作獎
108	「大基隆歷史場景再現整合計畫」榮獲 2019 國家卓越建設獎	最佳規劃設計類特別獎
108	「信義國小老舊校舍整建工程暨地下停車場新建工程」榮獲 2019 國家卓越建設獎	最佳規劃設計類優質獎
108	「七賢橋改建工程」榮獲 2019 國家卓越建設獎	最佳施工品質類優質獎

表 50：109 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
109	基隆市中山區入選 2020 台灣經典／山城小鎮	入選
109	本市建德國中五堵國小榮獲教育部 107 學年度推動健康促進績優學校	全國績優
109	內政部 108 年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫	第一名
109	107 年「國家重要濕地保育行動計畫」本市「寶貝內寮濕地推廣計畫」	特優等
109	基隆市警察局 108 年下半年「加強查處人口販運仲介及集團專案」榮獲內政部警政署評定乙組第 2 名	乙組第 2 名
109	108 年度「城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」業務評定優等	優等
109	基隆市政府「108 年暑期保護青少年-青春專案」榮獲內政部評定丙組特優第 1 名	丙組特優第 1 名
109	108 年下半年度保護婦幼安全工作評核特優單位	特優
109	基隆市警察局 108 年下半年辦理性侵害案件工作評核獲評特優	特優
109	辦理 108 年第 4 次「全國同步掃黑行動專案」乙組第 2 名	乙組第 2 名

獲獎年度	項目	獎項
109	辦理內政部警政署 108 年度「取締酒後駕車工作督導考核計畫」獲評乙組第二名	乙組第二名
109	校園減塑有成，基隆市建德國中「不塑之課」榮獲教育部環境教育實作競賽全國第三名！	第三名
109	基隆市政府 108 年度採購監督稽核及工程施工查核績效考核雙雙獲得「優等」獎項	優等
109	基隆市於「108 年運動 i 臺灣計畫縣市年度績效」榮獲特優縣市	特優縣市
109	榮獲行政院海洋委員會海洋污染防治考核海洋第一組「特優」	特優
109	本市成功國小榮獲「108 學年全國口腔保健績優學校遴選」優等	優等
109	108 年辦理內政部推行人口政策措施宣導執行績效績優地方政府	第三組第一名
109	「直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核績優機關」特優	特優
109	「土壤及地下水污染整治績效考核績優機關」特優	特優
109	「108 年地方政府環境清潔維護考核評比」優等	優等
109	「河川污染整治績效考核績優機關」優等	優等
109	「空氣品質維護改善工作績效績優機關」特優	特優
109	「108 年度辦理環境影響評估審查及監督績效考核績優機關」特優	特優
109	「108 年度環境教育績效考核績優優異機關」特優	特優
109	108 年度地方政府環境清潔維護考核	村里組優等獎
109	108 年度地方政府環境清潔維護考核(鄉鎮市區)	優等
109	全國 108 年度地方政府環境清潔考核鄉鎮市區組優等	優等
109	基隆市中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程榮獲「2020 年國家卓越建設獎--最佳規劃設計類特別獎」	特別獎
109	本市榮獲中華民國第 60 屆全國中小學科學展覽會縣市團體獎第三名！	全國第三名
109	108 年癌症防治 品質精進計畫-乳癌篩檢效率王地區醫院/診所第二組 第一名	診所第二組 第一名
109	基隆市衛生局榮獲「108 年度地方衛生機關業務考評-檢驗業務」第三組優等獎	第三組優等獎
109	基隆市衛生局榮獲第 13 屆金所獎督導有方衛生局獎	督導有方衛生局獎
109	本市安樂區衛生所榮獲第 13 屆金所獎「佳作獎」	佳作獎
109	基隆市衛生局榮獲 108 年地方衛生機關業務考評保健業務-「營造健康生活環境」第三組第二名	第三組第二名
109	基隆市衛生局榮獲 108 年地方衛生機關業務考評保健業務-「戒菸服務」第三組第二名	第三組第二名

獲獎年度	項目	獎項
109	基隆市衛生局榮獲 108 年地方衛生機關業務考評保健業務-「四癌陽追總和」第三組第一名	第三組第一名
109	基隆市衛生局榮獲 108 年地方衛生機關業務考評保健業務-「婦幼健康促進」第三組第一名	第三組第一名
109	基隆市衛生局榮獲 108 年地方衛生機關業務考評保健業務-「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」第三組第一名	第三組第一名
109	環保局天外天資源回收(焚化)廠榮獲行政院環保署 108 年度垃圾焚化廠查核評鑑全國第 1 名	特優
109	內政部考核 108 年度「防制人口販運工作成果」獲評「特優」	「特優」成績 97.88 分，為全國最高分。
109	內政部 108 年度災害防救深耕第 3 期計畫「優等」	優等
109	基隆市衛生局榮獲國民健康署辦理之「108 年癌症防治品質精進計畫」，癌症篩檢工作績效獲得「口腔偵測王第三組第一名」及「口腔偵測王之表現優異獎第三組第一名」	第三組第一名
109	基隆市政府團隊榮獲「第八屆保護服務網絡之承諾與行動」-菁網獎佳作	佳作
109	院頒方案 108 年度工作執行成果	綜合管考第二組第一名
109	榮獲「道路交通秩序與交通安全改進方案 108 年度執行成果考評」交通執法—第二組第二名	第二組第二名
109	內政部警政署 109 年上半年度辦理性侵害案件工作評核警察局獲得特優	特優
109	108 年度全國執行私劣菸酒查緝績效	全國第四名

表 51：110 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
110	基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫榮獲第八屆台灣景觀大獎-「環境規劃設計類」佳作獎	佳作獎
110	「基隆市港山海城串聯再造計畫」榮獲內政部營建署「城鄉 20。無限魅力-致敬城鄉魅力大賞」	致敬城鄉魅力大賞
110	內政部警政署核定 109 年「加強查處人口販運仲介及集團專案實施計畫」獲獎	乙組第二名
110	108 年度國家重要濕地保育行動計畫	特優等
110	本府榮獲內政部營建署 108 年度寶貝內寮濕地推廣計畫-特優等	特優等
110	基隆市榮獲 109 年運動 i 臺灣執行績效特優縣市	特優縣市
110	109 年臺灣閱讀風貌調查-閱讀力指標中的「每人到館次數」榮獲全國第三名	第三名

獲獎年度	項目	獎項
110	109 年臺灣閱讀風貌調查	第一名
110	本市衛生局榮獲「109 年度地方衛生機關績效綜合考評檢驗業務」第三組表現優良獎	第三組表現優良獎
110	內政部警政署 109 年下半年度辦理性侵害案件工作評核警察局獲得特優	特優
110	109 年度畜牧類農情調查工作考核成績	第三組第一名
110	本市榮獲 109 年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫直轄市及縣(市)組第二組銀質獎	銀質獎
110	內政部警政署 109 年保護婦幼安全工作評核獲頒特優	特優
110	賀!本市榮獲「內政部對直轄市、縣(市)政府執行 109 年度戶政業務績效評鑑計畫」人口總數未滿 45 萬縣(市)組成績第一名	第一名
110	執行 110 年第 1 季「強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」獲頒特優	特優
110	109 年內政部推行人口政策措施宣導執行績效優異地方政府	第三組第一名績效優異地方政府
110	本市環保局(焚化廠管理機關)獲「垃圾焚化廠查核評鑑」評定為「特別獎-互惠合作獎」	特別獎-互惠合作獎
110	本市天外天資源回收(焚化)廠「垃圾焚化廠查核評鑑」評定為全國第 1 名	全國第 1 名「特優獎」
110	警察局 109 年檢肅幫派工作獲特優單位	特優單位
110	本市榮獲「110-111 年度全民國防教育考核評鑑」績優!	績優
110	交通部辦理 108 年度「智慧運輸系統建設發展計畫」評鑑,本市辦理「首都生活圈觀光重點遊憩場域交通管理計畫」榮獲優等。	優等
110	性侵害案件工作評核	特優
110	榮獲 109 年災害防救深耕第 3 期計畫	特優
110	「大基隆歷史場景空間(要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍)修復與文化永續工程」榮獲 2021 國家卓越建設獎	最佳環境文化類金質獎
110	「基隆山海城串聯再造計畫」榮獲 2021 國家卓越建設獎	最佳規劃設計類卓越獎
110	「望海巷漁港友善人行暨景觀工程」榮獲 2021 國家卓越建設獎	最佳規劃設計類金質獎
110	「基隆市七堵區 19、21 號橋改建工程」榮獲 2021 國家卓越建設獎	最佳施工品質類優質獎
110	110 年上半年安全情報待建目標評核	第三名
110	110 年上半年地區安全情勢分析評核	第三名
110	110 上半年輔安專案工作評核	第二名
110	本市衛生局榮獲 109 年度地方衛生機關業務考評-保健業務-婦幼健康促進第三組第一名	第三組第一名

獲獎年度	項目	獎項
110	本市衛生局榮獲 109 年度地方衛生機關業務考評-保健業務-癌症篩檢與檳榔健康危害防制第三組第一名	第三組第一名
110	本市衛生局榮獲 109 年度地方衛生機關業務考評-保健業務-稽查績效第三組第二名	第三組第二名
110	本市衛生局榮獲 109 年度地方衛生機關業務考評-保健業務-HPV 疫苗接種率績優	績優
110	本市衛生局榮獲 109 年度地方衛生機關業務考評-保健業務-轄區成健篩檢血糖新發異常個案追蹤就診率績優獎	績優獎
110	執行「110 年度中央對各直轄市及縣(市)政府汰換警用車輛一般性補助款控管及考核計畫」考核	第二名
110	本府地政業務榮獲內政部 110 年督導考評縣市組「總考評績優獎」	總考評績優獎
110	本市 110 年全民防衛動員暨災害防救(民安 7 號)演習, 榮獲行政院評定「綜合實作績優單位」	優等
110	110 年全民防衛動員暨災害防救(民安 7 號)演習獲頒兵棋推演優等單位	優等
110	本府人事處「110 年度人事機構業務績效考核」經行政院人事行政總處評定縣市政府組第一名「特優」	第一名「特優」
110	院頒方案 109 年度工作執行成果	卓越獎及綜合管考榮獲第二組第一名
110	榮獲行政院環境保護署 109 年「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核績優機關」優等	優等
110	榮獲行政院環境保護署環境教育績效考核績優異機關「特優獎」	特優
110	榮獲行政院環境保護署空氣品質維護改善工作績效績優機關「特優獎」	特優
110	榮獲行政院環境保護署地方政府環境清潔維護考核評比「特優獎」	特優
110	榮獲行政院環境保護署綠色生活推廣績優機關「特優獎」	特優
110	榮獲行政院環境保護署水污染防治績效評核績優機關「優等獎」	優等
110	榮獲行政院環境保護署土壤及地下水污染整治業務績效考核績優機關「優等獎」	優等
110	交通部 110 年「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案 109 年度執行成果考評」, 獲評第三名	第三名
110	本市榮獲 110 年 Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制採購獎參獎。	參獎
110	榮獲經濟部「110 年 Buying Power 社會創新產品及服務採購」特別獎	特別獎

獲獎年度	項目	獎項
110	本市獲國家通訊傳播委員「109年度運用有線基金執行情形」評核「優等」	優等
110	110年度動物收容管制業務評鑑成果報告-榮獲表現優秀獎	表現優秀獎

表 52：111 年度中央/國際考核績效榮譽榜一覽表

獲獎年度	項目	獎項
111	本市榮獲「教育部 2021 年海洋教育推手獎-地方政府獎」	地方政府獎
111	基隆市榮獲 110 年運動 i 臺灣執行績效特優縣市	特優
111	本市榮獲 111 年第 79 屆兵役節直轄市、縣(市)役政績優單位	役政績優單位
111	本市榮獲「110 年閱讀力表現績優城市」五十萬以下人口組	第三名
111	本市榮獲「110 年閱讀力表現績優城市」縣市組民眾每人到館次數	第二名
111	本市榮獲「110 年閱讀力表現績優城市」縣市組民眾持證比例	第一名
111	沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫榮獲 2021 第九屆台灣景觀大獎公園綠地公共開放空間類優質獎	優等獎
111	基隆太平國小校舍空間活化暨周邊環境改善統包工程榮獲 2021 第九屆台灣景觀大獎社區營造地方創生類佳作獎	佳作獎
111	基隆山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場榮獲 2021 第九屆台灣景觀大獎「環境規劃設計類」佳作獎	佳作獎
111	110 年度畜牧類農情調查工作考核成績	第三組第一名
111	榮獲行政院環境保護署永續發展考核績優機關「特優獎」	特優
111	榮獲行政院環境保護署環境教育考核績優機關「特優獎」	特優
111	榮獲行政院環境保護署資源回收考核績優機關「創新特色卓越獎」	創新特色卓越獎
111	榮獲行政院環境保護署水污染防治評核績優機關「優等獎」	優等
111	榮獲行政院環境保護署環境監測及資訊應用考核績優機關「優等獎」	優等
111	榮獲行政院環境保護署空氣品質維護改善考核績優機關「優等獎」	優等
111	榮獲行政院農業委員會 110 年度全國績優休閒農業區評鑑「茁壯獎」	茁壯獎

獲獎年度	項目	獎項
111	榮獲行政院農業委員會 110 年度全國績優休閒農業區評鑑「績優輔導單位獎」	績優輔導單位獎
111	榮獲財政部 110 年度查私劣酒考評	全國第十名
111	榮獲行政院環境保護署 110 年度環境保護地面水體垃圾攔除績效考核「優等」	優等
111	「基隆市立田徑場改善工程」榮獲 2022 國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎	最佳規劃設計類金質獎
111	「基隆市成功國小活動中心」榮獲 2022 國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎	最佳規劃設計類金質獎
111	「市定古蹟基隆要塞司令部修復工程」榮獲 2022 國家卓越建設獎	最佳環境文化類卓越獎
111	「正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程」獲頒 2022 國家卓越建設獎	最佳規劃設計類金質獎



KEELUNG
A city full of 
